

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
Automatico	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.600.000.000	L. 1.300.000.000	L. 0	L. 1.300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.916.079.350	L. 616.079.350	L. 0	L. 1.300.000.000	Lit. -683920650

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/10/99)
Opere Civili	1.781.602.234	1.211.667.680
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.781.602.234	1.211.667.680
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	205.000.000	205.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	211.158.134	211.158.134
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	45.920.000	45.920.000
IVA al 10%		
IVA al 20%	356.319.632	242.333.536
SOMME A DISPOSIZIONE	818.397.766	704.411.670
TOTALE COSTO	2.600.000.000	1.916.079.350
	Economie	-683.920.650
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.300.000.000	616.079.350
Risorse proprie	1.300.000.000	1.300.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.600.000.000	1.916.079.350

Protocollo d'intervento: **3940**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO DEI SENTIERI STORICO RELIGIOSI TRADIZIONALMENTE UTILIZZATI NEI PELLEGRINAGGI VERSO IL SANTUARIO DI MONTEVERGINE*Comune **MERCOGLIANO (AV)**Finanziamento **L. 1.439 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.438.010.206**- Tot. Pagato **L. 1.438.010.206**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/10/98* **28/09/98**Fine Lavori *01/10/99* **31/12/99***Santuario di Montevergine*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI MONTEVERGINE**Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**C.Fis./P.IVA **92006290644**Indirizzo **ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE** **MERCOGLIANO (AV)**Recapiti Telefono: **0825 787150** Telefax: **0825 787192**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
APPALTO FIDUCIARIO GEOM. FIORENTINO SANDULLO	VIA S.CRISCI 1 MERCOGLIANO AV 01512940642	L. 1.127.087.163	L. 1.070.732.805	5,00
Totali		L. 1.127.087.163	L. 1.070.732.805	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -61000000
DM 13/09/99	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.439.000.000	L. 1.439.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (23/03/99)
Opere Civili	1.127.100.000	1.070.732.805
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.127.100.000	1.070.732.805
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	41.510.000	
Altre Spese Tecniche	113.480.000	155.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	50.200.000	50.204.121
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	20.000.000	20.000.000
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	112.710.000	107.073.280
IVA al 20%	35.000.000	35.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	372.900.000	367.277.401
TOTALE COSTO	1.500.000.000	1.438.010.206
	Economie	-61.989.794
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.438.010.206
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.500.000.000	1.438.010.206

Protocollo d'intervento: **3992****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO DELL'UMANA ACCOGLIENZA RECUPERO LOCALI EX MONASTERO SS. ANNUNZIATA*
 Comune **ACERRA (NA)**
 Finanziamento **L. 6.266 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 6.265.296.332**
 - Tot. Pagato **L. 6.265.296.332**
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	24/08/98	06/01/98
Fine Lavori	24/08/99	23/12/99

*Ex Monastero della SS. Annunziata***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI ACERRA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **93005550632**
 Indirizzo **CURIA ARCIVESCOVILE** **ACERRA (NA)**
 Recapiti **Telefono: 081 8857551** **Telefax: 081 8857551**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CUCCARO ARREDAMENTI SRL CORSO TRIESTE 180 CASERTA	L. 457.000.000	L. 386.165.000	15,50
LICITAZIONE PRIVATA	TECNOCONTROL SRL VIA CAMPANA 233 POZUOLI NA	L. 938.000.000	L. 731.640.000	22,00
LICITAZIONE PRIVATA	SAVA & C. SRL VIA TOLEDO 156 NA	L. 2.605.000.000	L. 2.094.159.500	19,61
Totali		L. 4.000.000.000	L. 3.211.964.500	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.628.000.000	L. 6.128.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -432000000
DM 13/09/99	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.196.000.000	L. 5.696.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.766.000.000	L. 6.266.000.000	L. 0	L. 500.000.000	+ Lit. 570000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/07/01)	
Opere Civili	2.532.000.000	2.198.666.500	
Opere Impiantistiche	938.000.000	768.222.000	
Arredi e/o Attrezzature	480.000.000	405.849.600	
Altre Voci	50.000.000		
TOTALE LAVORI	4.000.000.000		3.372.738.100
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	160.000.000	200.000.000	
Altre Spese Tecniche	200.000.000	200.000.000	
Allacciamenti	40.000.000	40.000.000	
Imprevisti	147.000.000	207.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	1.500.000.000	1.500.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	40.000.000	84.352.000	
IVA al 10%	347.000.000	225.866.650	
IVA al 20%	194.000.000	365.384.750	
SOMME A DISPOSIZIONE	2.628.000.000		2.822.603.400
TOTALE COSTO	6.628.000.000		6.195.341.500
		Economie	-432.658.500
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.128.000.000		5.695.341.500
Risorse proprie	500.000.000		500.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	6.628.000.000		6.195.341.500

Protocollo d'intervento: **4019****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° ED ULTIMO LOTTO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI ROSETO FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RELIGIOSO ROSETO*

Comune **AVELLINO (AV)**

Finanziamento **L. 1.993 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.993.000.000**

- Tot. Pagato **L. 1.993.000.000**

Cofinanziamento **L. 3.272 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	18/06/99	28/07/94
Fine Lavori	15/10/99	01/02/00



Casa di riposo per anziani nel complesso religioso Roseto

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROVINCIA NAPOLETANA DEI FRATI CAPPUCCINI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **92013230633**

Indirizzo **COMUNE DI PORTO RECANATI C.SO MATTEOTTI, 232** **PORTO RECANATI (MC)**

Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
COTTIMO FIDUCIARIO	ALLUMINIO MIVE SRL QUADRIVIO ZONA PIP S.ANGELO DEI LOMBARDI AV 00104840640	L. 205.000.000	L. 205.000.000	0,00
COTTIMO FIDUCIARIO	EDILIZIA ARTIGIANA DI DELL'ANNO ROCCO VIA VALLE 33 CESINALI AV 01526770647	L. 387.768.843	L. 387.168.843	0,15
COTTIMO FIDUCIARIO	TERMICA IMPIANTI SERINESE VIA NOCELLETO 4 S.MICHELE SERINO AV 00539350645	L. 400.484.600	L. 400.484.600	0,00
COTTIMO FIDUCIARIO	DELL'ANNO NICOLA VIA SABINO COCCHIA 29 CESINALI AV 00215600644	L. 421.153.433	L. 421.153.433	0,00
COTTIMO FIDUCIARIO	PIANO DOMENICO VIA CRETAZZO 15 BELLIZZI IRPINO AV 0051712648	L. 1.222.078.395	L. 1.222.078.395	0,00
AFFIDAMENTO DIRETTO	IMPRESA LAZZERINI ALESSANDRO VIA SAN NICOLA 3 ATRIPALDA AV 00042470841	L. 1.638.006.518	L. 1.638.006.518	0,00
Totali		L. 4.274.491.789	L. 4.273.891.789	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 3.986.000.000	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 1.993.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.986.000.000	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 1.993.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	+ Lit. 1278688068
DM 13/09/99	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	-L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 16/11/99	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
Automatico	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 21/07/00	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 01/08/00	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 14/12/00	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	
DM 14/02/01	L. 5.264.688.068	L. 1.993.000.000	L. 0	L. 3.271.688.068	

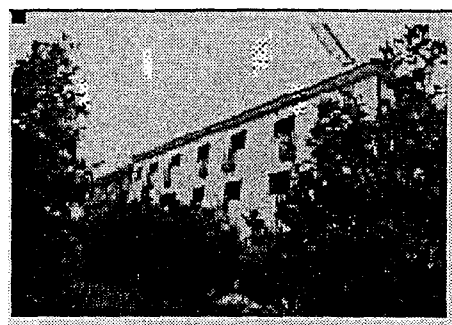
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/03/01)
Opere Civili	3.370.169.420	
Opere Impiantistiche	904.322.363	
Arredi e/o Attrezzature	262.061.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.536.552.783	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	85.500.000	
Altre Spese Tecniche	104.500.000	
Allacciamenti	20.273.900	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	427.449.179	
IVA al 20%	90.412.200	
SOMME A DISPOSIZIONE	728.135.279	0
TOTALE COSTO	5.264.688.062	5.264.688.062
<hr/>		
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.993.000.000	1.993.000.000
Risorse proprie	3.271.688.068	3.271.688.068
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.264.688.068	5.264.688.068

Protocollo d'intervento: **4245**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AMPLIAMENTO DEL PENSIONATO FEMMINILE ISTITUTO G. PASCALE DI CURTI*
 Comune **CURTI (CE)**
 Finanziamento **L. 993 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 992.569.430**
 - Tot. Pagato **L. 992.563.430**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *16/08/98* *12/08/98*
 Fine Lavori *20/08/99* *20/08/99*

*Istituto G. Pascale di Curti*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **CONGR. SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **00305840613**
 Indirizzo **PIAZZA S. FRANCESCO, 4** **CAPUA (CE)**
 Recapiti **Telefono: 0823 961063** **Telefax: 0823 961063**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	IMPREDIL SRL VIA G. D'ANNUNZIO VICOII 4 CE 02062750613	L. 762.927.337	L. 753.772.209	1,20
Totali		L. 762.927.337	L. 753.772.209	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 992.569.430	L. 992.569.430	L. 0	L. 0	Lit. -7430570

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/07/00)	
Opere Civili	760.500.000	753.772.209	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature		29.970.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	760.500.000		783.742.209
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	53.200.000	53.200.000	
Altre Spese Tecniche	50.900.000	48.740.565	
Allacciamenti			
Imprevisti	122.800		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature	30.000.000		
- Altre voci	2.006.000	4.728.760	
IVA al 10%	76.050.000	75.377.221	
IVA al 20%	27.221.200	26.774.675	
SOMME A DISPOSIZIONE	239.500.000		208.821.221
TOTALE COSTO	1.000.000.000		992.563.430
		Economie	-7.436.570
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000		992.563.430
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.000.000.000		992.563.430

Protocollo d'intervento: **4279****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OSTELLO DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO SOCIALE RESTAURO E RECUPERO DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI S.MARIA AL RIFUGIO*Comune **CAVA DE' TIRRENI (SA)**Finanziamento **L. 3.443 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.442.855.963**- Tot. Pagato **L. 3.442.855.963**Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/08/98** **20/08/98**Fine Lavori **30/09/99***Complesso conventuale di S. Maria al Rifugio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00223540654**Indirizzo **MUNICIPIO DI CAVA DE' TIRRENI PIAZZA ROM****CAVA DE' TIRRENI (SA)**Recapiti **Telefono: 089 682111** **Telefax: 089 344810****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	EDIL ATELLANA SOC.COOP. VIA CASAGIOVE CASAPULLA 2 CE 00956000616	L. 4.696.266.000	L. 3.855.064.000	17,91
Totali		L. 4.696.266.000	L. 3.855.064.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.388.000.000	L. 4.388.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit. -945144037
DM 01/06/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.442.855.963	L. 3.442.855.963	L. 0	L. 1.000.000.000	


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/07/01)
Opere Civili	2.540.000.000	
Opere Impiantistiche	925.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.865.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	163.960.000	
Altre Spese Tecniche	196.661.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	603.673.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	407.173.000	
IVA al 20%	152.124.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.523.591.000	0
TOTALE COSTO	5.388.591.000	4.920.859.289
	Economie	-467.731.711
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.388.000.000	3.442.855.963
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		478.003.326
TOTALE COPERTURE	5.388.000.000	4.920.859.289

Protocollo d'intervento: **4668**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL BLOCCO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL COMPLESSO DEL SANTUARIO*
 Comune **MERCOGLIANO (AV)**
 Finanziamento **L. 491 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 486.309.000**
 - Tot. Pagato **L. 485.909.000**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *01/10/98* **21/09/98**
 Fine Lavori *01/10/99* **30/12/99**

*Santuario di Montevergine*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **DIOCESI DI MONTEVERGINE**
 Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**
 C.Fis./P.IVA **92006290644**
 Indirizzo **ABBAZIA DI LORETO DI MONTEVERGINE** **MERCOGLIANO (AV)**
 Recapiti **Telefono: 0825 787150** **Telefax: 0825 787192**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
APPALTO FIDUCIARIO EDIL DI VITTORIO FREDA SNC	VIA DEI FIORI 3 PRATA AV 00610840647	L. 342.574.132	L. 325.445.425	5,00
Totali		L. 342.574.132	L. 325.445.425	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 465.000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 465.000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 465.000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 465.000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 465.000.000	L. 465.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -19000000
DM 05/08/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 446.000.000	L. 446.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 491.000.000	L. 491.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 45000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/01)
Opere Civili	209.200.000	394.373.048
Opere Impiantistiche	103.300.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	342.500.000	394.373.048
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	26.000.000	
Altre Spese Tecniche	33.000.000	49.875.000
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	3.650.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	4.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		14.400.000
IVA al 10%	31.250.000	39.437.305
IVA al 20%	19.600.000	12.855.000
SOMME A DISPOSIZIONE	122.500.000	116.567.305
TOTALE COSTO	465.000.000	510.940.353
	Maggiore Spesa	45.940.353
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	465.000.000	510.940.353
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	465.000.000	510.940.353

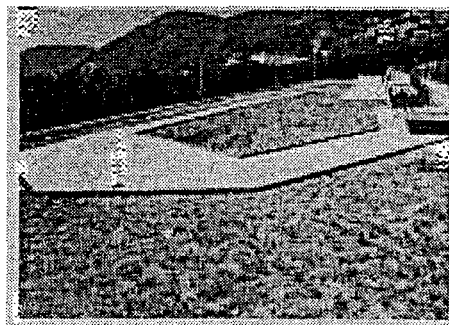
Protocollo d'intervento: **4808**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED ANNESSO PARCPEGGIO PUBBLICO*

Comune **MERCOGLIANO (AV)**Finanziamento **L. 2.080 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.809.501.743**- Tot. Pagato **L. 1.809.501.743**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *23/08/99* **26/10/99**Fine Lavori *28/10/99* **31/12/99***Area urbana a valle del viale di S. Modestino*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI MERCOGLIANO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00199400649**Indirizzo **VIA ROMA PIAZZA MUNICIPIO****MERCOGLIANO (AV)**Recapiti Telefono: **0825 787027** Telefax: **0825 787220**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	A.T.I. FERRARA S.R.L. SICE S.R.L. VIA OTTAVIANO, 58 NAPOLI 07066450631	L. 1.483.832.142	L. 1.375.720.796	7,29
Totali		L. 1.483.832.142	L. 1.375.720.796	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.080.000.000	L. 2.080.000.000	L. 0	L. 0	

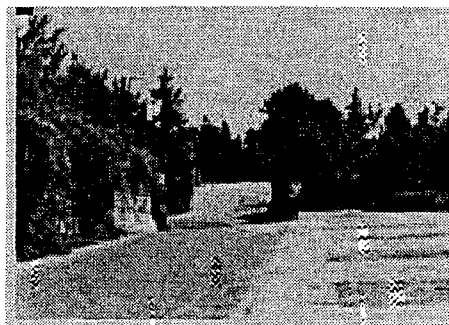
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/08/01)
Opere Civili	1.483.832.142	1.368.394.329
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.483.832.142	1.368.394.329
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	36.572.564	15.636.673
Altre Spese Tecniche	22.257.482	98.335.481
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	230.000.000	111.662.730
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	4.451.496	
- Altre voci	76.000.000	18.633.098
IVA al 10%	85.080.111	76.839.432
IVA al 20%	141.806.205	120.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	596.167.858	441.107.414
TOTALE COSTO	2.080.000.000	1.809.501.743
	Economie	-270.498.257
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.080.000.000	1.809.501.743
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.080.000.000	1.809.501.743

Protocollo d'intervento: **4847**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI*
 Comune **MERCOGLIANO (AV)**
 Finanziamento **L. 225 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 188.355.240**
 - Tot. Pagato **L. 171.769.716**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *10/03/99* *07/06/99*
 Fine Lavori *31/05/99* *31/07/99*

*Casello autostradale Avellino ovest*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI MERCOGLIANO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00199400649**
 Indirizzo **VIA ROMA PIAZZA MUNICIPIO** **MERCOGLIANO (AV)**
 Recapiti **Telefono: 0825 787027** **Telefax: 0825 787220**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA DIANA GENNARO VIA ALDO MORO 64 S. CIPRIANO AVERSA CE 01952340618	L. 116.136.925	L. 83.595.673	28,02
Totali		L. 116.136.925	L. 83.595.673	
