

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.932.000.000	L. 1.537.000.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	- Lit. -153034000
DM 05/08/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
Automatico	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.778.966.000	L. 1.383.966.000	L. 315.000.000	L. 80.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/05/01)
Opere Civili	1.020.000.000	1.036.925.179
Opere Impiantistiche	230.000.000	197.246.589
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	215.491.904
Altre Voci	50.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.420.000.000</b>	<b>1.449.663.672</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	110.000.000	131.312.727
Altre Spese Tecniche	50.000.000	9.131.667
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	106.000.000	103.692.518
IVA al 10%	246.000.000	71.187.260
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>512.000.000</b>	<b>315.324.172</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.932.000.000</b>	<b>1.764.987.844</b>
	Economie	-167.012.156
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.537.000.000	1.369.987.844
Risorse proprie	80.000.000	80.000.000
Altre fonti finanziarie	315.000.000	315.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.932.000.000</b>	<b>1.764.987.844</b>

Protocollo d'intervento: **1499****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DEL MUSEO DELLA CATTEDRALE NELL'EX CHIESA DI S. ROMANO*

Comune **FERRARA (FE)**

Finanziamento **L. 2.910 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.680.937.598**


- Tot. Pagato **L. 2.680.937.598**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/11/98* **20/10/98**

Fine Lavori *16/10/99* **31/12/99**

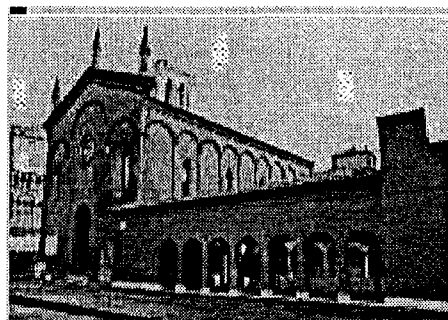*Ex Chiesa di S. Romano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FERRARA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00297110389**

Indirizzo **PIAZZA MUNICIPALE, 2** **FERRARA (FE)**

Recapiti **Telefono: 0532 239111** **Telefax: 0532 239389**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	DITTA GAMMINO GEOM. GIUSEPPE VIA DEL SANTUARIO 74 VALVERDE (CT) GMMGPP58E30C351	L. 1.868.000.000	L. 1.640.104.043	12,20
<b>Totali</b>		<b>L. 1.868.000.000</b>	<b>L. 1.640.104.043</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.186.000.000	L. 3.186.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.936.000.000	L. 2.936.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -250000000
DM 13/09/99	L. 2.936.000.000	L. 2.936.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.936.000.000	L. 2.936.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -260000000
DM 21/07/00	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.910.000.000	L. 2.910.000.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/07/01)	
Opere Civili	1.155.500.000	1.481.621.770	
Opere Impiantistiche	708.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	560.000.000	535.380.000	
Altre Voci	80.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.503.500.000</b>		<b>2.017.001.770</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	282.000.000	304.547.887	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	80.000.000	43.240.186	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	186.350.000	148.162.177	
IVA al 20%	134.000.000	167.985.578	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>682.350.000</b>		<b>663.935.828</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.185.850.000</b>		<b>2.680.937.598</b>
		Economie	-504.912.402
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.186.000.000		2.680.937.598
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.186.000.000</b>		<b>2.680.937.598</b>

Protocollo d'intervento: **1535**

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI POSTI LUNGO LA VIA FRANCIGENA IN LOCALITA' CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'ANTICO PALAZZO DELLA COMMENDA*

Comune **PIACENZA (PC)**


Finanziamento **L. 4.562 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.554.320.221**

- Tot. Pagato **L. 4.554.320.221**

Cofinanziamento **L. 247 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	24/09/98
Fine Lavori	31/07/99	15/07/99

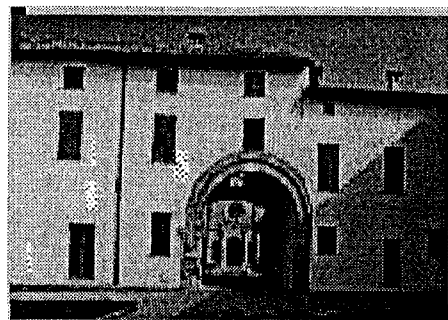

*Palazzo della Commenda*

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AZIENDA USL DI PIACENZA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **91002500337**

Indirizzo **C.SO VITTORIO EMANUELE 169** **PIACENZA (PC)**

Recapiti **Telefono: 0523 302765** **Telefax: 0523 302775**

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	IMPRESA CONS. CCPL. SRCL VIA GANDHI 8 REGGIO EMILIA 00134330356	L. 4.011.679.000	L. 3.383.450.069	15,66
Totali		L. 4.011.679.000	L. 3.383.450.069	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.500.000.000	L. 5.253.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	- Lit. -691051824
DM 01/06/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
Automatico	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.808.948.176	L. 4.561.948.176	L. 0	L. 247.000.000	


## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/10/00)
Opere Civili	3.354.335.000	2.776.482.078
Opere Impiantistiche	678.148.000	606.967.990
Arredi e/o Attrezzature	315.770.000	315.469.800
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.348.253.000</b>	<b>3.698.919.868</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	236.035.000	467.983.295
Altre Spese Tecniche	245.166.000	
Allacciamenti	20.000.000	61.073.304
Imprevisti	75.481.000	48.388.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	40.000.000	34.158.787
IVA al 10%	434.824.000	338.345.007
IVA al 20%	100.238.000	152.445.960
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.151.744.000</b>	<b>1.102.394.353</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.499.997.000</b>	<b>4.801.314.221</b>
	Economie	-698.682.779
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.561.948.000	4.561.948.000
Risorse proprie	247.000.000	247.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.808.948.000</b>	<b>4.808.948.000</b>

Protocollo d'intervento: **2581**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO DI ROSSENA PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	
Comune	CANOSSA (RE)	
Finanziamento	L. 3.869 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.868.935.000
	- Tot. Pagato	L. 3.868.935.000
Cofinanziamento	L. 500 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	05/03/99	11/03/99
Fine Lavori	30/09/99	30/09/99

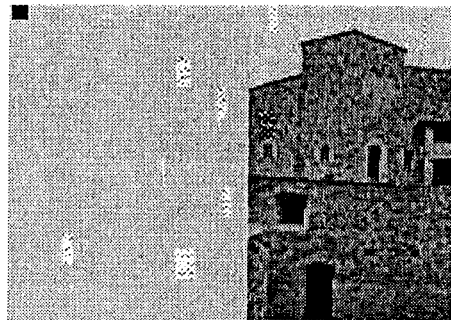

Castello di Rossena

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PIA UNIONE DOTTRINA CRISTIANA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80002590356	
Indirizzo	VIA VITTORIO VENETO, 6	REGGIO EMILIA (RE)
Recapiti	Telefono: 0522 432654	Telefax: 0522 452205

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA 00416500379	L. 3.500.000.000	L. 3.428.247.469	2,05
		Totali	L. 3.500.000.000	L. 3.428.247.469

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -550000000
DM 01/06/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.450.000.000	L. 3.950.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -81000000
Automatico	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.369.000.000	L. 3.869.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.368.935.000	L. 3.868.935.000	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -65000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)	
Opere Civili	3.100.000.000	3.249.338.839	
Opere Impiantistiche	600.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	291.915.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.000.000.000</b>		<b>3.541.253.839</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	230.000.000	330.775.468	
Altre Spese Tecniche	125.000.000		
Allacciamenti	15.000.000	14.407.650	
Imprevisti	126.000.000	8.820.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	320.000.000	325.287.589	
IVA al 20%	134.000.000	133.349.524	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>950.000.000</b>		<b>812.640.231</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.950.000.000</b>		<b>4.353.894.070</b>
	<b>Economie</b>		<b>-596.105.930</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	4.500.000.000		3.878.281.632
Risorse proprie	500.000.000		500.000.000
Altre fonti finanziare			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.000.000.000</b>		<b>4.378.281.632</b>

Protocollo d'intervento: **2688****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO LA CORTE OSPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO*

Comune **RUBIERA (RE)**

Finanziamento **L. 3.307 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.287.418.042**

- Tot. Pagato **L. 3.287.418.042**

Cofinanziamento **L. 500 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	07/09/98
Fine Lavori	30/09/99	30/11/99

*La Corte Ospitale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI RUBIERA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00441270352**

Indirizzo **VIA EMILIA EST 5** **RUBIERA (RE)**

Recapiti **Telefono: 0522 626343** **Telefax: 0522 628978**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CONSORZIO COOP. COSTRUZIONI  VIA DELLA COOPERAZIONE 30 (BO) 00281620377	L. 3.200.000.000	L. 3.007.126.359	6,03
		<b>Totali</b>	<b>L. 3.007.126.359</b>	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	- L.H. -192873641
DM 01/06/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.807.126.359	L. 3.307.126.359	L. 0	L. 500.000.000	


## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/03/01)
Opere Civili	1.800.000.000	2.141.701.859
Opere Impiantistiche	700.000.000	865.424.500
Arredi e/o Attrezzature	600.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>3.007.126.359</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	310.000.000	
Altre Spese Tecniche	60.000.000	298.290.396
Allacciamenti	15.000.000	30.000.000
Imprevisti	52.818.181	92.051.525
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	7.000.000	
IVA al 10%	253.781.818	300.712.636
IVA al 20%	201.400.000	59.658.080
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>899.999.999</b>	<b>780.712.637</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.999.999.999</b>	<b>3.787.838.996</b>
	<b>Economie</b>	<b>-212.161.003</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.307.126.000	3.287.838.995
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.807.126.000</b>	<b>3.787.838.995</b>

Protocollo d'intervento: **2695**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO ANNESSO ALL'EREMO DI BISMANTOVA PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO	
Comune	CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)	
Finanziamento	L. 350 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 350.000.000
	- Tot. Pagato	L. 350.000.000
Cofinanziamento	L. 350 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/07/98	30/07/98
Fine Lavori	31/07/99	09/07/99

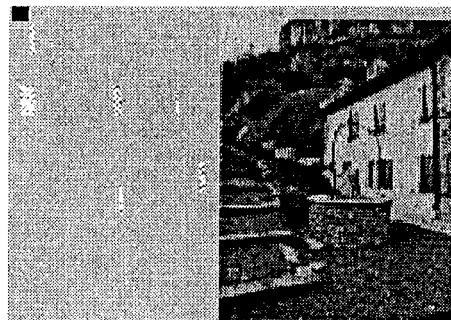

Eremo di Bismantova

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91014420359	
Indirizzo	VIA CHIESA GINEPRETO	CASTELNUOVO NE' MONTI (RE)
Recapiti	Telefono: 0522/812370	Telefax:

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
OFFERTA ECONOMICA PIU' VANTAGGIOSA	EDIL MARAZZI S.N.C.  VIA MERUZZO 8 VILLA MINOZZO (RE) 00913200358	L. 565.000.000	L. 565.000.000	0,00
		Totale	L. 565.000.000	L. 565.000.000

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 06/08/98	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 20/11/98	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 27/01/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 09/02/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 01/06/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 05/08/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 13/09/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 16/11/99	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
Automatico	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 21/07/00	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 01/08/00	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 14/12/00	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	
DM 14/02/01	L. 700.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 350.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/02/00)	
Opere Civili	269.000.000	308.000.000	
Opere Impiantistiche	76.000.000	100.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	75.000.000	80.000.000	
Altre Voci	37.000.000	77.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>457.000.000</b>	<b>565.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	47.000.000	48.600.000	
Altre Spese Tecniche	13.000.000	15.500.000	
Allacciamenti	9.000.000		
Imprevisti	80.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato		100.000	
- Opere Civili	12.700.000	1.000.000	
- Opere Impiantistiche	5.400.000	100.000	
- Arredi e/o attrezzature	5.900.000	100.000	
- Altre voci	11.300.000		
IVA al 10%	45.700.000	56.500.000	
IVA al 20%	13.000.000	13.100.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>243.000.000</b>	<b>135.000.000</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>	
0			
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		350.000.000	350.000.000
Risorse proprie		350.000.000	350.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>		<b>700.000.000</b>	<b>700.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **2909****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA ROCCA VESCOVILE DI BERTINORO A FINI DI RESIDENZE GIUBILARI*


Comune **BERTINORO (FO)**

Finanziamento **L. 3.983 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.983.044.000**

- Tot. Pagato **L. 3.983.044.000**

Cofinanziamento **L. 1.850 milioni**

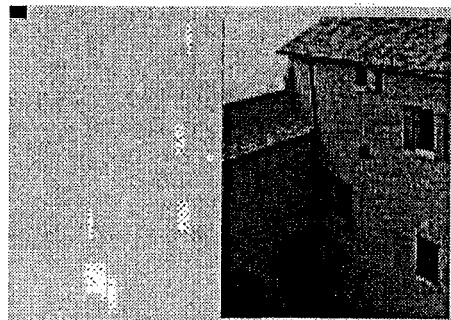*Rocca vescovile di Bertinoro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI FORLÌ BERTINORO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **92008740406**

Indirizzo **PIAZZA ALIGHIERI, 1** **FORLÌ (FO)**

Recapiti **Telefono: 0543 28240** **Telefax: 0543 24303**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	PIAZZA COSTRUZIONI DEI F.LLI PIAZZA S.N.C. VIA MONGIBELLO,120-RAGUSA 00625000880	L. 3.000.000.000	L. 2.558.040.000	14,73
<b>Totali</b>		<b>L. 3.000.000.000</b>	<b>L. 2.558.040.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.220.000.000	L. 3.120.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	+ Lit. 1263044000
DM 01/06/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.483.044.000	L. 3.633.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
Automatico	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	+ Lit. 350000000
DM 21/07/00	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.833.044.000	L. 3.983.044.000	L. 0	L. 1.850.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/12/00)
Opere Civili	2.300.000.000	4.354.146.787
Opere Impiantistiche	700.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.170.000.000</b>	<b>4.354.146.787</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	353.000.000	757.773.517
Altre Spese Tecniche	126.000.000	354.067.895
Allacciamenti	20.000.000	30.620.760
Imprevisti	67.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	30.000.000	279.935.040
IVA al 10%	300.000.000	56.499.999
IVA al 20%	154.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.050.000.000</b>	<b>1.478.897.211</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.220.000.000</b>	<b>5.833.043.998</b>
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>1.613.043.998</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.120.000.000	3.983.044.000
Risorse proprie	1.100.000.000	1.850.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.220.000.000</b>	<b>5.833.044.000</b>

Protocollo d'intervento: **3279****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER TERMINAL BUS TURISTICI E SPAZI DI SOSTA*

Comune **RAVENNA (RA)**


Finanziamento **L. 1.122 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.061.473.748**

- Tot. Pagato **L. 1.061.473.748**

Cofinanziamento **L. 600 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/09/98	03/08/98
Fine Lavori	29/05/99	30/05/99

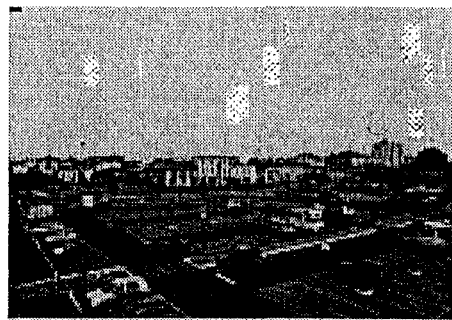*Piazza della Resistenza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00354730392**

Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1** **RAVENNA (RA)**

Recapiti **Telefono: 0544 482218** **Telefax: 0544 482359**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	C.E.R. CONS.EMIL.-ROMAG. FRA COOP. PROD.-LAV. VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA 00416500379	L. 1.768.700.000	L. 1.490.306.620	15,74
<b>Totali</b>		<b>L. 1.768.700.000</b>	<b>L. 1.490.306.620</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	- Lit. -278393280
DM 01/06/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
Automatico	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.721.606.720	L. 1.121.606.720	L. 0	L. 600.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (23/02/99)
Opere Civili	1.379.872.000	1.490.306.620
Opere Impiantistiche	282.858.000	
Arredi e/o Attrezzature	105.970.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.768.700.000</b>	<b>1.490.306.620</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	17.687.000	17.687.000
Altre Spese Tecniche	15.000.000	
Allacciamenti	15.000.000	
Imprevisti	6.743.000	6.743.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.000.000
IVA al 10%	176.870.000	149.030.662
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>231.300.000</b>	<b>203.460.662</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.693.767.282</b>
	<b>Economie</b>	<b>-306.232.718</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.400.000.000	1.093.767.282
Risorse proprie	600.000.000	600.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.693.767.282</b>

Protocollo d'intervento: **3291****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ORFANOTROFIO ISTITUTO GALLETTI ABBIOSI FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA CON SERVIZI INTERNI PER UN TOTALE DI 70 POSTI LETTO</i>	
Comune	RAVENNA (RA)	
Finanziamento	L. 4.165 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 4.164.703.000
	- Tot. Pagato	L. 4.164.703.000
Cofinanziamento	L. 2.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/08/98	17/08/98
Fine Lavori	30/09/99	21/12/99

*Ex orfanotrofio Istituto Galletti Abbiosi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCHIDIOCESI DI RAVENNA CERVIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80011000397	
Indirizzo	PIAZZA ARCIVESCOVADO, 1	RAVENNA (RA)
Recapiti	Telefono: 0544 218158	Telefax: 0544 212905

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CONS.RAV.COOP.PROD. E LAVORO VIA TEODORICO 15 RAVENNA 00080170392	L. 5.465.000.000	L. 4.710.830.000	13,80
<b>Totali</b>		<b>L. 5.465.000.000</b>	<b>L. 4.710.830.000</b>	
