

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 1.588.000.000	L. 736.000.000	L. 0	L. 852.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.588.000.000	L. 736.000.000	L. 0	L. 852.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	- Lit. -201866351
DM 01/06/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
Automatico	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.386.133.649	L. 534.133.649	L. 0	L. 852.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (20/06/00)
Opere Civili	1.270.580.000	1.255.652.000
Opere Impiantistiche	175.070.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.445.650.000	1.255.652.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	14.580.000	14.575.000
Altre Spese Tecniche	7.300.000	57.300.000
Allacciamenti	50.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	3.000.000	
- Altre voci	8.870.000	
IVA al 10%	58.300.000	50.226.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	142.050.000	122.101.000
TOTALE COSTO	1.587.700.000	1.377.753.000
	Economie	-209.947.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	534.133.649	525.753.716
Risorse proprie	852.000.000	852.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.386.133.649	1.377.753.716

Protocollo d'intervento: **3277/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI PERCORSI FRA GLI 8 MONUMENTI RAVENNATI INSERITI NELLA WORLD HERITAGE DELL'UNESCO (2° LOTTO) - PERCORSI "B", "C", "D" E "E"*

Comune **RAVENNA (RA)**

Finanziamento **L. 1.371 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.363.049.975**

- Tot. Pagato **L. 1.226.744.980**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/11/98	07/09/98
Fine Lavori	29/05/99	30/11/99



Percorsi tra i monumenti ravennati inseriti nella world heritage UNSECO

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00354730392**

Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1** **RAVENNA (RA)**

Recapiti **Telefono: 0544 482218** **Telefax: 0544 482359**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	TECNO COSTRUZIONI S.R.L. VIA G. SEMMOLA 131 ERCOLANO (NA) 01350891212	L. 1.425.405.848	L. 1.206.891.131	15,33
Totali		L. 1.425.405.848	L. 1.206.891.131	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 1.590.000.000	L. 1.590.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.590.000.000	L. 1.590.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	- Lit. -218514713
DM 01/06/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.371.485.287	L. 1.371.485.287	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE


A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (03/03/99)
Opere Civili	1.184.450.000	1.206.891.000
Opere Impiantistiche	111.740.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.296.190.000	1.206.891.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	14.250.000	14.254.000
Altre Spese Tecniche	7.200.000	7.200.000
Allacciamenti	81.930.000	81.929.000
Imprevisti	4.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	66.550.000	
- Altre voci	62.670.000	4.500.000
IVA al 10%	57.020.000	48.276.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	294.120.000	156.159.000
TOTALE COSTO	1.590.310.000	1.363.050.000
	Economie	-227.260.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.950.305.280	1.363.049.954
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.950.305.280	1.363.049.954

Protocollo d'intervento: **3278/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO
INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (1° LOTTO) -
PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE A SCAVALCO DELLA FERROVIA*

Comune **RAVENNA (RA)**Finanziamento **L. 929 milioni**- Tot. Impegnato **L. 864.451.436**- Tot. Pagato **L. 778.006.292**Cofinanziamento **L. 154 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/01/99* **04/12/98**Fine Lavori *31/08/99* **29/10/99***Parco urbano de Teodorico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00354730392**Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1****RAVENNA (RA)**Recapiti **Telefono: 0544 482218****Telefax: 0544 482359****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	ACMAR S.C. RL VIA G. ROSSI 5 RAVENNA 00070280391	L. 755.000.000	L. 695.430.500	7,89
Totali		L. 755.000.000	L. 695.430.500	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
Automatico	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.083.000.000	L. 929.000.000	L. 0	L. 154.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (11/06/99)
Opere Civili	752.000.000	695.430.500
Opere Impiantistiche	3.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	755.000.000	695.430.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	86.209.335
Altre Spese Tecniche	80.000.000	20.304.493
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	12.993.556
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	75.000.000	91.724.187
IVA al 10%	86.000.000	69.543.050
IVA al 20%	35.000.000	42.246.315
SOMME A DISPOSIZIONE	328.000.000	323.020.936
TOTALE COSTO	1.083.000.000	1.018.451.436
	Economie	-64.548.564
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	929.000.000	864.451.436
Risorse proprie	154.000.000	154.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.083.000.000	1.018.451.436

Protocollo d'intervento: **3278/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (2° LOTTO) - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE + SBAA BIGLIETTERIA*

Comune **RAVENNA (RA)**

Finanziamento **L. 356 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 342.501.475**

- Tot. Pagato **L. 308.251.330**

Cofinanziamento **L. 16 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/01/99	30/09/98
Fine Lavori	01/05/99	27/05/99

*Parco urbano de Teodorico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00354730392**

Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1** **RAVENNA (RA)**

Recapiti **Telefono: 0544 482218** **Telefax: 0544 482359**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	ITER VIA PRO.LE COTIGNOLA 17 LUGO (RA) 00205320393	L. 274.000.000	L. 263.040.000	4,00
Totali		L. 274.000.000	L. 263.040.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 27/01/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 09/02/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 01/06/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 05/08/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 13/09/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 16/11/99	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
Automatico	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 21/07/00	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 01/08/00	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 14/12/00	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	
DM 14/02/01	L. 372.000.000	L. 356.000.000	L. 0	L. 16.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (26/10/00)	
Opere Civili	214.000.000	263.040.000	
Opere Impiantistiche	60.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	274.000.000		263.040.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	13.000.000		
Altre Spese Tecniche	33.000.000	20.447.971	
Allacciamenti		11.890.890	
Imprevisti	6.000.000	19.165.591	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	6.000.000	6.126.777	
IVA al 10%	29.000.000	26.304.000	
IVA al 20%	11.000.000	11.526.246	
SOMME A DISPOSIZIONE	98.000.000		95.461.475
TOTALE COSTO	372.000.000		358.501.475
	Economie		-13.498.525
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	356.000.000		343.501.475
Risorse proprie	16.000.000		15.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	372.000.000		358.501.475

Protocollo d'intervento: **3278/C****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI TEODORICO CON PUNTI DI SOSTA RISTORO INFORMAZIONI TURISTICHE PER ACCESSO ALLA CITTA' DALLA VIA ROMEA (3° LOTTO) - PARCO/VIABILITA' PEDONALE E CICLABILE - PK - EDIFICIO DI SERVIZIO*

Comune **RAVENNA (RA)**

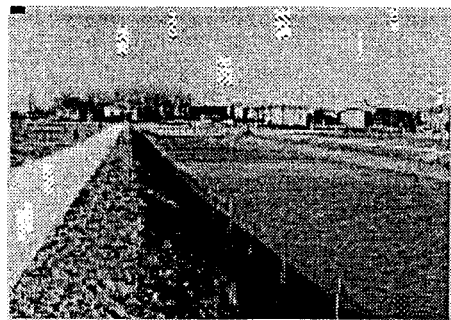
Finanziamento **L. 2.036 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.036.464.329**

- Tot. Pagato **L. 1.832.817.892**

Cofinanziamento **L. 3.050 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/08/98	15/09/98
Fine Lavori	30/09/99	29/10/99

*Parco urbano de Teodorico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI RAVENNA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00354730392**

Indirizzo **PIAZZA DEL POPOLO, 1** **RAVENNA (RA)**

Recapiti **Telefono: 0544 482218** **Telefax: 0544 482359**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	ITER S.C. RL VIA PROV. COTIGNOLA 17 LUGO (RA) 00205320393	L. 3.921.345.725	L. 3.532.348.229	9,92
Totali		L. 3.921.345.725	L. 3.532.348.229	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 5.015.000.000	L. 2.115.000.000	L. 0	L. 2.900.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.015.000.000	L. 2.115.000.000	L. 0	L. 2.900.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.626.002.504	L. 1.726.002.504	L. 0	L. 2.900.000.000	- Lit. -388997496
DM 01/06/99	L. 4.626.002.504	L. 1.726.002.504	L. 0	L. 2.900.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	+ Lit. 500000000
DM 13/09/99	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
Automatico	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.126.002.504	L. 2.076.002.504	L. 0	L. 3.050.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.086.464.329	L. 2.036.464.329	L. 0	L. 3.050.000.000	- Lit. -39538175

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (17/10/00)
Opere Civili	2.601.000.000	3.869.433.084
Opere Impiantistiche	1.183.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.784.000.000	3.869.433.084
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	210.000.000	278.690.330
Altre Spese Tecniche	78.000.000	208.452.374
Allacciamenti		8.000.000
Imprevisti	193.000.000	9.769.473
- Espropri o Acquisizioni	76.000.000	101.350.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	137.000.000	
- Altre voci	46.000.000	9.742.854
IVA al 10%	401.000.000	875.823.808
IVA al 20%	90.000.000	125.175.406
SOMME A DISPOSIZIONE	1.231.000.000	1.617.004.245
TOTALE COSTO	5.015.000.000	5.486.437.329
	Maggiore Spesa	471.437.329
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.115.000.000	2.186.464.329
Risorse proprie	2.900.000.000	2.900.000.000
Altre fonti finanziarie		400.000.000
TOTALE COPERTURE	5.015.000.000	5.486.464.329

Protocollo d'intervento: **4105/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE PALAZZO DEL PODESTA' (II° LOTTO)*
 Comune **CASTELL'ARQUATO (PC)**
 Finanziamento **L. 195 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 160.101.803**
 - Tot. Pagato **L. 160.101.803**
 Cofinanziamento **L. 400 milioni**

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CASTELL'ARQUATO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00230250334**
 Indirizzo **PIAZZA MUNICIPIO** **CASTELL'ARQUATO (PC)**
 Recapiti **Telefono: 0523 805161** **Telefax: 0523 803982**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	CONSORZIO COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO VIA GHANDI, 8 - REGGIO EMILIA 00134330356	L. 467.000.000	L. 435.290.700	6,79
Totali		L. 467.000.000	L. 435.290.700	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 20/11/98	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 27/01/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 09/02/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/06/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 595.000.000	L. 195.000.000	L. 0	L. 400.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/06/01)	
Opere Civili	467.000.000	435.274.370	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	467.000.000	435.274.370	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche	66.598.283	80.148.018	
Allacciamenti			
Imprevisti	1.151.978		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	13.549.739		
IVA al 10%		1.151.978	
IVA al 20%	46.700.000	43.527.437	
SOMME A DISPOSIZIONE	128.000.000	124.827.433	
TOTALE COSTO	595.000.000	560.101.803	
	Economie	-34.898.197	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	195.000.000	160.119.770	
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	595.000.000	560.119.770	

Protocollo d'intervento: **5322/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - MUSEO DEL TESORO DELLA CATTEDRALE - II° LOTTO*

Comune **BOLOGNA (BO)**

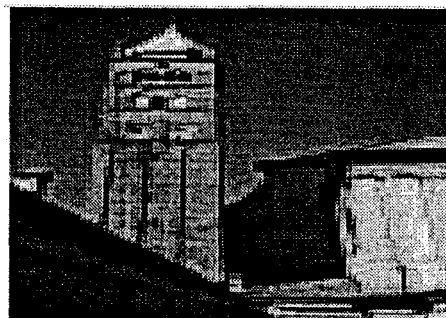
Finanziamento **L. 1.636 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.636.350.046**

- Tot. Pagato **L. 1.636.350.046**

Cofinanziamento **L. 116 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	27/07/99	27/01/99
Fine Lavori	24/10/99	13/10/99

*Cattedrale di S. Pietro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **92017150373**

Indirizzo **VIA DELL'INDIPENDENZA, 7** **BOLOGNA (BO)**

Recapiti **Telefono: 051 6480777** **Telefax: 051 235207**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		Ribasso	
LICITAZIONE PRIVATA	SCHIAVINA GEOM. ENRICO VIA DEL LAVORO 85 CASALECCHIO DI RENO (BO) 00209000371	L. 683.000.000	L. 601.040.413	12,00
Totali		L. 683.000.000	L. 601.040.413	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

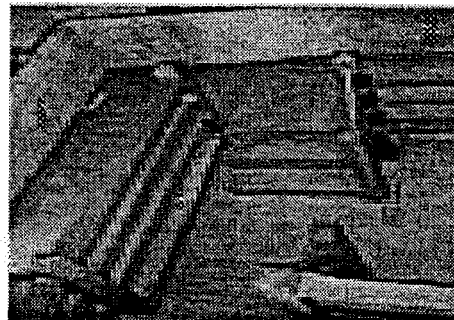
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.877.000.000	L. 1.761.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
Automatico	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	- Lit. -94000000
DM 21/07/00	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.783.000.000	L. 1.667.000.000	L. 0	L. 116.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.752.350.046	L. 1.636.350.046	L. 0	L. 116.000.000	- Lit. -30649954

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)	
Opere Civili	240.055.413	669.603.335	
Opere Impiantistiche	360.985.000		
Arredi e/o Attrezzature	395.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	996.040.413		669.603.335
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	152.000.000		
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	69.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		366.560.000	
- Altre voci	318.000.000	481.958.100	
IVA al 10%	63.504.000	66.960.335	
IVA al 20%	184.000.000	167.168.276	
SOMME A DISPOSIZIONE	786.504.000		1.082.646.711
TOTALE COSTO	1.782.544.413		1.752.250.046
	Economie		-30.294.367
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.666.544.454		1.636.350.046
Risorse proprie	116.000.000		116.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.782.544.454		1.752.350.046

Protocollo d'intervento: **5322/D****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CATTEDRALE DI S.PIETRO A BOLOGNA - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA - IV° LOTTO*
Comune **BOLOGNA (BO)**
Finanziamento **L. 1.573 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.573.141.620**
 - Tot. Pagato **L. 1.573.141.620**
Cofinanziamento **L. 180 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 27/07/99 23/01/99
Fine Lavori 24/10/99 25/10/99

*Cattedrale di S. Pietro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione CATTEDRALE METROP. DI S.PIETRO
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 92017150373
Indirizzo VIA DELL'INDIPENDENZA, 7 BOLOGNA (BO)
Recapiti Telefono: 051 6480777 Telefax: 051 235207

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA ING. L. A. MELEGARI VIA BOLDRINI 24 BOLOGNA 03211590371	L. 1.664.618.850	L. 1.352.753.143	18,73
Totali		L. 1.664.618.850	L. 1.352.753.143	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
Automatico	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.267.000.000	L. 2.087.000.000	L. 0	L. 180.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.753.141.620	L. 1.573.141.620	L. 0	L. 180.000.000	- Lit. -513858380

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (**/**/)**
Opere Civili		1.379.576.532
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	2.267.000.000	
TOTALE LAVORI	2.267.000.000	1.379.576.532
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		187.770.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		9.492.333
IVA al 10%		137.957.655
IVA al 20%		38.345.100
SOMME A DISPOSIZIONE	0	373.565.088
TOTALE COSTO	2.267.000.000	1.753.141.620
	Economie	-513.858.380
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.087.000.000	1.573.141.620
Risorse proprie	180.000.000	180.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.267.000.000	1.753.141.620

PAGINA BIANCA
