

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

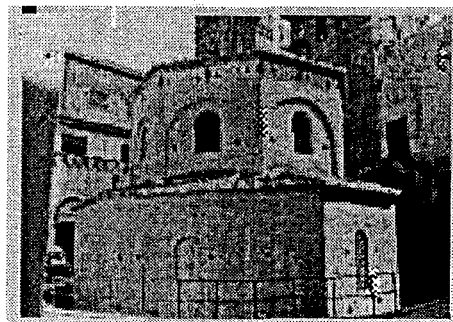
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 06/08/98	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 20/11/98	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 27/01/99	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 09/02/99	L. 900.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 01/06/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	- Lit. -32592000
DM 05/08/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 13/09/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 16/11/99	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
Automatico	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 21/07/00	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 01/08/00	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 14/12/00	L. 867.408.000	L. 707.408.000	L. 0	L. 160.000.000	
DM 14/02/01	L. 860.962.296	L. 700.962.296	L. 0	L. 160.000.000	- Lit. -6445704

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/10/00)
Opere Civili	610.000.000	669.965.724
Opere Impiantistiche	60.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	670.000.000	669.965.724
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	63.600.000	66.700.000
Altre Spese Tecniche	67.840.000	34.608.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.026.000
IVA al 10%	61.000.000	66.996.572
IVA al 20%	37.296.000	20.666.000
SOMME A DISPOSIZIONE	229.736.000	190.996.572
TOTALE COSTO	899.736.000	860.962.296
	Economie	-38.773.704
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	740.000.000	700.962.296
Risorse proprie	160.000.000	160.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	900.000.000	860.962.296

Protocollo d'intervento: **4995****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CONCLUSIONE DEL RESTAURO DEL BATTISTERO PALEOCRISTIANO DI ALBENGA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO</i>	
Comune	ALBENGA (SV)	
Finanziamento	L. 298 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 291.681.591
	- Tot. Pagato	L. 291.681.591
Cofinanziamento	L. 40 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/12/98</i>	09/11/98
Fine Lavori	<i>30/09/99</i>	23/11/99

*Battistero paleocristiano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81014340095	
Indirizzo	PIAZZA DEI LEONI, 1	ALBENGA (SV)
Recapiti	Telefono: 0182 50306-51933	Telefax: 0182 51440

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	FORMENTO FILIPPO CARLO E C. SNC VIA CALICE ZONA INDUST. FINALE LIGURE (SV) 01065030098	L. 250.000.000	L. 239.750.000	4,10
Totali		L. 250.000.000	L. 239.750.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 06/08/98	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 20/11/98	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 27/01/99	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 09/02/99	L. 350.000.000	L. 310.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/06/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	- Lit. -11562000
DM 05/08/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 13/09/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 16/11/99	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
Automatico	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 21/07/00	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/08/00	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/12/00	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/02/01	L. 338.438.000	L. 298.438.000	L. 0	L. 40.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/10/00)
Opere Civili	160.000.000	239.710.537
Opere Impiantistiche	70.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	230.000.000	239.710.537
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	30.740.000	36.000.000
Altre Spese Tecniche	37.948.000	20.667.000
Allacciamenti		
Imprevisti	8.092.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	16.000.000	23.971.054
IVA al 20%	27.220.000	11.333.000
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000	91.971.054
TOTALE COSTO	350.000.000	331.681.591
	Economie	-18.318.409
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	310.000.000	291.681.591
Risorse proprie	40.000.000	40.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	350.000.000	331.681.591

Protocollo d'intervento: **4997****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DI SPIRITUALITA' SANTA MARIA BELFIORE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO E RIAMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	
Comune	CERIALE (SV)	
Finanziamento	L. 919 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 918.988.586
	- Tot. Pagato	L. 918.988.586
Cofinanziamento	L. 250 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	19/04/99	23/04/99
Fine Lavori	06/09/99	29/12/99

*Casa di spiritualità S. Maria Belfiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI ALBENGA - IMPERIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81014340095	
Indirizzo	PIAZZA DEI LEONI, 1	ALBENGA (SV)
Recapiti	Telefono: 0182 50306-51933	Telefax: 0182 51440

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA A TRATTATIVA PRIVATA	GROSSO PIETRO SRL COSTRUZIONI IMPERIA	L. 775.000.000	L. 666.422.500	14,01
TRATTATIVA PRIVATA	ERRE SPA / DIMES SRL / SANZONE SPA / e altre V. ARGINE SINISTRO-IM / V. PROV. PER MO NOVI DI MO	L. 775.000.000	L. 666.422.500	14,01
Totali		L. 1.550.000.000	L. 1.332.845.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
Automatico	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.300.000.000	L. 1.050.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.168.988.586	L. 918.988.586	L. 0	L. 250.000.000	- Lit. -131011414

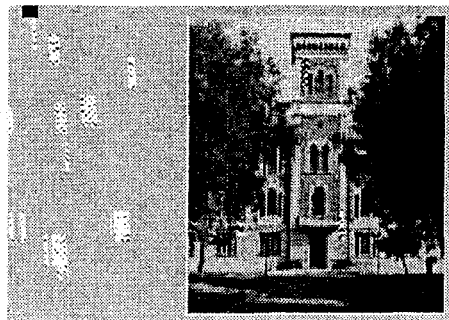
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (05/10/99)
Opere Civili	625.000.000	537.437.500
Opere Impiantistiche	150.000.000	128.985.000
Arredi e/o Attrezzature	197.000.000	197.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	972.000.000	863.422.500
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	69.360.000	69.360.000
Altre Spese Tecniche	41.820.000	41.820.000
Allacciamenti		
Imprevisti	184.000	184.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	216.636.000	194.484.500
SOMME A DISPOSIZIONE	328.000.000	305.848.500
TOTALE COSTO	1.300.000.000	1.169.271.000
	Economie	-130.729.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.050.000.000	919.271.000
Risorse proprie	250.000.000	250.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.300.000.000	1.169.271.000

Protocollo d'intervento: **4998****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SEMINARIO VESCOVILE DELLA DIOCESI DI ALBENGA		
Comune	ALBENGA (SV)		
Finanziamento	L. 1.263 milioni		
	- Tot. Impegnato	L. 1.262.984.026	
	- Tot. Pagato	L. 1.262.984.026	
Cofinanziamento	L. 100 milioni		
	Previsione	Effettiva	
Inizio Lavori	09/10/98	09/10/98	
Fine Lavori	31/08/99	18/09/99	



*Seminario Vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	SEM. VESCOVILE DI ALBENGA IMPERIA		
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);		
C.Fis./P.IVA	81000330092		
Indirizzo	LUNGOMARE ANDREA DORIA, 5	ALBENGA (SV)	
Recapiti	Telefono: 0182 50443	Telefax: 0182 554914	

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA INFORMALE	EDILMAR SAS DI ROSSI FILIPPO E C. VIA GRAMSCI, 2 SAVONA 00165150095	L. 1.030.000.000	L. 885.903.000	13,99
Totali		L. 1.030.000.000	L. 885.903.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.420.000.000	L. 1.320.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -171784000
DM 05/08/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.248.216.000	L. 1.148.216.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.362.984.026	L. 1.262.984.026	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 114768026

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/08/00)
Opere Civili	800.000.000	648.613.426
Opere Impiantistiche	230.000.000	237.289.512
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.030.000.000	885.902.938
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	63.600.000	
Altre Spese Tecniche	85.860.000	149.430.000
Allacciamenti		
Imprevisti	5.780.000	5.584.500
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	160.000.000	177.180.588
IVA al 20%	74.760.000	29.886.000
SOMME A DISPOSIZIONE	390.000.000	362.081.088
TOTALE COSTO	1.420.000.000	1.247.984.026
	Economie	-172.015.974
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.320.000.000	1.147.984.026
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.420.000.000	1.247.984.026

Protocollo d'intervento: **5523****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO CONSERVATIVO DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI PER UNA RIFUNZIONALIZZAZIONE QUALE STRUTTURA RICETTIVA RELIGIOSA CON ADEGUAMENTO DELLA ACCESSIBILITA' E DELLE AREE DI PERTINENZA</i>	
Comune	MONTEROSSO AL MARE (SP)	
Finanziamento	L. 1.280 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.067.968.661
	- Tot. Pagato	L. 961.171.794
Cofinanziamento	L. 479 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	11/11/98	11/11/98
Fine Lavori	30/07/99	30/07/99

*Convento dei Cappuccini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PROV. GENOVA FRATI MINORI CAPPUCCINI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80017130107	
Indirizzo	PIAZZA CAPPUCCINI, 1	GENOVA (GE)
Recapiti	Telefono: 010 812747	Telefax: 010 8398519

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
Trattativa privata	Cooperativa Edile Savonese s.c.r.l. via Paleocapa, 4/8, Savona 00098730096	L. 1.332.180.000	L. 1.290.882.420	3,10
Totali		L. 1.332.180.000	L. 1.290.882.420	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.626.000.000	L. 1.147.000.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.546.970.000	L. 1.067.970.000	L. 0	L. 479.000.000	- Lit. -79030000
DM 01/06/99	L. 1.546.970.000	L. 1.067.970.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	+ Lit. 212500000
DM 13/09/99	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
Automatico	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.759.470.000	L. 1.280.470.000	L. 0	L. 479.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (**/**/)**
Opere Civili	900.000.000	906.822.000
Opere Impiantistiche	270.000.000	267.780.000
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	96.900.000
Altre Voci	20.000.000	19.380.000
TOTALE LAVORI	1.290.000.000	1.290.882.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	63.500.000	58.500.000
Altre Spese Tecniche	20.000.000	25.000.000
Allacciamenti	4.000.000	4.000.000
Imprevisti	62.180.000	22.180.000
- Espropri o Acquisizioni	20.000.000	
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	125.620.000	131.306.000
IVA al 20%	40.700.000	17.500.000
SOMME A DISPOSIZIONE	336.000.000	258.486.000
TOTALE COSTO	1.626.000.000	1.549.368.000
	Economie	-76.632.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.067.970.000	1.280.470.000
Risorse proprie	479.000.000	479.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.546.970.000	1.759.470.000

Protocollo d'intervento: **5656****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>IL MONASTERO DEL TERZO MILLENNIO E L' OSPITALITA' BENEDETTINA</i>	
Comune	LA SPEZIA (SP)	
Finanziamento	L. 7.272 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 7.271.698.990
	- Tot. Pagato	L. 7.271.698.990
Cofinanziamento	L. 3.905 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>11/11/96</i>	11/11/96
Fine Lavori	<i>31/08/99</i>	20/12/99

*Monastero di S. Maria del Mare***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	MONASTERO S. MARIA DEL MARE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80005970118	
Indirizzo	PIAZZALE S. STEFANO, 1	MARINASCO (SP)
Recapiti	Telefono: 0187 711332	Telefax: 0187 711332

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA GOBBI FRATELLI SNC Va Caraggio - Cerea (VR) 01809570235	L. 224.730.028	L. 217.988.128	3,00
AFFIDAMENTO A DITTA ESECUTRICE CON CONTRATTO GIÀ IN ESSERE	ITI S A S VIA DELLA MUTTA 7/A PARMA 00151750346	L. 834.263.000	L. 792.549.850	5,00
AFFIDAMENTO A DITTA ESECUTRICE CON CONTRATTO IN ESSERE	BOSI GIORGIO IMPIANTI ELETTRICI SRL Via Sartori n., 18/A - Parma 00747400349	L. 928.400.000	L. 881.980.000	5,00
RIAFFIDAMENTO A DITTA ESECUTRICE CON CONTRATTO IN ESSERE	COSTRUZIONI ADORNI A di Adorni geom. Nello SRL. Borgo delle Colonne, 1 01043070341	L. 4.255.600.000	L. 4.042.820.000	5,00
Totali		L. 6.242.993.028	L. 5.935.337.978	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 06/08/98	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 20/11/98	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 27/01/99	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 09/02/99	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 01/06/99	L. 11.527.000.000	L. 7.622.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 05/08/99	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	- Lit. -331000000
DM 13/09/99	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 16/11/99	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
Automatico	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 21/07/00	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 01/08/00	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 14/12/00	L. 11.196.000.000	L. 7.291.000.000	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	
DM 14/02/01	L. 11.176.698.990	L. 7.271.698.990	L. 155.000.000	L. 3.750.000.000	- Lit. -19301010

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/00)
Opere Civili	6.671.450.000	5.812.999.850
Opere Impiantistiche	1.510.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	650.000.000	
Altre Voci	500.000.000	
TOTALE LAVORI	9.331.450.000	5.812.999.850
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	445.000.000	500.523.760
Altre Spese Tecniche	110.000.000	
Allacciamenti	42.000.000	41.933.000
Imprevisti	95.650.000	
- Espropri o Acquisizioni	351.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		217.988.128
- Altre voci	99.750.000	3.905.000.000
IVA al 10%	933.150.000	581.299.987
IVA al 20%	119.000.000	116.954.265
SOMME A DISPOSIZIONE	2.195.550.000	5.363.699.140
TOTALE COSTO	11.527.000.000	11.176.698.990
	Economie	-350.301.010
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	7.622.000.000	7.271.698.990
Risorse proprie	3.905.000.000	3.905.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	11.527.000.000	11.176.698.990

Protocollo d'intervento: **5753****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	CREAZIONE DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO COSTO NELL'AMBITO DEL COMPLESSO DELLA COMMENDA DI PRE'	
Comune	GENOVA (GE)	
Finanziamento	L. 973 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 933.059.925
	- Tot. Pagato	L. 933.059.925
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	24/11/98
Fine Lavori	30/09/99	30/12/99



Commenda di S. Giovanni di Pré

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	GRAN PRIORALE DI GENOVA E LIG.		
Categoria	AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);		
C.Fis./P.IVA	CTFLC14A24C351R		
Indirizzo	VICO SINISTRO CORO DI S. PANCRAZIO, 3	GENOVA (GE)	
Recapiti	Telefono: 010 2511897	Telefax: 010 2513131	

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	SPAZIO ERRE TI ARREDAMENTI VIA FATEBENEFRATELLI MILANO	L. 15.000.000	L. 14.656.000	2,29
	BAGHINO E DI PERSIO VIA DASSORI 49/4 16131 GENOVA	L. 61.850.000	L. 44.362.000	28,27
	Cresta Alberto e Figli s. n. c. via argine Polcevera, 23 Genova 00431830108	L. 607.991.171	L. 580.631.569	4,50
Totali		L. 684.841.171	L. 639.649.569	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 933.000.000	L. 933.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 972.600.000	L. 972.600.000	L. 0	L. 0 + Lit. 39600000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/09/01)
Opere Civili	367.000.000	
Opere Impiantistiche	222.000.000	743.593.798
Arredi e/o Attrezzature	71.000.000	104.221.169
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	660.000.000	847.814.967
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	66.000.000	48.288.965
Altre Spese Tecniche	40.000.000	44.743.250
Allacciamenti		
Imprevisti	50.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	40.000.000	
IVA al 20%	77.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	273.000.000	93.032.215
TOTALE COSTO	933.000.000	940.847.182
	Maggiore Spesa	7.847.182
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	933.000.000	933.059.925
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		7.787.257
TOTALE COPERTURE	933.000.000	940.847.182

Protocollo d'intervento: **5763****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE*Comune **SAVONA (SV)**Finanziamento **L. 681 milioni**- Tot. Impegnato **L. 680.682.048**- Tot. Pagato **L. 680.682.040**Cofinanziamento **L. 387 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *08/11/97* **08/11/97**Fine Lavori *30/05/99* **20/10/99***Seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SEMINARIO VESCOVILE DI SAVONA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80004570091**Indirizzo **VIA PONZONE, 5****SAVONA (SV)**Recapiti **Telefono: 019 853317****Telefax: 019 853317****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA DI FIDUCIA	ERMELLINO S.N.C. VIA P.SCOTTI 42 SAVONA	L. 582.326.000	L. 582.326.000	0,00
Totali		L. 582.326.000	L. 582.326.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 06/08/98	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 20/11/98	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 27/01/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 09/02/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 01/06/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 05/08/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 13/09/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 16/11/99	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
Automatico	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 21/07/00	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 01/08/00	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 14/12/00	L. 961.000.000	L. 681.000.000	L. 0	L. 280.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.068.005.407	L. 680.682.048	L. 0	L. 387.323.359	+ Lit. 107005407

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/03/00)
Opere Civili	592.870.000	670.433.163
Opere Impiantistiche	151.330.000	222.281.991
Arredi e/o Attrezzature	81.180.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	825.380.000	892.715.154
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	44.770.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	210.000	
IVA al 10%	90.640.000	
IVA al 20%		175.290.253
SOMME A DISPOSIZIONE	135.620.000	175.290.253
TOTALE COSTO	961.000.000	1.068.005.407
	Maggiore Spesa	107.005.407
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	681.000.000	680.682.048
Risorse proprie	280.000.000	387.323.359
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	961.000.000	1.068.005.407

Protocollo d'intervento: **7620****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO TVCC PER LA SALVAGUARDIA E LA SICUREZZA DEI PELLEGRINI IN TRANSITO*
Comune **GENOVA (GE)**
Finanziamento **L. 970 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 859.253.745**
- Tot. Pagato **L. 859.253.745**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	09/04/99
Fine Lavori	08/05/99	30/09/99

*Sistema di videocontrollo TVCC***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**
Categoria **AB Enti pubblici**
C.Fis./P.IVA **00807480108**
Indirizzo **PALAZZO S.GIORGIO VIA DELLA MERCANZIA 2 GENOVA (GE)**
Recapiti **Telefono: 010 2412789 Telefax: 010 2412382**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
trattativa privata	SET - Società e Sistemi Telematica s.p.a. Via al molo Giano - Calata Grazie 16128 Genova 002668630102	L. 799.670.800	L. 799.670.800	0,00
Totali		L. 799.670.800	L. 799.670.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 970.000.000	L. 970.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/01/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	240.000.000	726.973.527
Arredi e/o Attrezzature	580.000.000	
Altre Voci	45.000.000	
TOTALE LAVORI	865.000.000	726.973.527
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.000.000	48.350.931
Altre Spese Tecniche	30.000.000	1.301.457
Allacciamenti		
Imprevisti	66.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		72.697.353
IVA al 20%		9.930.477
SOMME A DISPOSIZIONE	105.000.000	132.280.218
TOTALE COSTO	970.000.000	859.253.745
	Economie	-110.746.255
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	970.000.000	859.253.745
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	970.000.000	859.253.745

Protocollo d'intervento: **5869/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OSPIZIO NUOVO - ACCOGLIENZA PELLEGRINI E SERVIZI*Comune **CERANESI (GE)**Finanziamento **L. 3.899 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.354.256.777**- Tot. Pagato **L. 3.354.256.777**Cofinanziamento **L. 1.971 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *21/07/98* **14/04/99**Fine Lavori *30/10/99* **12/11/99***Santuario di Nostra Signora della Guardia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80013610102**Indirizzo **MONTE FIGOGNA****CERANESI (GE)**Recapiti **Telefono: 010 718010****Telefax: 010 718011****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
Licitazione Privata	S. Gallo Srl P.zza S. Matteo 16/2 (GE) 00265590109	L. 1.448.299.999	L. 1.448.299.999	0,00
Licitazione Privata	ATI Cos.Mo. S.a.s. di Giorgio Marini e C. via F. Pozzo 9/2 Genova 00241730100	L. 3.154.728.900	L. 2.766.697.245	12,30
Totali		L. 4.603.028.899	L. 4.214.997.244	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
Automatico	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.241.000.000	L. 4.270.000.000	L. 0	L. 1.971.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.870.405.309	L. 3.899.405.309	L. 0	L. 1.971.000.000	- Lit. -370594691

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili		1.297.099.999
Opere Impiantistiche		2.516.487.520
Arredi e/o Attrezzature		461.076.000
Altre Voci	6.241.000.000	
TOTALE LAVORI	6.241.000.000	4.274.663.519
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		353.674.800
Altre Spese Tecniche		53.608.400
Allacciamenti		19.478.732
Imprevisti		102.439.458
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		443.792.668
IVA al 20%		77.599.200
SOMME A DISPOSIZIONE	0	1.050.593.258
TOTALE COSTO	6.241.000.000	5.325.256.777
	Economie	-915.743.223
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.270.000.000	3.354.256.777
Risorse proprie	1.971.000.000	1.971.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	6.241.000.000	5.325.256.777
