

## SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

### Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

Si riportano, nel presente volume, le schede di sintesi dei singoli interventi inseriti nel Piano, relative alle seguenti Regioni:

- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi dell'intervento
- dati relativi al titolare dell'intervento
- dati relativi all'appalto
- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale
- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

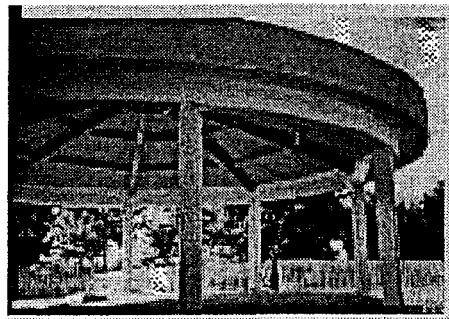
Si rammenta, come anticipato nell'introduzione di cui al volume I, che la Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli interventi, in ragione della mancata chiusura delle attività di collaudo da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi. Si fa riserva, dunque, di produrre un documento integrativo, non appena verranno rese disponibili le succitate informazioni.

PAGINA BIANCA

## LOMBARDIA

Protocollo d'intervento: **1132****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E RISTORO*Comune **CERTOSA DI PAVIA (PV)**Finanziamento **L. 397 milioni**- Tot. Impegnato **L. 397.445.992**- Tot. Pagato **L. 397.445.992**Cofinanziamento **L. 161 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *27/12/98* **31/05/99**Fine Lavori *25/07/99* **05/11/99***Certosa di Pavia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **96007600180**Indirizzo **VIA PARTIGIANI, 50****CERTOSA DI PAVIA (PV)**Recapiti **Telefono: 0382 925575****Telefax: 0382 925575****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	Franco Girelli s.n.c. via Cascine, 12	L. 461.365.038	L. 459.058.213	0,50
<b>Totali</b>		<b>L. 461.365.038</b>	<b>L. 459.058.213</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

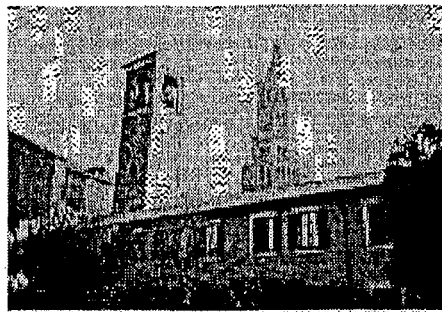
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 06/08/98	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 20/11/98	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 27/01/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 09/02/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 01/06/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 05/08/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 13/09/99	L. 480.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 80.000.000	
DM 16/11/99	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	+ Lit. 81347534
Automatico	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 21/07/00	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 01/08/00	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 14/12/00	L. 561.347.534	L. 400.000.000	L. 0	L. 161.347.534	
DM 14/02/01	L. 558.793.526	L. 397.445.992	L. 0	L. 161.347.534	- Lit. -2554008

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/09/00)
Opere Civili	375.000.000	467.043.213
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>375.000.000</b>	<b>467.043.213</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	35.000.000	34.538.327
Altre Spese Tecniche	3.000.000	3.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	21.900.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	37.500.000	46.704.321
IVA al 20%	7.600.000	7.507.665
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>105.000.000</b>	<b>91.750.313</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>480.000.000</b>	<b>558.793.526</b>
	Maggiore Spesa	78.793.526
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	397.445.992
Risorse proprie	80.000.000	161.347.534
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>480.000.000</b>	<b>558.793.526</b>

Protocollo d'intervento: **1820****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **CHIARAVALLE 2000-LAVORI DI RECUPERO**  
 Comune **MILANO (MI)**  
 Finanziamento **L. 2.817 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 2.817.121.756**  
 - Tot. Pagato **L. 2.817.121.756**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**  
 Previsione Effettiva  
 Inizio Lavori **18/10/98 16/10/98**  
 Fine Lavori **15/07/99 02/12/99**

*Abbazia di Chiaravalle***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **MONASTERO CISTERCENSE CHIARAVALLE**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **08654340150**  
 Indirizzo **VIA SANT'ARIALDO, 102 MILANO (MI)**  
 Recapiti **Telefono: 02 57403404 Telefax: 02 57403404**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	COHESA s.r.l. VIA DEPRETIS, 11 BERGAMO	L. 0	L. 43.715.400	0,00
	FOGLIA & C. S.R.L. VIA SANNITARA 6/8 PARMA	L. 0	L. 104.400.000	0,00
	LAURORA & C. S.R.L. VIA C. IMBONATI, 17 MILANO	L. 0	L. 21.800.000	0,00
	LAURORA & C. S.R.L. VIA C. IMBONATI, 17 MILANO	L. 0	L. 29.930.000	0,00
	LAURORA & C. S.R.L. VIA C. IMBONATI, 17 MILANO	L. 0	L. 64.830.200	0,00
	PANSERI ASCENSORI S.R.L. VIA MONTE ORTIGARA, 1 BERGAMO	L. 0	L. 57.000.000	0,00
TRATT. PRIV.	FOGLIA E C. via SANNITARA 6/8 PARMA 01868960343	L. 1.550.000.000	L. 1.509.700.000	2,60
TRATTATIVA PRIVATA	FOGLIA ME C. via SANNITARA 6/8 PARMA 01868960343	L. 1.550.000.000	L. 1.509.700.000	2,60
Totali		L. 3.100.000.000	L. 3.341.075.600	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.537.000.000	L. 2.537.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.491.240.000	L. 2.491.240.000	L. 0	L. 0	- Lit. -45760000
DM 05/08/99	L. 2.491.240.000	L. 2.491.240.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.491.240.000	L. 2.491.240.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 330500000
Automatico	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.821.740.000	L. 2.821.740.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.817.121.756	L. 2.817.121.756	L. 0	L. 0	- Lit. -4618244

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/05/00)
Opere Civili	1.200.000.000	1.334.700.000
Opere Impiantistiche	350.000.000	472.000.000
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	350.300.641
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.850.000.000</b>	<b>2.157.000.641</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	215.000.000	230.000.000
Altre Spese Tecniche	155.000.000	140.000.000
Allacciamenti	20.000.000	25.760.400
Imprevisti	60.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	22.000.000	
IVA al 10%	215.000.000	22.323.586
IVA al 20%		242.037.129
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>687.000.000</b>	<b>660.121.115</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.537.000.000</b>	<b>2.817.121.756</b>
	Maggiore Spesa	280.121.756
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.537.000.000	2.817.121.756
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.537.000.000</b>	<b>2.817.121.756</b>

Protocollo d'intervento: 1971

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *L'ACCOGLIENZA FRANCESCANA NEGLI ITINERARI ANTICHI E MODERNI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 - OPERA SAN FRANCESCO*

Comune **MILANO (MI)**

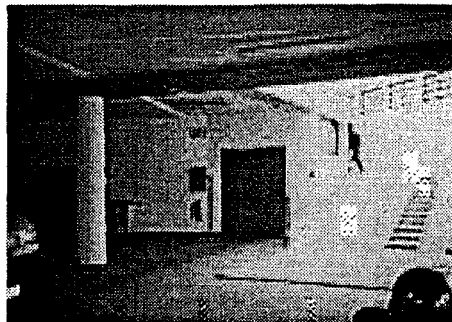
Finanziamento **L. 1.575 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.575.000.000**

- Tot. Pagato **L. 1.417.500.000**

Cofinanziamento **L. 1.497 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	28/07/98	22/12/98
Fine Lavori	23/07/99	30/10/99



*Opera S. Francesco - Immobile di corso Concordia*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROV LOMBARDA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **80050930157**

Indirizzo **VIALE PIAVE, 2** **MILANO (MI)**

Recapiti **Telefono: 02 784640** **Telefax: 02 7601695**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV.	FANTIN COSTRUZIONI EDIL S.P.A. VIA ANFOSSI 2 MILANO	L. 2.734.000.000	L. 2.348.232.609	14,11

Totali L. 2.734.000.000 L. 2.348.232.609



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

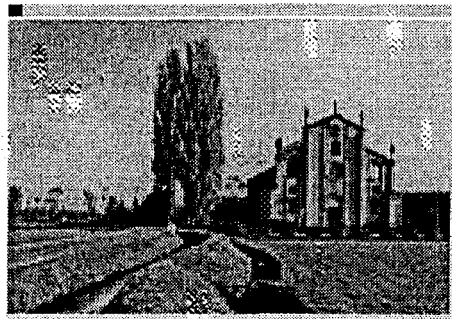
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.497.000.000	L. 2.000.000.000	L. 400.000.000	L. 1.097.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	Lit. -425000000
DM 01/06/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
Automatico	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.072.000.000	L. 1.575.000.000	L. 0	L. 1.497.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (19/05/99)
Opere Civili	2.072.000.000	1.713.000.000
Opere Impiantistiche	700.000.000	635.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.772.000.000</b>	<b>2.348.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	143.000.000	148.000.000
Altre Spese Tecniche	103.000.000	136.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	138.000.000	135.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	292.000.000	248.000.000
IVA al 20%	49.000.000	57.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>725.000.000</b>	<b>724.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.497.000.000</b>	<b>3.072.000.000</b>
	Economie	-425.000.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.575.000.000	1.575.000.000
Risorse proprie	1.497.000.000	1.497.000.000
Altre fonti finanziarie	400.000.000	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.472.000.000</b>	<b>3.072.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **2155****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PER L'ACCESSIBILITA' E L'ACCOGLIENZA*Comune **LODI VECCHIO (LO)**Finanziamento **L. 396 milioni**- Tot. Impegnato **L. 395.728.002**- Tot. Pagato **L. 395.728.002**Cofinanziamento **L. 415 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **28/02/99** **02/06/99**Fine Lavori **31/07/99** **25/11/99***Basilica di S. Bassiano o dei XII Apostoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LODI VECCHIO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **84502880150**Indirizzo **P.ZZA VITTORIO EMANUELE II****LODI VECCHIO (LO)**Recapiti **Telefono: 0371 460189****Telefax: 0371 754351****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
trattativa privata	CESARI S.r.l. Via Valsasino, 1	L. 134.849.262	L. 118.937.049	11,80
PUBBLICO INCANTO		L. 215.750.000	L. 191.521.276	11,23
PUBBLICO INCANTO	CASARI S.r.l. Via Valsasino, 1	L. 215.750.000	L. 191.521.276	11,23
Totali		L. 566.349.262	L. 501.979.601	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 06/08/98	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 20/11/98	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 27/01/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 09/02/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 01/06/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 05/08/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 13/09/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 16/11/99	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
Automatico	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 21/07/00	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 01/08/00	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 14/12/00	L. 918.000.000	L. 503.000.000	L. 73.000.000	L. 342.000.000	
DM 14/02/01	L. 810.728.002	L. 395.728.002	L. 73.000.000	L. 342.000.000	Lit. -107271998

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/07/00)	
Opere Civili	513.000.000	451.202.020	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>513.000.000</b>	<b>451.202.020</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	70.000.000	90.374.370	
Altre Spese Tecniche	42.000.000	7.311.000	
Allacciamenti	10.000.000	758.500	
Imprevisti	50.000.000	9.709.000	
- Espropri o Acquisizioni	80.000.000	37.055.000	
- Area o Fabbriato		140.237.180	
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		45.196.052	
IVA al 20%	153.000.000	28.889.871	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>405.000.000</b>	<b>359.530.973</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>918.000.000</b>	<b>810.732.993</b>	
	Economie		-107.267.007
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	503.000.000		395.732.993
Risorse proprie	342.000.000		342.000.000
Altre fonti finanziarie	73.000.000		73.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>918.000.000</b>		<b>810.732.993</b>

Protocollo d'intervento: **2405****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI RUINO*

Comune **RUINO (PV)**

Finanziamento **L. 501 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 501.380.500**

- Tot. Pagato **L. 500.267.300**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/10/98	31/10/98
Fine Lavori	31/07/99	31/07/99



*Ex canonica della Parrocchia di S. Pietro  
Apostolo*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **00961700184**

Indirizzo **FRAZIONE RUINO** **RUINO (PV)**

Recapiti **Telefono: 0385 98843** **Telefax: 0385 955897**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	L. 47.928.000	L. 47.928.000	0,00
	EDIL MONTE SNC FR. MOLINE,40 ZAVATTARELLO (PV) 00331270181	L. 365.000.000	L. 364.452.500	0,15
Totali		L. 412.928.000	L. 412.380.500	
