

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 508.000.000	L. 508.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 500.814.800	L. 500.814.800	L. 0	L. 0	- Lit. -7185200

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

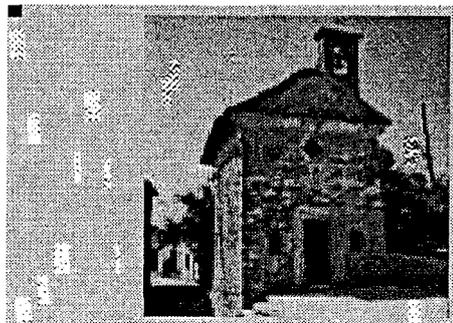
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/07/00)	
Opere Civili	300.000.000	358.867.000	
Opere Impiantistiche	50.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	54.000.000	47.928.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	404.000.000		406.795.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	37.000.000	40.000.000	
Altre Spese Tecniche	3.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	15.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	41.000.000	35.886.700	
IVA al 20%	8.000.000	17.585.600	
SOMME A DISPOSIZIONE	104.000.000		93.472.300
TOTALE COSTO	508.000.000		500.267.300
	Economie		-7.732.700
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	508.000.000		500.267.300
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	508.000.000		500.267.300

Protocollo d'intervento: **2406****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PROGETTO RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELLA CANONICA DELLA PARROCCHIA DI POMETO E DELL'ANTICO ORATORIO DE CA DEL MATTO*

Comune **RUINO (PV)**Finanziamento **L. 387 milioni**- Tot. Impegnato **L. 392.763.000**- Tot. Pagato **L. 386.883.400**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/10/98* **31/10/98**Fine Lavori *31/07/99* **31/07/99**

*Canonica della Parrocchia di Pometo e Oratorio
Cà del Matto*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **93001840185**Indirizzo **FRAZIONE POMETO****RUINO (PV)**Recapiti **Telefono: 0385 98824****Telefax: 0385 955897****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	IMPRESA EDILE CAI GIULIANO QUINTINO POMETO DI RUINO (PV) 00147370183	L. 244.000.000	L. 243.756.000	0,10
Totali		L. 244.000.000	L. 243.756.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

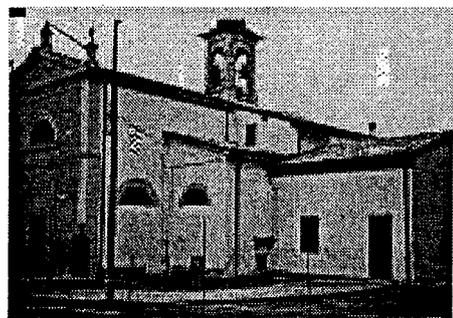
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 396.000.000	L. 396.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 387.335.400	L. 387.335.400	L. 0	L. 0	- Lit. -8664600

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/07/00)	
Opere Civili	230.000.000	287.114.000	
Opere Impiantistiche	55.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	27.215.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	315.000.000		314.329.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	29.000.000	32.000.000	
Altre Spese Tecniche	3.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	11.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	31.000.000	28.711.400	
IVA al 20%	7.000.000	11.843.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	81.000.000		72.554.400
TOTALE COSTO	396.000.000		386.883.400
	Economie		-9.116.600
COPERTURA FINANZIARIA			
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Risorse proprie	396.000.000		386.883.400
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	396.000.000		386.883.400

Protocollo d'intervento: **2407****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO PAVESE DELL'ALTA VAL TIDONE SULLA ROTTA GIUBILARE DELLA VIA FRANCIGENA RECUPERO DELL'EX CANONICA DELLA PARROCCHIA DI TORRE DEGLI ALBERI</i>	
Comune	RUINO (PV)	
Finanziamento	L. 308 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 307.776.000
	- Tot. Pagato	L. 307.776.000
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/10/98	31/10/98
Fine Lavori	31/07/99	31/07/99



Ex canonica della Parrocchia di Torre degli Alberi

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA DEL SS. NOME DI MARIA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	84000990188	
Indirizzo	FRAZIONE TORRE DEGLI ALBERI	RUINO (PV)
Recapiti	Telefono: 0383 875231	Telefax: 0385 955897

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	Franco Girelli s.n.c via Cascine 12	L. 30.419.000	L. 30.419.000	0,00
	REFA DI ZANOTTI A. VIA CASA D'AGOSTO VALVERDE (PV) 01429000183	L. 224.000.000	L. 223.776.000	0,10
Totali		L. 254.419.000	L. 254.195.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 308.000.000	L. 308.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 307.776.000	L. 307.776.000	L. 0	L. 0	Lit. -224000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (21/07/00)	
Opere Civili	180.000.000	220.618.000	
Opere Impiantistiche	35.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	30.419.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	245.000.000		251.037.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	22.000.000	23.827.833	
Altre Spese Tecniche	2.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	9.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	24.000.000	22.061.800	
IVA al 20%	6.000.000	10.849.367	
SOMME A DISPOSIZIONE	63.000.000		56.739.000
TOTALE COSTO	308.000.000		307.776.000
	Economie		-224.000
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		308.000.000	307.776.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE		308.000.000	307.776.000

Protocollo d'intervento: **2558****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO*

Comune **ORIO LITTA (LO)**

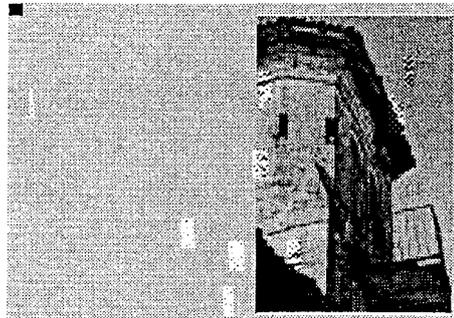
Finanziamento **L. 1.509 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.509.111.091**

- Tot. Pagato **L. 1.358.199.976**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/12/98	31/03/99
Fine Lavori	20/08/99	23/03/00

*Ex cascina S. Pietro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI ORIO LITTA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **82503970152**

Indirizzo **PIAZZA A. MORO, 2** **ORIO LITTA (LO)**

Recapiti **Telefono: 0377 944425** **Telefax: 0377 804370**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBB. INC.	DE FABIANI GIUSEPPE P.ZZA MATTEOTTI, 9 CAVENAGO D'ADDA 08015400156	L. 1.063.981.448	L. 890.446.075	16,31
Totali		L. 1.063.981.448	L. 890.446.075	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

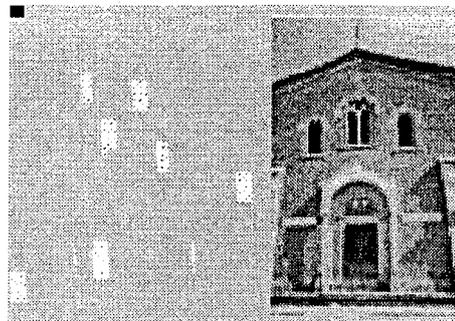
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.900.000.000	L. 1.700.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -174000000
DM 16/11/99	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.726.000.000	L. 1.526.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.709.111.091	L. 1.509.111.091	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -16888909

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (19/03/01)	
Opere Civili	605.000.000	696.166.840	
Opere Impiantistiche	200.000.000	128.867.790	
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000		
Altre Voci	220.000.000	198.367.740	
TOTALE LAVORI	1.145.000.000		1.023.402.370
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	103.000.000	102.000.000	
Altre Spese Tecniche	99.000.000	102.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	59.000.000		
- Espropri o Acquisizioni	300.000.000	300.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	17.000.000	28.144.514	
- Opere Impiantistiche	5.500.000	3.783.690	
- Arredi e/o attrezzature	3.500.000		
- Altre voci	5.500.000	5.824.280	
IVA al 10%	122.000.000	102.340.237	
IVA al 20%	40.500.000	41.616.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	755.000.000		685.708.721
TOTALE COSTO	1.900.000.000		1.709.111.091
	Economie		-190.888.909
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.700.000.000		1.509.111.091
Risorse proprie	200.000.000		200.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.900.000.000		1.709.111.091

Protocollo d'intervento: **3151****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. EUSTORGIO*Comune **MILANO (MI)**Finanziamento **L. 1.251 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.250.596.000**- Tot. Pagato **L. 1.250.596.000**Cofinanziamento **L. 842 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **10/11/98**Fine Lavori *01/08/99* **15/10/99***Complesso monumentale di S. Eustorgio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. EUSTORGIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80036670158**Indirizzo **PIAZZA S. EUSTORGIO, 1****MILANO (MI)**Recapiti **Telefono: 02 58101583****Telefax: 02 89400589**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

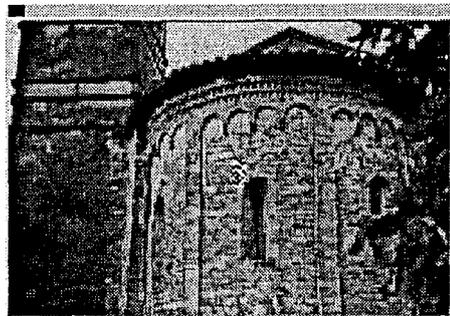
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.132.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.132.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.764.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 474.000.000	- Lit. -368000000
DM 27/01/99	L. 1.764.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 474.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.132.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 842.000.000	+ Lit. 368000000
DM 01/06/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	- Lit. -38964000
DM 05/08/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
Automatico	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.093.036.000	L. 1.251.036.000	L. 0	L. 842.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.092.596.000	L. 1.250.596.000	L. 0	L. 842.000.000	- Lit. -440000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/07/00)
Opere Civili	1.778.000.000	1.906.622.076
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.778.000.000	1.906.622.076
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	124.460.000	42.359.856
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	26.848.000	143.614.068
IVA al 10%	24.892.000	
IVA al 20%	177.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	354.000.000	185.973.924
TOTALE COSTO	2.132.000.000	2.092.596.000
	Economie	-39.404.000
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.290.000.000	1.250.596.000
Risorse proprie	842.000.000	842.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.132.000.000	2.092.596.000

Protocollo d'intervento: **3990****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO BASILICA S. MARCELLO CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO E RECUPERO AMBIENTALE*
Comune **STRADELLA (PV)**
Finanziamento **L. 398 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 390.535.400**
 - Tot. Pagato **L. 390.535.400**
Cofinanziamento **L. 96 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/02/99 30/01/99
Fine Lavori 15/10/99 30/12/99

*Basilica di S. Marcello***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI STRADELLA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00467720181
Indirizzo VIA MARCONI, 35 STRADELLA (PV)
Recapiti Telefono: 0385 249211 Telefax: 0385 43590

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	I.R.A.C. S.R.L. VIA XXV APRILE 13 - S. CIPRIANO PO (PV) 00309630184	L. 377.000.000	L. 370.214.000	1,80
Totali		L. 377.000.000	L. 370.214.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 06/08/98	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 20/11/98	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 27/01/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 09/02/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 01/06/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 05/08/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 13/09/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 16/11/99	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
Automatico	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 21/07/00	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 01/08/00	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 14/12/00	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	
DM 14/02/01	L. 494.000.000	L. 398.000.000	L. 0	L. 96.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/03/01)	
Opere Civili	300.000.000	448.625.857	
Opere Impiantistiche	50.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci	27.000.000		
TOTALE LAVORI	377.000.000		448.625.857
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	32.000.000	78.838.935	
Altre Spese Tecniche	34.000.000		
Allacciamenti		1.571.362	
Imprevisti	100.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		1.576.779	
IVA al 10%	37.700.000	44.862.586	
IVA al 20%	13.200.000	16.083.142	
SOMME A DISPOSIZIONE	117.000.000		142.932.804
TOTALE COSTO	494.000.000		591.558.661
	Maggiore Spesa		97.558.661
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	398.000.000		390.535.400
Risorse proprie	96.000.000		96.000.000
Altre fonti finanziarie			105.023.261
TOTALE COPERTURE	494.000.000		591.558.661

Protocollo d'intervento: **4117****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NELL' ATRIO DELLA STAZIONE DI MILANO CADORNA TERMINALE D'ARRIVO DEL SERVIZIO FERROVIARIO CON L'AEROPORTO INTERNAZIONALE DI MILANO MALPENSA*

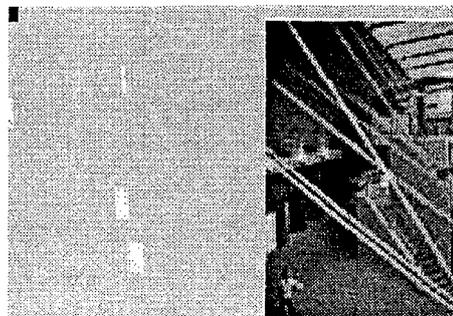
Comune **MILANO (MI)**

Finanziamento **L. 3.800 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.800.000.000**

- Tot. Pagato **L. 3.800.000.000**

Cofinanziamento **L. 17.276 milioni**

*Stazione di piazzale Cadorna***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **FERROVIE NORD MILANO S.P.A.**

Categoria **AE Società ad intero o prevalente capitale pubblico;**

C.Fis./P.IVA **00776140154**

Indirizzo **PIAZZALE CADORNA, 14** **MILANO (MI)**

Recapiti **Telefono: 02 721511** **Telefax: 02 72151400**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

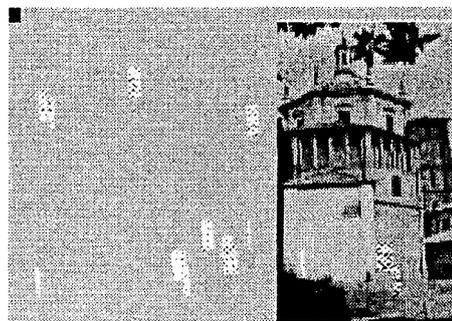
Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
pubblico incanto.	ITALCANTIERO S.P.A. Palazzo Galileo,2/b	L. 3.073.000.000	L. 3.038.000.000	1,14
INVITO	ITALCANTIERI SPA VIA SFORZA 7 MILANO3	L. 12.150.314.319	L. 11.015.119.596	9,34
Totali		L. 15.223.314.319	L. 14.053.119.596	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
Automatico	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 18.800.000.000	L. 3.800.000.000	L. 15.000.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 21.076.200.014	L. 3.800.000.000	L. 17.276.200.014	L. 0	+ Lit. 2276200014

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)
Opere Civili	7.795.000.000	16.927.898.888
Opere Impiantistiche	3.040.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	3.145.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	13.980.000.000	16.927.898.888
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	785.000.000	787.953.064
Altre Spese Tecniche	780.000.000	761.755.450
Allacciamenti	50.000.000	
Imprevisti	1.118.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		761.755.450
IVA al 10%	1.514.000.000	1.624.225.083
IVA al 20%	356.000.000	599.422.403
SOMME A DISPOSIZIONE	4.603.000.000	4.535.111.450
TOTALE COSTO	18.583.000.000	21.463.010.338
	Maggiore Spesa	2.880.010.338
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.800.000.000	3.800.000.000
Risorse proprie	15.000.000.000	17.276.200.014
Altre fonti finanziarie		386.810.324
TOTALE COPERTURE	18.800.000.000	21.463.010.338

Protocollo d'intervento: **4878****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISANAMENTO DELLE FACCIATE - PONTEGGI -*Comune **MILANO (MI)**Finanziamento **L. 664 milioni**- Tot. Impegnato **L. 664.000.000**- Tot. Pagato **L. 664.000.000**Cofinanziamento **L. 298 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **30/04/99 27/10/98**Fine Lavori **30/09/99 03/12/99***Parrocchia di S. Lorenzo Maggiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. LORENZO MAGGIORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **97049820158**Indirizzo **CORSO DI PORTA TICINESE, 39****MILANO (MI)**Recapiti **Telefono: 02 89404129****Telefax: 02 89404129****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	SMT srl Via Ripamonti,286 00752950154	L. 293.000.000	L. 293.000.000	0,00
	GASPAROLI SRL VIA TROMBINI, 3 GALLARATE (VA) 01865770125	L. 427.000.000	L. 402.900.000	5,64
Totali		L. 720.000.000	L. 695.900.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 06/08/98	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 20/11/98	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 27/01/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 09/02/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 01/06/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 05/08/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 13/09/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 16/11/99	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
Automatico	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 21/07/00	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 01/08/00	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 14/12/00	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	
DM 14/02/01	L. 962.000.000	L. 664.000.000	L. 0	L. 298.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/06/00)	
Opere Civili	664.000.000	292.700.000	
Opere Impiantistiche		371.300.000	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	664.000.000		664.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	84.000.000	93.865.308	
Altre Spese Tecniche	52.000.000	41.666.667	
Allacciamenti			
Imprevisti	62.000.000	36.083.300	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	73.000.000	40.738.330	
IVA al 20%	27.000.000	85.646.395	
SOMME A DISPOSIZIONE	298.000.000		298.000.000
TOTALE COSTO	962.000.000		962.000.000
			0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	664.000.000		664.000.000
Risorse proprie	298.000.000		298.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	962.000.000		962.000.000

Protocollo d'intervento: **4882**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO E AMPLIAMENTO DELLE CAPACITA' DI ACCOGLIENZA DI UNA ANTICA FORESTERIA MONASTICA*
 Comune **SAN GIULIANO MILANESE (MI)**
 Finanziamento **L. 1.520 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.492.207.606**
 - Tot. Pagato **L. 1.492.207.606**
 Cofinanziamento **L. 1.090 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *03/11/98* **09/11/98**
 Fine Lavori *23/09/99* **10/12/99**



*Monastero delle manache benedettine dei SS.
Pietro e Paolo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **MONASTERO BENEDETTINE SS. PIETRO E PAOLO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **01118990157**
 Indirizzo **VIA DELL'ABBAZIA, 6** **S. GIULIANO MILANESE (MI)**
 Recapiti **Telefono: 02 9841203** **Telefax: 02 98240943**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Ditta DA.MAS arredamenti Via Repubblica, 39 Seveso 00006930960	L. 0	L. 106.217.000	0,00
PRIVATA AD INVITO	MINOTTI IMPRESA COSTRUZIONI SRL VIALE ABRUZZI, 32 - Mi 12638730155	L. 1.840.210.935	L. 1.625.274.298	11,68
Totali		L. 1.840.210.935	L. 1.731.491.298	
