

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

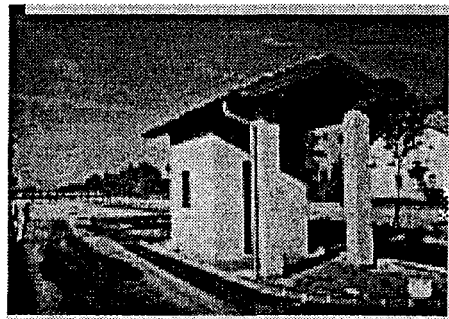
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.726.000.000	L. 1.636.000.000	L. 940.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.294.116.057	L. 1.204.116.057	L. 0	L. 1.090.000.000	Lit. -431883943
DM 01/06/99	L. 2.294.116.057	L. 1.204.116.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	+ Lit. 177600000
DM 13/09/99	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
Automatico	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.471.716.057	L. 1.381.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.609.716.057	L. 1.519.716.057	L. 0	L. 1.090.000.000	+ Lit. 138000000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/01)	
Opere Civili	1.744.000.000		
Opere Impiantistiche	98.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	107.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.949.000.000</b>		
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	157.000.000		
Altre Spese Tecniche	86.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	250.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	209.000.000		
IVA al 20%	72.000.000		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>774.000.000</b>		<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.723.000.000</b>		<b>2.582.207.606</b>
	Economiche		-140.792.394
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.204.117.000		1.492.207.606
Risorse proprie	1.090.000.000		1.090.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.294.117.000</b>		<b>2.582.207.606</b>

Protocollo d'intervento: **5593****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *NUOVA AREA DI SOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE DEL MONUMENTO*Comune **CERTOSA DI PAVIA (PV)**Finanziamento **L. 918 milioni**- Tot. Impegnato **L. 918.360.790**- Tot. Pagato **L. 918.360.790**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *22/06/99* **09/06/99**Fine Lavori *20/09/99* **30/10/99***Certosa di Pavia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00276520186**Indirizzo **VIA TOGLIATTI 2****CERTOSA DI PAVIA (PV)**Recapiti **Telefono: 0382 925501****Telefax: 0382 933128****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBB. INC.	FINALSTRADE SRL VIA SILLA, 1 FINALE LIGURE (SV) 00227230091	L. 773.841.376	L. 624.180.453	19,34
<b>Totali</b>		<b>L. 773.841.376</b>	<b>L. 624.180.453</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

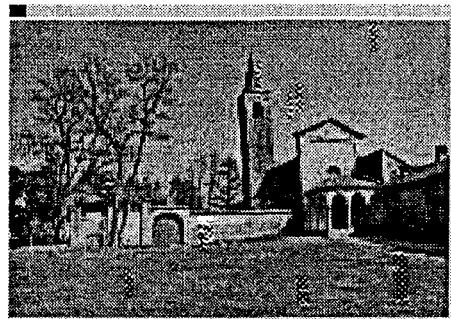
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.074.000.000	L. 1.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 918.360.790	L. 918.360.790	L. 0	L. 0	- Lit. -155639210

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (**/**/)**
Opere Civili	754.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>754.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	20.000.000	
Altre Spese Tecniche	29.700.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	24.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	159.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	77.800.000	
IVA al 20%	9.500.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>320.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.074.000.000</b>	<b>918.360.790</b>
	Economie	-155.639.210
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.074.000.000	918.360.790
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.074.000.000</b>	<b>918.360.790</b>

Protocollo d'intervento: **5759****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO ORATORIO DI SANT'ALBINO*Comune **MORTARA (PV)**Finanziamento **L. 684 milioni**- Tot. Impegnato **L. 436.098.878**- Tot. Pagato **L. 436.098.878**Cofinanziamento **L. 115 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *19/01/99* **27/11/98**Fine Lavori *19/08/99* **20/12/99***Oratorio di Sant'Albino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI MORTARA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00324770189/2**Indirizzo **PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 21****MORTARA (PV)**Recapiti Telefono: **0384 98106** Telefax: **0384 99993****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV.	IVCES SPA VIA MANARA NEORONE 40 VIGEVANO (PV)	L. 551.098.878	L. 523.488.823	5,01
Totali		L. 551.098.878	L. 523.488.823	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 06/08/98	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 20/11/98	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 27/01/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 09/02/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 01/06/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 05/08/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 13/09/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 16/11/99	L. 577.000.000	L. 462.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
Automatico	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	+ Lit. 248000000
DM 21/07/00	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 01/08/00	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 14/12/00	L. 825.000.000	L. 710.000.000	L. 0	L. 115.000.000	
DM 14/02/01	L. 799.098.878	L. 684.098.878	L. 0	L. 115.000.000	- Lit. -25901122

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/02/01)	
Opere Civili	415.000.000	467.340.837	
Opere Impiantistiche	18.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>433.000.000</b>	<b>467.340.837</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	35.000.000		
Altre Spese Tecniche		60.011.537	
Allacciamenti			
Imprevisti	13.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		46.734.084	
IVA al 20%	96.000.000		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>144.000.000</b>	<b>106.745.621</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>577.000.000</b>	<b>574.086.458</b>	
	Economie	-2.913.542	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	462.000.000	436.098.878	
Risorse proprie	115.000.000	115.000.000	
Altre fonti finanziarie		22.987.580	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>577.000.000</b>	<b>574.086.458</b>	

Protocollo d'intervento: **5949****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI</i>	
Comune	<b>SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)</b>	
Finanziamento	<b>L. 1.176 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 1.176.275.000</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 863.137.500</b>
Cofinanziamento	<b>L. 1.697 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>16/04/99</i>	<b>26/04/99</b>
Fine Lavori	<i>01/06/99</i>	<b>28/02/00</b>

*Abbazia di S. Egidio e locali annessi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>DIOCESI DI BERGAMO</b>	
Categoria	<b>AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>01072200163</b>	
Indirizzo	<b>PIAZZA DUOMO, 5</b>	<b>BERGAMO (BG)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 035 278111</b>	<b>Telefax: 035 278250</b>

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC. PRIV.	IMPR. ING. G. PANDINI SRL VIA C. MAFFEI, 16 (BG) 00227320165	L. 2.057.000.000	L. 1.761.500.000	14,37
<b>Totali</b>		<b>L. 2.057.000.000</b>	<b>L. 1.761.500.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.200.000.000	L. 1.503.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.906.000.000	L. 1.209.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	- Lit. -294000000
Automatico	L. 2.906.000.000	L. 1.209.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.906.000.000	L. 1.209.000.000	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.872.887.296	L. 1.175.887.296	L. 797.000.000	L. 900.000.000	- Lit. -33112704
DM 14/12/00	L. 2.872.887.296	L. 1.175.887.296	L. 797.000.000	L. 900.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.872.887.296	L. 1.175.887.296	L. 797.000.000	L. 900.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (23/03/00)	
Opere Civili	1.337.000.000	1.151.750.000	
Opere Impiantistiche	617.000.000	435.200.000	
Arredi e/o Attrezzature	103.000.000	87.550.000	
Altre Voci		87.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.057.000.000</b>		<b>1.761.500.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	121.000.000	121.000.000	
Altre Spese Tecniche	97.000.000	97.000.000	
Allacciamenti	25.000.000	25.000.000	
Imprevisti	80.000.000	87.800.000	
- Espropri o Acquisizioni	500.000.000	550.000.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	256.000.000	169.975.000	
IVA al 20%	64.000.000	61.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.143.000.000</b>		<b>1.111.775.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.200.000.000</b>		<b>2.873.275.000</b>
	Economie		-326.725.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.503.000.000		1.176.275.000
Risorse proprie	1.697.000.000		1.697.000.000
Altre fonti finanziarie			797.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.200.000.000</b>		<b>3.670.275.000</b>

Protocollo d'intervento: **5950****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DI EDIFICIO "CASA DELLA GIOVANE"*Comune **BERGAMO (BG)**Finanziamento **L. 2.584 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.537.844.240**- Tot. Pagato **L. 2.284.059.816**Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *06/11/98* *17/11/98*Fine Lavori *10/10/99* *26/11/99**Edificio "Casa della Giovane"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI BERGAMO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01072200163**Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 5****BERGAMO (BG)**Recapiti **Telefono: 035 278111****Telefax: 035 278250****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC. PRIV	EDILNORD SRL VIA LEONCAVALLO 25 PALAZZOLO BRESCIA	L. 3.206.000.000	L. 2.789.540.600	12,99
<b>Totali</b>		<b>L. 3.206.000.000</b>	<b>L. 2.789.540.600</b>	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

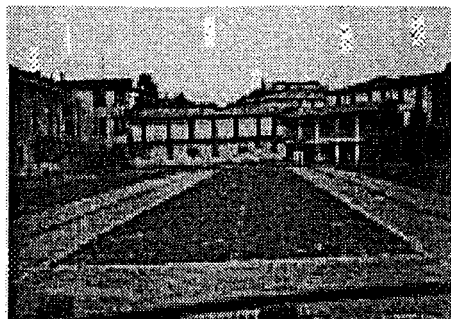
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit. -416459000
DM 05/08/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.583.541.000	L. 2.583.541.000	L. 0	L. 1.000.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (25/05/99)
Opere Civili	1.917.000.000	1.667.981.700
Opere Impiantistiche	931.000.000	810.063.100
Arredi e/o Attrezzature	358.000.000	311.495.800
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.206.000.000</b>	<b>2.789.540.600</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	135.000.000	135.000.000
Altre Spese Tecniche	100.000.000	100.000.000
Allacciamenti	30.000.000	30.000.000
Imprevisti	112.000.000	112.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	299.000.000	262.004.480
IVA al 20%	118.000.000	109.299.160
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>794.000.000</b>	<b>748.303.640</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.537.844.240</b>
	<b>Economie</b>	<b>-462.155.760</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	2.537.844.240
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.537.844.240</b>

Protocollo d'intervento: **5951****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DEL CENTRO PASTORALE PAOLO VI PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN CENTRO STORICO</i>	
Comune	<b>BRESCIA (BS)</b>	
Finanziamento	L. 150 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 149.975.304
	- Tot. Pagato	L. 149.975.300
Cofinanziamento	L. 150 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/05/98	06/04/98
Fine Lavori	30/09/98	30/09/98

*Centro pastorale Paolo VI***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	FOND.CENTRO PASTORALE PAOLO VI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00913270179	
Indirizzo	VIA GEZIO CALINI, 30	BRESCIA (BS)
Recapiti	Telefono: 030 3773511	Telefax: 030 48229

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	CENTRO POSE S.R.L. VIA ERCULIANI, 192 BRESCIA 01804830980	L. 0	L. 113.650.000	0,00
	DEL BONO S.P.A. VIA LIBERTA', 9 PASSIRANO (BS) 00487130171	L. 0	L. 28.220.000	0,00
	EDILTOSIO DI FERRARI E MARINI VIA CIRCONVALLAZIONE,15 BRESCIA 01713700985	L. 0	L. 66.530.000	0,00
	SEIT S.R.L. VIA CACCIAMALI, 20 BRESCIA 00269540175	L. 0	L. 7.600.000	0,00
	ZANARDINI GIUSEPPE VIA ARTIGIANI, 7 BRESCIA 01999430174	L. 0	L. 4.000.000	0,00
	<b>Totali</b>	<b>L. 0</b>	<b>L. 220.000.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 150.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 299.975.304	L. 149.975.304	L. 0	L. 150.000.000	- Lit. -24696

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/09/99)
Opere Civili	220.000.000	217.979.440
Opere Impiantistiche		11.599.980
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>220.000.000</b>	<b>229.579.420</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	20.000.000	20.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	50.000.000	50.395.884
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>80.000.000</b>	<b>70.395.884</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>300.000.000</b>	<b>299.975.304</b>
	Economie	-24.696
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	150.000.000	149.975.304
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>300.000.000</b>	<b>299.975.304</b>

Protocollo d'intervento: **5954****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE DELLA CHIESA  
CATTEDRALE*Comune **BRESCIA (BS)**Finanziamento **L. 425 milioni**- Tot. Impegnato **L. 425.000.000**- Tot. Pagato **L. 425.000.000**Cofinanziamento **L. 2.170 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *23/01/98* **23/01/98**Fine Lavori *30/03/99* **15/06/99***Cattedrale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CATTEDRALE DI BRESCIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80019450172**Indirizzo **VIA MAZZINI, 2****BRESCIA (BS)**Recapiti **Telefono: 030 3757037****Telefax:**

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.200.000.000	L. 700.000.000	L. 450.000.000	L. 1.050.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.992.080.000	L. 492.080.000	L. 0	L. 1.500.000.000	- Lit. -207920000
DM 01/06/99	L. 1.992.080.000	L. 492.080.000	L. 0	L. 1.500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	+ Lit. 602920000
DM 13/09/99	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
Automatico	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.595.000.000	L. 425.000.000	L. 0	L. 2.170.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

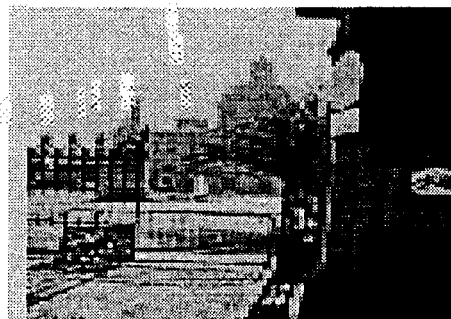
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/03/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	1.892.000.000	2.252.158.995
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.892.000.000</b>	<b>2.252.158.995</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	70.000.000	94.145.134
Altre Spese Tecniche	25.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	5.000.000	4.602.021
IVA al 10%	190.000.000	225.215.900
IVA al 20%	18.000.000	19.749.731
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>308.000.000</b>	<b>343.712.786</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>2.595.871.781</b>
	Maggiore Spesa	395.871.781
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	425.000.000
Risorse proprie	1.500.000.000	2.170.000.000
Altre fonti finanziarie		871.481
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>2.595.871.481</b>

Protocollo d'intervento: **6092**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE VIALE DEL SANTUARIO*Comune **CARAVAGGIO (BG)**Finanziamento **L. 2.075 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.074.875.850**- Tot. Pagato **L. 1.867.388.265**Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/10/98* **12/10/98**Fine Lavori *20/09/99* **26/10/99***Santuario*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CARAVAGGIO**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00272830167**Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 9****CARAVAGGIO (BG)**Recapiti **Telefono: 0363 3561****Telefax: 0363 350164**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	F.LLI PACCANI SNC VIA VALZELLA, 8 00211270160	L. 0	L. 2.164.523.500	0,00
Totali		L. 0	L. 2.164.523.500	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

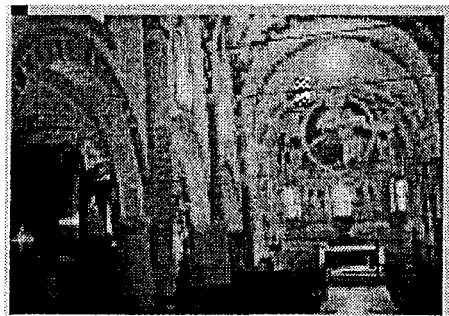
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	Lit. -425000000
DM 13/09/99	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.075.000.000	L. 2.075.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (18/11/99)
Opere Civili	1.567.000.000	1.561.480.380
Opere Impiantistiche	843.000.000	180.414.179
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci	493.000.000	422.628.941
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.963.000.000</b>	<b>2.164.523.500</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	157.000.000
Altre Spese Tecniche	104.000.000	69.000.000
Allacciamenti	32.000.000	20.000.000
Imprevisti	53.000.000	18.300.000
- Espropri o Acquisizioni		300.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	17.000.000	20.400.000
IVA al 10%	290.000.000	216.452.350
IVA al 20%	12.000.000	109.200.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>537.000.000</b>	<b>910.352.350</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.074.875.850</b>
	<b>Economie</b>	<b>-425.124.150</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.074.875.850
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>3.074.875.850</b>

Protocollo d'intervento: **6153****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO*Comune **LODI VECCHIO (LO)**Finanziamento **L. 80 milioni**- Tot. Impegnato **L. 80.000.000**- Tot. Pagato **L. 72.000.000**Cofinanziamento **L. 40 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/06/98* **30/09/98**Fine Lavori *30/06/98* **15/06/99***Basilica di S. Bassiano o dei XII Apostoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **BASILICA DEI XII APOSTOLI**Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**C.Fis./P.IVA **92503180157**Indirizzo **CASCINA S. BASSIANO****LODI VECCHIO (LO)**Recapiti **Telefono: 0371 752900****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATT. PRIV.	GIAVAZZI GIOVANNI VIA CAVOUR, 43 - LODI - 01572800157	L. 78.000.000	L. 78.000.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 78.000.000</b>	<b>L. 78.000.000</b>	
