

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 06/08/98	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 20/11/98	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 27/01/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 09/02/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/06/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 05/08/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 13/09/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 16/11/99	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
Automatico	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 21/07/00	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 01/08/00	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/12/00	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	
DM 14/02/01	L. 120.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 40.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (02/12/99)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	80.000.000	80.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>80.000.000</b>	<b>80.000.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	8.000.000	8.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	12.000.000	12.000.000
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	20.000.000	20.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>40.000.000</b>	<b>40.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>
		0
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	80.000.000	80.000.000
Risorse proprie	40.000.000	40.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>120.000.000</b>	<b>120.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **6156****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CATTEDRALE DI S. PIETRO IN MANTOVA PROGETTO PER IL RECUPERO DELL'IMMAGINE STORICA E LA CORRETTA ACCOGLIENZA LA NAVATA CENTRALE LA CUPOLA L'ABSIDE ED I TRANSETTI*

Comune **MANTOVA (MN)**

Finanziamento **L. 1.824 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.782.482.742**

- Tot. Pagato **L. 1.782.482.742**

Cofinanziamento **L. 210 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	22/10/99	07/05/99
Fine Lavori	25/10/99	15/12/99

*Cattedrale di S. Pietro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **P.ZZA CANONICA 11** **MANTOVA (MN)**

Recapiti **Telefono: 0376 320220** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA DI APPALTO	MEGA LIGHTING BRUZZAGO GASTONE	L. 253.000.000	L. 209.990.000	17,00
	R.W.S. SRL VIA NIEDDA 4 VIGONZA (PD)	L. 1.262.000.000	L. 1.253.948.000	0,64
<b>Totali</b>		<b>L. 1.515.000.000</b>	<b>L. 1.463.938.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 2.100.000.000	L. 1.890.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.100.000.000	L. 1.890.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.100.000.000	L. 1.890.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	Lit. -66000000
Automatico	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.034.000.000	L. 1.824.000.000	L. 0	L. 210.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/02/01)
Opere Civili	1.312.000.000	1.287.404.122
Opere Impiantistiche	253.000.000	225.176.500
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.565.000.000</b>	<b>1.512.580.622</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	97.000.000	97.259.179
Altre Spese Tecniche	162.000.000	177.646.870
Allacciamenti		
Imprevisti	67.700.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	156.500.000	151.222.062
IVA al 20%	51.800.000	53.774.009
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>535.000.000</b>	<b>479.902.120</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1.992.482.742</b>
	<b>Economie</b>	<b>-107.517.258</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.890.000.000	1.782.482.742
Risorse proprie	210.000.000	210.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>1.992.482.742</b>

Protocollo d'intervento: **6159**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CONSERVAZIONE RESTAURO E ADEGUAMENTO AD USO LITURGICO CULTURALE DELLA CHIESA DI S. LUCA A PAVIA*  
 Comune **PAVIA (PV)**  
 Finanziamento **L. 1.248 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 1.240.991.753**  
     - Tot. Pagato **L. 1.116.892.576**  
 Cofinanziamento **L. 885 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori *11/06/97*                      *11/06/97*  
 Fine Lavori *31/10/99*



Chiesa di S. Luca

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA S. PRIMO E FELICIANO**  
 Categoria **AC** Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);  
 C.Fis./P.IVA **96009730183**  
 Indirizzo **PIAZZA S. PRIMO, 1** **PAVIA (PV)**  
 Recapiti **Telefono: 0382 26677** **Telefax:**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	IMMOBILIARE MOTTINO SRL  P.ZZA CASTELLO, 28 PAVIA 00185250180	L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	0,00
Totali		L. 1.540.000.000	L. 1.540.000.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
Automatico	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.133.000.000	L. 1.248.000.000	L. 300.000.000	L. 585.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (23/02/00)
Opere Civili	679.000.000	631.130.662
Opere Impiantistiche	112.000.000	112.357.405
Arredi e/o Attrezzature	141.000.000	140.548.000
Altre Voci	656.000.000	655.963.933
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.588.000.000</b>	<b>1.540.000.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	129.000.000	128.246.000
Altre Spese Tecniche	36.000.000	36.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	111.000.000	79.396.217
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	79.000.000	111.154.704
IVA al 10%	145.000.000	147.764.551
IVA al 20%	45.000.000	83.430.281
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>545.000.000</b>	<b>585.991.753</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.133.000.000</b>	<b>2.125.991.753</b>
	<b>Economie</b>	<b>-7.008.247</b>
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.248.000.000	1.240.991.753
Risorse proprie	585.000.000	585.000.000
Altre fonti finanziarie	300.000.000	300.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.133.000.000</b>	<b>2.125.991.753</b>

Protocollo d'intervento: **2107/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ORATORIO PARROCCHIALE DI VIA PARETO*Comune **MILANO (MI)**Finanziamento **L. 1.974 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.973.761.232**- Tot. Pagato **L. 1.972.296.904**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/11/98* **19/11/98**Fine Lavori *10/10/99* **10/10/99***Oratorio parrocchiale di via Pareto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA IN CERTOSA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80083390155**Indirizzo **VIA GAREGNANO, 28****MILANO (MI)**Recapiti **Telefono: 02 38006301****Telefax: 02 38006301****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	EDILTRE SRL VIA CAIROLI,10 GIUSSANO MI 02035010962	L. 1.753.326.000	L. 1.503.126.372	14,27
Totali		L. 1.753.326.000	L. 1.503.126.372	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.252.000.000	L. 2.252.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.252.000.000	L. 2.252.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -278000000
DM 13/09/99	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.974.000.000	L. 1.974.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.973.761.232	L. 1.973.761.232	L. 0	L. 0	- Lit. -238768

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (**/**/**)
Opere Civili	2.252.000.000	766.658.732
Opere Impiantistiche		622.790.947
Arredi e/o Attrezzature		189.888.823
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.252.000.000</b>	<b>1.579.338.502</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		124.109.071
Altre Spese Tecniche		50.523.914
Allacciamenti		5.887.356
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		139.533.703
IVA al 20%		72.904.360
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>0</b>	<b>392.958.404</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.252.000.000</b>	<b>1.972.296.906</b>
	Economie	-279.703.094
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.252.000.000	1.972.296.906
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.252.000.000</b>	<b>1.972.296.906</b>

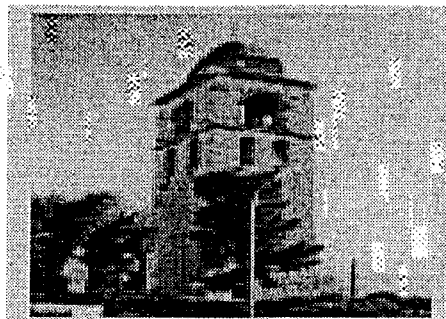
PAGINA BIANCA



MARCHE

Protocollo d'intervento: **1172****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *LAVORI DI RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI SAN CIRIACO*Comune **ANCONA (AN)**Finanziamento **L. 977 milioni**- Tot. Impegnato **L. 977.220.289**- Tot. Pagato **L. 977.220.289**Cofinanziamento **L. 900 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/06/99** **30/05/99**Fine Lavori **03/08/99***Cattedrale di S. Ciriaco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI ANCONA OSIMO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80006130423**Indirizzo **PIAZZA SENATO, 7****ANCONA (AN)**Recapiti **Telefono: 071 2074703** **Telefax: 071 206041****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	Lares srl v. santa croce 521 Venezia 00163960271	L. 238.844.400	L. 203.352.122	14,86
TRATTATIVA PRIVATA	Impresa Gianfranco Piccinini via Gherarducci 1, RECANATI	L. 318.181.273	L. 313.090.370	1,60
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. Decorart snc - Alfa Impianti snc VIA G. PIATTI, 20 S.AMBROGIO (VE)	L. 874.887.000	L. 861.763.695	1,50
<b>Totali</b>		<b>L. 1.431.912.673</b>	<b>L. 1.378.206.187</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.900.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
Automatico	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	- Lit. -20000000
DM 21/07/00	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.880.000.000	L. 980.000.000	L. 0	L. 900.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.877.220.289	L. 977.220.289	L. 0	L. 900.000.000	- Lit. -2779711

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/07/00)	
Opere Civili	536.364.200	1.000.519.100	
Opere Impiantistiche	303.504.910	342.708.774	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>839.869.110</b>	<b>1.343.227.874</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	45.000.000	146.946.511	
Altre Spese Tecniche	46.786.649	186.111.511	
Allacciamenti			
Imprevisti	60.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	89.986.911	134.322.788	
IVA al 20%	18.357.330	66.611.605	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>260.130.890</b>	<b>533.992.415</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.877.220.289</b>	
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>777.220.289</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	1.000.000.000	
Risorse proprie	900.000.000	900.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>1.900.000.000</b>	

Protocollo d'intervento: **6376****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F.*Comune **LORETO (AN)**Finanziamento **L. 3.676 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.349.409.574**- Tot. Pagato **L. 3.914.468.617**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *09/08/99* **22/03/99**Fine Lavori *24/10/99**Edificio ex F.A.F.***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LORETO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00319830428**Indirizzo **CORSO BOCCALINI****LORETO (AN)**Recapiti **Telefono: 071 750561****Telefax: 071 7500150****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	A.S.P.A. s.a.s. via S.Marciano 9, L'Aquila 00171020662	L. 87.500.000	L. 74.742.500	14,58
LICITAZIONE PRIVATA	MI.SE. srl via Marconi 31, Falconara (AN) 00120030424	L. 367.800.000	L. 310.791.000	15,50
LICITAZIONE PRIVATA	Impresa Germano Belli srl via feltrino 6, Chieti 00342500691	L. 3.707.228.987	L. 3.098.131.264	16,43
Totali		L. 4.162.528.987	L. 3.483.664.764	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

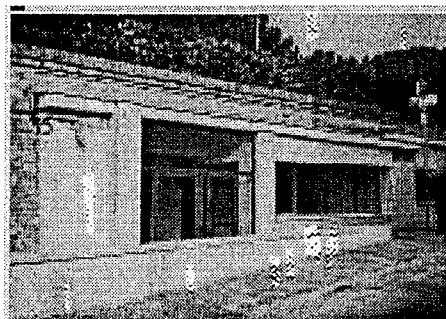
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.074.000.000	L. 5.074.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.350.000.000	L. 4.350.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -724000000
Automatico	L. 4.350.000.000	L. 4.350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.350.000.000	L. 4.350.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.676.440.662	L. 3.676.440.662	L. 0	L. 0	- Lit. -673559338
DM 14/12/00	L. 3.676.440.662	L. 3.676.440.662	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.676.440.662	L. 3.676.440.662	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (25/01/00)	
Opere Civili	2.500.000.000	3.098.131.264	
Opere Impiantistiche	670.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	800.000.000	310.791.000	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.970.000.000</b>		<b>3.408.922.264</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	175.000.000	313.495.555	
Altre Spese Tecniche	35.000.000	28.500.000	
Allacciamenti	60.000.000	30.000.000	
Imprevisti		127.521.317	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili		6.500.000	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%		309.813.127	
IVA al 20%	834.000.000	124.657.311	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.104.000.000</b>		<b>940.487.310</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.074.000.000</b>		<b>4.349.409.574</b>
		Economie	-724.590.426
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		5.074.000.000	4.349.409.574
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.074.000.000</b>		<b>4.349.409.574</b>

Protocollo d'intervento: **6390****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI UBICATI IN VIA SOLARI CENTRO STORICO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELLE ZONE DI SOSTA E RISTORO ED ALTRE ALLEGATO PIANO GENERALE PER L'ACCOGLIENZA</i>	
Comune	LORETO (AN)	
Finanziamento	L. 340 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 339.415.410
	- Tot. Pagato	L. 339.415.410
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	06/04/99	18/01/99
Fine Lavori	20/05/99	30/08/99

*Piano generale per l'accoglienza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI LORETO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00319830428	
Indirizzo	CORSO BOCCALINI	LORETO (AN)
Recapiti	Telefono: 071 750561	Telefax: 071 7500150

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Agostinelli Aldo v. bramante 82a Castelfidardo AN 00171020662	L. 20.000.000	L. 20.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	A.S.P.A. Bazzano v. S. marciano Bazzano (AQ) 00171020662	L. 87.500.000	L. 74.742.500	14,58
TRATTATIVA PRIVATA	Costruzioni Frapiccini v. addolorata Recanati (MC) 00657780433	L. 197.360.948	L. 179.819.507	8,89
Totali		L. 304.860.948	L. 274.562.007	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 375.000.000	L. 375.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -35000000
Automatico	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 340.000.000	L. 340.000.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/03/01)	
Opere Civili	110.000.000	120.100.000	
Opere Impiantistiche	70.000.000	59.800.000	
Arredi e/o Attrezzature	5.000.000		
Altre Voci	87.500.000	74.750.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>272.500.000</b>		<b>254.650.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	11.000.000	22.130.000	
Altre Spese Tecniche	2.000.000		
Allacciamenti	5.000.000	2.000.000	
Imprevisti	7.800.000	7.800.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	20.000.000	20.000.000	
IVA al 10%	18.000.000	17.990.000	
IVA al 20%	38.700.000	14.950.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>102.500.000</b>		<b>84.870.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>375.000.000</b>		<b>339.520.000</b>
	<b>Economie</b>		<b>-35.480.000</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	375.000.000		339.415.410
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>375.000.000</b>		<b>339.415.410</b>

Protocollo d'intervento: **6404**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ARREDO SALA DI ATTESA*  
 Comune **ANCONA (AN)**  
 Finanziamento **L. 38 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 37.795.001**  
     - Tot. Pagato **L. 37.795.001**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**  
     Previsione **Effettiva**  
 Inizio Lavori **20/09/99 01/12/99**  
 Fine Lavori **20/10/99**

*Porto*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**  
 Categoria **AB Enti pubblici**  
 C.Fis./P.IVA **00093910420**  
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA ANCONA (AN)**  
 Recapiti **Telefono: 071 207891 Telefax: 071 2078940**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	PAOLO POLITI S.P.A. C.so Mazzini, 32 ANCONA	L. 41.666.667	L. 21.666.667	48,00
Totali		L. 41.666.667	L. 21.666.667	
