

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.120.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.120.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.120.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	+ Lit. 90000000
DM 09/02/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.210.000.000	L. 870.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
Automatico	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	- Lit. -70000000
DM 21/07/00	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.140.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 340.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.259.068.280	L. 799.803.000	L. 0	L. 459.265.280	+ Lit. 119068280

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/02/00)
Opere Civili	861.000.000	1.026.540.364
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	861.000.000	1.026.540.364
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	50.000.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	101.836.800
Allacciamenti	5.000.000	5.943.000
Imprevisti	72.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		124.748.116
IVA al 10%	93.000.000	
IVA al 20%	19.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	259.000.000	232.527.916
TOTALE COSTO	1.120.000.000	1.259.068.280
	Maggiore Spesa	139.068.280
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	870.000.000	799.803.000
Risorse proprie	250.000.000	459.265.280
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.120.000.000	1.259.068.280

Protocollo d'intervento: **6481****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **COMPLETAMENTO DEL RECUPERO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA IN LAPIDE E REALIZZAZIONE DI PICCOLO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI**

Comune **MONTEGALLO (AP)**

Finanziamento **L. 877 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 876.645.810**

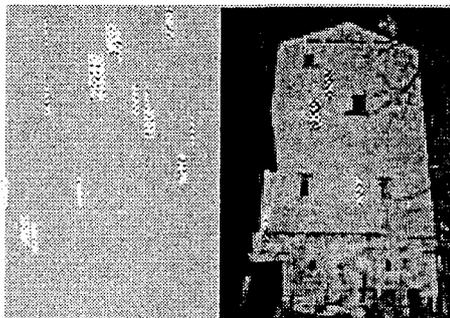
- Tot. Pagato **L. 876.645.810**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/10/98 18/11/98**

Fine Lavori **30/08/99**

*Chiesa di S. Maria in Lapide***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. MARIA IN LAPIDE**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **92002970447**

Indirizzo **PIAZZA ARRINGO, 10/C** **ASCOLI PICENO (AP)**

Recapiti **Telefono: 0736 259901** **Telefax: 0736 259901**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	Amici Enrico & C. snc c.so Mazzini 167, S. Benedetto del Tronto (AP) 01436160442	L. 0	L. 26.058.600	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	Costruzioni F.lli Rinaldi srl v. puglia 21 Ascoli Piceno 00392410445	L. 650.000.000	L. 623.350.000	4,10
Totali		L. 650.000.000	L. 649.408.600	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	- Lit. -26600000
DM 05/08/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 812.400.000	L. 812.400.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 876.645.810	L. 876.645.810	L. 0	L. 0	+ Lit. 64245810

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/06/01)
Opere Civili	500.000.000	719.918.040
Opere Impiantistiche	150.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	670.000.000	719.918.040
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	44.000.000	
Altre Spese Tecniche	5.000.000	67.320.000
Allacciamenti	2.000.000	2.000.000
Imprevisti	35.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		26.058.600
IVA al 10%	73.000.000	
IVA al 20%	10.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	169.000.000	95.378.600
TOTALE COSTO	839.000.000	815.296.640
	Economie	-23.703.360
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	839.000.000	812.350.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		2.946.640
TOTALE COPERTURE	839.000.000	815.296.640

Protocollo d'intervento: **6488****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'ABBAZIA DI SAN BENEDETTO IN CASTELPLANIO PER LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*

Comune **CASTELPLANIO (AN)**

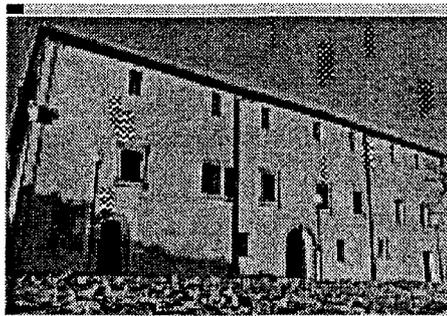
Finanziamento **L. 2.103 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.103.005.269**

- Tot. Pagato **L. 2.103.005.269**

Cofinanziamento **L. 376 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/09/98	25/05/98
Fine Lavori	20/09/99	24/02/00

*Abbazia di S. Benedetto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI JESI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **91004700422**

Indirizzo **PIAZZA FEDERICO II°, 6** **JESI (AN)**

Recapiti **Telefono: 0731 56813** **Telefax: 0731 56813**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Imp. edile Arturo Serrani srl v. roma Montemarciano (AN) 01038470421	L. 1.773.475.381	L. 1.650.196.510	6,95
Totale		L. 1.773.475.381	L. 1.650.196.510	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.500.000.000	L. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.125.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	Lit. -157000000
DM 01/06/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.343.000.000	L. 1.968.000.000	L. 0	L. 375.000.000	
Automatico	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	+ Lit. 136008968
DM 21/07/00	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	
DM 01/08/00	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	
DM 14/12/00	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	
DM 14/02/01	L. 2.479.008.968	L. 2.103.005.269	L. 0	L. 376.003.699	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/05/00)
Opere Civili	1.421.000.000	1.868.738.753
Opere Impiantistiche	389.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.960.000.000	1.868.738.753
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	184.350.000	
Altre Spese Tecniche	17.750.000	199.600.000
Allacciamenti	8.000.000	4.712.100
Imprevisti	73.690.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	102.000	
- Opere Civili	3.200.000	
- Opere Impiantistiche	690.000	
- Arredi e/o attrezzature		145.406.812
- Altre voci		44.710.400
IVA al 10%	181.000.000	186.873.875
IVA al 20%	71.220.000	29.081.362
SOMME A DISPOSIZIONE	540.002.000	610.384.549
TOTALE COSTO	2.500.002.000	2.479.123.302
	Economie	-20.878.698
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.125.000.000	2.103.005.269
Risorse proprie	375.000.000	376.118.033
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.479.123.302

Protocollo d'intervento: **6498****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO E RIUSO DELLA ABAZIA DI S. BIAGIO IN CAPRILE (25 P.L.)*Comune **FABRIANO (AN)**Finanziamento **L. 1.164 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.627.142.392**- Tot. Pagato **L. 1.627.142.392**Cofinanziamento **L. 550 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *25/09/98* **02/10/98**Fine Lavori *25/09/99* **10/12/99***Abbazia di S. Biagio in Caprile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI FABRIANO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00155670425**Indirizzo **VIA DANTE 270****FABRIANO (AN)**Recapiti **Telefono: 0732 7091****Telefax: 0732 24442****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Arredamenti Camilletti via Crocifisso 41/a, Sassoferrato (AN)	L. 131.493.000	L. 98.619.750	25,00
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. MONTESI E PRINCIPI v. corvi 12 Senigallia (AN) 00080160427	L. 1.354.967.040	L. 1.320.985.548	2,51
Totali		L. 1.486.460.040	L. 1.419.605.298	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.751.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 1.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.751.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 1.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	+ Lit. 549000000
DM 27/01/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
Automatico	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.300.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.713.538.950	L. 1.163.538.950	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -586461050

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/10/00)	
Opere Civili	800.000.000	1.723.354.363	
Opere Impiantistiche	290.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.260.000.000		1.723.354.363
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	148.000.000	224.630.843	
Altre Spese Tecniche	41.000.000		
Allacciamenti	17.000.000		
Imprevisti	78.000.000	6.504.443	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	2.000.000		
- Opere Impiantistiche	1.000.000		
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	80.000.000	172.335.436	
IVA al 20%	124.000.000	50.317.307	
SOMME A DISPOSIZIONE	491.000.000		453.788.029
TOTALE COSTO	1.751.000.000		2.177.142.392
	Maggiore Spesa		426.142.392
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.750.000.000		1.627.142.392
Risorse proprie	1.000.000		550.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.751.000.000		2.177.142.392

Protocollo d'intervento: **6526****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO*Comune **FABRIANO (AN)**Finanziamento **L. 3.833 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.832.589.371**- Tot. Pagato **L. 3.832.589.371**Cofinanziamento **L. 4.262 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *18/08/98* **14/08/98**Fine Lavori *20/08/99* **15/12/99***Ex collegio Gentile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **02563520580**Indirizzo **VIA CAVALIERI S. SEPOLCRO, 1****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 68802655 Telefax: 06 68300098****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Electrolux Zanussii spa, agenzia di Manzoni Gianni via del consorzio 33, Falconara (AN) 00072220932	L. 58.500.000	L. 58.500.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	società TECNOIMPIANTI srl fraz. Marischio, Fabriano (AN) 00408240422	L. 138.721.000	L. 138.721.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	C.I.F.A. snc zona ind.le Piediripa (MC) 00090640434	L. 443.000.000	L. 443.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I.TORELLI DOTTORI - ANDANTI S.P.A. CONTRADA PONTEMAGNO, 42 CUPRAMONTANA (AN)	L. 6.148.114.471	L. 5.774.366.915	6,08
Totali		L. 6.788.335.471	L. 6.414.587.915	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 01/06/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 05/08/99	L. 8.262.000.000	L. 4.000.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 13/09/99	L. 7.892.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 4.262.000.000	- Lit. -370000000
DM 16/11/99	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	+ Lit. 241785765
Automatico	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 21/07/00	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 01/08/00	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.133.785.765	L. 3.871.785.765	L. 0	L. 4.262.000.000	
DM 14/02/01	L. 8.094.589.371	L. 3.832.589.371	L. 0	L. 4.262.000.000	- Lit. -39196394

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/11/01)	
Opere Civili	5.445.000.000	5.994.157.643	
Opere Impiantistiche	842.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	6.787.000.000	5.994.157.643	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	615.000.000	580.349.884	
Altre Spese Tecniche		152.593.000	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	5.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		575.998.430	
IVA al 10%	628.000.000	599.415.765	
IVA al 20%	227.000.000	231.269.621	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.475.000.000	2.139.626.700	
TOTALE COSTO	8.262.000.000	8.133.784.343	
	Economie	-128.215.657	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	4.000.000.000	3.832.589.371	
Risorse proprie	4.262.000.000	4.262.000.000	
Altre fonti finanziarie		39.194.972	
TOTALE COPERTURE	8.262.000.000	8.133.784.343	

Protocollo d'intervento: **6528**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA ED OSTELLO RISTRUTTURAZIONE PALAZZO FIUMI SERMATTEI*

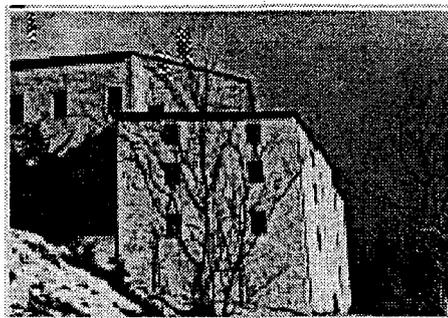
Comune **GENGA (AN)**

Finanziamento **L. 1.783 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.732.301.391**

- Tot. Pagato **L. 1.732.301.394**

Cofinanziamento **L. 100 milioni**

*Palazzo Fiumi Sermattei*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI GENGA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00196710420**

Indirizzo **VIA ROMA, 4** **GENGA (AN)**

Recapiti **Telefono: 0732 973014** **Telefax: 0732 973344**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Electrolux Professional spa, agenzia G. Manzoni via del Consorzio 33, Falconara (AN) 00072220932	L. 27.006.000	L. 14.625.000	45,85
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA DI PREZZI	I.M. srl s.s. 360 km. 23, Serra de' Conti (AN) 00190580423	L. 90.240.000	L. 89.360.000	0,98
TRATTATIVA PRIVATA	Ditta Metalco srl Apecchio, loc. pian molino, PS 00948460415	L. 1.407.500.000	L. 1.298.137.250	7,77
Totali		L. 1.524.746.000	L. 1.402.122.250	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -117419025
DM 01/06/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.882.580.975	L. 1.782.580.975	L. 0	L. 100.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/03/01)	
Opere Civili	900.000.000	1.296.129.600	
Opere Impiantistiche	500.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.550.000.000		1.296.129.600
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	200.000.000	200.000.000	
Altre Spese Tecniche	15.000.000	29.745.372	
Allacciamenti			
Imprevisti	23.300.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		103.985.000	
- Altre voci		6.689.038	
IVA al 10%	141.700.000		
IVA al 20%	70.000.000	195.752.381	
SOMME A DISPOSIZIONE	450.000.000		536.171.791
TOTALE COSTO	2.000.000.000		1.832.301.391
		Economie	-167.698.609
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.900.000.000		1.732.301.391
Risorse proprie	100.000.000		100.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000		1.832.301.391

Protocollo d'intervento: **6537****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ACCOGLIENZA POVERA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO NELL'EDIFICIO DISMESSO DELL'EX SEMINARIO VESCOVILE*

Comune **PESARO (PS)**

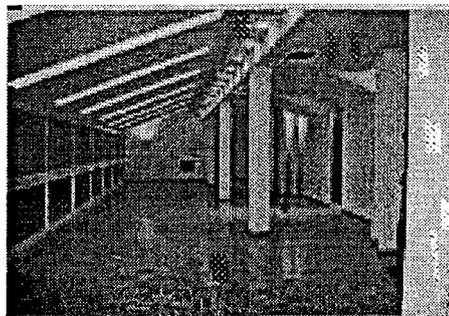
Finanziamento **L. 4.696 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 5.117.936.249**

- Tot. Pagato **L. 4.690.936.416**

Cofinanziamento **L. 300 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/08/98	03/08/98
Fine Lavori	01/10/99	01/10/99

*Ex seminario vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SEMINARIO VESCOVILE**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **80001430414**

Indirizzo **VIA AVOGADRO, 40** **PESARO (PS)**

Recapiti **Telefono: 0721.53756** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	consorzio ravennate coop. v. teodorico 15 RAVENNA 00080170392	L. 3.999.500.000	L. 3.398.615.120	15,02
Totale		L. 3.999.500.000	L. 3.398.615.120	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.070.000.000	L. 4.870.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.388.024.000	L. 4.188.024.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -681976000
DM 05/08/99	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 81000000
DM 13/09/99	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.469.024.000	L. 4.269.024.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.996.023.832	L. 4.696.023.832	L. 0	L. 300.000.000	+ Lit. 526999832

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/07/01)
Opere Civili	2.000.000.000	
Opere Impiantistiche	2.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.000.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	240.000.000	
Altre Spese Tecniche	80.000.000	
Allacciamenti	30.000.000	
Imprevisti	200.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	30.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	426.000.000	
IVA al 20%	64.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.070.000.000	0
TOTALE COSTO	5.070.000.000	5.005.858.334
	Economie	-64.141.666
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.870.000.000	4.690.936.415
Risorse proprie	200.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		14.921.919
TOTALE COPERTURE	5.070.000.000	5.005.858.334

Protocollo d'intervento: **6538****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE AI FINI CENTRO DI SOSTE RISTORO INFORMAZIONE DI UN'ALA DELL'EX CONVENTO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI*

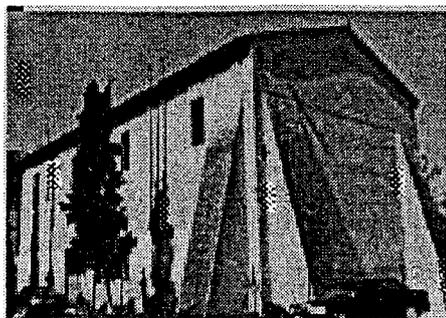
Comune **PESARO (PS)**

Finanziamento **L. 4.325 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.915.900.815**

- Tot. Pagato **L. 3.524.310.733**

Cofinanziamento **L. 1.115 milioni**

*Ex convento della Chiesa di S. Giovanni***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PESARO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00272430414**

Indirizzo **P.ZZA DEL POPOLO PESARO (PS)**

Recapiti **Telefono: 0721 3871 Telefax: 0721 31846**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CONSORZIO RAVENNATE VIA TEODORICO, 15 RAVENNA	L. 78.100.000	L. 71.000.000	9,09
ASTA PUBBLICA	cons. emiliano-romagnolo BO VIA CALZONI 1/3 BOLOGNA 00416500379	L. 3.692.664.550	L. 3.212.618.158	13,00
Totali		L. 3.770.764.550	L. 3.283.618.158	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

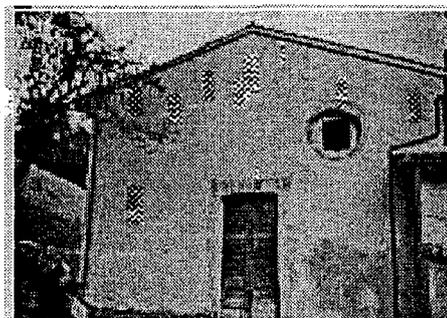
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.600.000.000	L. 4.485.000.000	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.071.948.969	L. 3.956.948.969	L. 0	L. 1.115.000.000	- Lit. -528051031
DM 01/06/99	L. 5.071.948.969	L. 3.956.948.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	+ Lit. 368500000
DM 13/09/99	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
Automatico	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.440.448.969	L. 4.325.448.969	L. 0	L. 1.115.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (01/06/99)
Opere Civili	3.142.000.000	3.303.434.911
Opere Impiantistiche	725.000.000	537.527.600
Arredi e/o Attrezzature	250.000.000	213.793.205
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.117.000.000	4.054.755.716
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	340.000.000	283.145.397
Altre Spese Tecniche	335.000.000	311.774.736
Allacciamenti	29.000.000	25.500.000
Imprevisti	183.200.000	29.226.053
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		165.871.571
IVA al 10%	405.000.000	402.933.859
IVA al 20%	190.800.000	167.242.668
SOMME A DISPOSIZIONE	1.483.000.000	1.385.694.284
TOTALE COSTO	5.600.000.000	5.440.450.000
	Economie	-159.550.000
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.485.000.000	4.325.448.969
Risorse proprie	1.115.000.000	1.115.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.600.000.000	5.440.448.969

Protocollo d'intervento: **6565****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA CIMITERIALE DI AGOLLA*Comune **SEFRO (MC)**Finanziamento **L. 476 milioni**- Tot. Impegnato **L. 443.071.139**- Tot. Pagato **L. 443.071.139**Cofinanziamento **L. 15 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **25/08/98 25/08/98**Fine Lavori **21/06/99 08/01/99***Chiesa cimiteriale di Agolla***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI SEFRO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00210940433**Indirizzo **PIAZZA BELLANTI, 1****SEFRO (MC)**Recapiti **Telefono: 0737 45360****Telefax: 0737 45118****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO DIRETTO	EDIL FRONTIGNANO srl Tolentino (MC)	L. 120.052.850	L. 109.548.226	8,75
TRATTATIVA PRIVATA	Soc. Crucianelli-EdilFrontignano v. sacharov 2/4 Tolentino MC 00146840434	L. 269.403.362	L. 245.830.868	8,75
Totali		L. 389.456.212	L. 355.379.094	
