

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 06/08/98	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 20/11/98	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 27/01/99	L. 515.000.000	L. 500.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 09/02/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	Lit. -23572794
DM 01/06/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 05/08/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 13/09/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 16/11/99	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
Automatico	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 21/07/00	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 01/08/00	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/12/00	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/02/01	L. 491.427.206	L. 476.427.206	L. 0	L. 15.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/06/01)
Opere Civili	220.000.000	196.667.262
Opere Impiantistiche	50.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	370.000.000	196.667.262
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	56.500.000	56.449.240
Altre Spese Tecniche	7.000.000	
Allacciamenti	1.326.000	
Imprevisti	18.684.800	44.061.667
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.030.000	
- Opere Impiantistiche	240.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		129.710.598
IVA al 10%	27.000.000	19.666.727
IVA al 20%	33.219.200	11.515.645
SOMME A DISPOSIZIONE	145.000.000	261.403.877
TOTALE COSTO	515.000.000	458.071.139
	Economie	-56.928.861
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	500.000.000	443.071.139
Risorse proprie	15.000.000	15.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	515.000.000	458.071.139

Protocollo d'intervento: **6589****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI ISOLA*Comune **PIEVEBOVIGLIANA (MC)**Finanziamento **L. 400 milioni**- Tot. Impegnato **L. 384.827.148**- Tot. Pagato **L. 384.827.147**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/98* **30/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **29/12/99***Chiesa di S. Giovanni Evangelista di Isola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90003090439**Indirizzo **FRAZ. ISOLA****PIEVEBOVIGLIANA (MC)**Recapiti **Telefono:****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Italstrade - Pieroni G. in ATI VIA S.S. 77 KM. 43,5 Muccia (MC) 01294750433	L. 271.660.875	L. 261.473.592	3,75
Totali		L. 271.660.875	L. 261.473.592	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

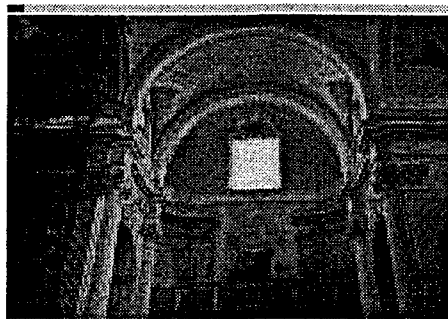
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 400.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/10/01)	
Opere Civili	257.000.000	261.473.592	
Opere Impiantistiche	15.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	272.000.000	261.473.592	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	36.500.000	36.500.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	20.000.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	30.000.000	29.406.197	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	30.200.000	26.147.359	
IVA al 20%	11.300.000	11.300.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	128.000.000	123.353.556	
TOTALE COSTO	400.000.000	384.827.148	
	Economie	-15.172.852	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	384.827.148	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	400.000.000	384.827.148	

Protocollo d'intervento: **6598****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO STATICO E RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO*Comune **CAMERINO (MC)**Finanziamento **L. 1.800 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.799.711.076**- Tot. Pagato **L. 1.799.711.076**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/10/98 07/10/98**Fine Lavori **01/10/99 29/12/99***Chiesa di San Filippo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA SARTENA ALTA 1****S. GIUSTINA (BL)**Recapiti **Telefono: 0437/858324****Telefax: 0437/8584324****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	Ditta ICI IMPRESA COSTRUZIONI SRL P.za Bruno Mora 15/A Parma 00899620348	L. 1.448.523.147	L. 1.405.067.453	3,00

 Totali L. 1.448.523.147 L. 1.405.067.453

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.800.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)
Opere Civili	1.000.000.000	1.013.226.321
Opere Impiantistiche	400.000.000	404.847.930
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	46.754.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.440.000.000	1.464.828.251
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	78.000.000	
Altre Spese Tecniche	72.000.000	157.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	32.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	140.000.000	146.482.825
IVA al 20%	38.000.000	31.400.000
SOMME A DISPOSIZIONE	360.000.000	334.882.825
TOTALE COSTO	1.800.000.000	1.799.711.076
	Economie	-288.924
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.800.000.000	1.799.711.076
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.800.000.000	1.799.711.076

Protocollo d'intervento: **6693****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI STRUTTURA DESTINATA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO*
 Comune **CANTIANO (PS)**
 Finanziamento **L. 899 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 899.152.835**
 - Tot. Pagato **L. 891.674.600**
 Cofinanziamento **L. 100 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 16/09/98 16/09/98
 Fine Lavori 30/04/99 28/10/99

*Immobile sito in piazza del Mercato***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **93000140413**
 Indirizzo **VIA IV NOVEMBRE, 14** **CANTIANO (PS)**
 Recapiti **Telefono: 0721 788273** **Telefax: 0721 788273**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	AMANTINI VALFRANCO srl v. arcaleni 21 Città di castello 00452920416	L. 760.605.000	L. 759.844.395	0,10
Totali		L. 760.605.000	L. 759.844.395	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.000.000.000	L. 900.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 999.152.835	L. 899.152.835	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -847165

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/02/00)	
Opere Civili	502.000.000	501.952.545	
Opere Impiantistiche	148.000.000	148.001.850	
Arredi e/o Attrezzature	110.000.000	109.890.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	760.000.000	759.844.395	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	78.000.000	87.418.299	
Altre Spese Tecniche	8.000.000		
Allacciamenti	7.000.000	7.664.160	
Imprevisti	39.000.000	39.652.440	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	2.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	65.000.000	75.984.440	
IVA al 20%	41.000.000	17.833.333	
SOMME A DISPOSIZIONE	240.000.000	228.552.672	
TOTALE COSTO	1.000.000.000	988.397.067	
	Economie	-11.602.933	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	900.000.000	891.674.600	
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.000.000.000	991.674.600	

Protocollo d'intervento: **6767****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN OSTELLO PER GIOVANI*Comune **JESI (AN)**Finanziamento **L. 2.009 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.985.360.344**- Tot. Pagato **L. 1.786.824.308**Cofinanziamento **L. 1.050 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **28/11/98 30/11/98**Fine Lavori **23/09/99 03/02/00***Villa Borgognoni***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI JESI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00135880425**Indirizzo **PIAZZA INDIPENDENZA, 1****JESI (AN)**Recapiti **Telefono: 0731 5381****Telefax: 0731 538328****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Alfredo Marcozzi srl v. nazario sauro 90 Teramo 00962420675	L. 2.513.515.779	L. 2.116.882.989	15,78
Totali		L. 2.513.515.779	L. 2.116.882.989	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
Automatico	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.500.000.000	L. 2.450.000.000	L. 0	L. 1.050.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.059.360.344	L. 2.009.360.344	L. 0	L. 1.050.000.000	- Lit. -440639656

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)
Opere Civili	1.500.000.000	2.158.464.980
Opere Impiantistiche	700.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	450.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.650.000.000	2.158.464.980
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	305.000.000	486.870.795
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti	23.000.000	
Imprevisti	65.000.000	112.012.750
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	20.000.000	89.133.496
- Opere Impiantistiche	20.000.000	
- Arredi e/o attrezzature	10.000.000	
- Altre voci		
IVA al 10%	220.000.000	215.846.498
IVA al 20%	157.000.000	11.201.275
SOMME A DISPOSIZIONE	850.000.000	915.064.814
TOTALE COSTO	3.500.000.000	3.073.529.794
	Economie	-426.470.206
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.450.000.000	1.985.360.344
Risorse proprie	1.050.000.000	1.050.000.000
Altre fonti finanziarie		38.169.450
TOTALE COPERTURE	3.500.000.000	3.073.529.794

Protocollo d'intervento: **6775****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DELLE COPERTURE DELLA CATTEDRALE DI S. SETTIMIO DUOMO DI JESI*
 Comune **JESI (AN)**
 Finanziamento **L. 455 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 455.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 455.000.000**
 Cofinanziamento **L. 337 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *13/10/97* **01/10/97**
 Fine Lavori *12/10/98* **02/04/99**

*Cattedrale di S. Settimio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ENTE DIOCESI DI JESI**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **91004700422**
 Indirizzo **P.ZZA FEDERICO II, 6** **JESI (AN)**
 Recapiti **Telefono: 0731 56813** **Telefax: 0731 53700**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA - OFFERTA PREZZI	Edilizia Angeloni srl v.Menicucci Cupramontana AN 00851100420	L. 566.283.180	L. 537.969.021	5,00
Totali		L. 566.283.180	L. 537.969.021	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

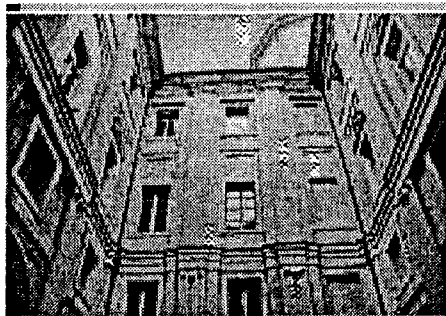
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 06/08/98	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 20/11/98	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 27/01/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 09/02/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 01/06/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 05/08/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 13/09/99	L. 650.000.000	L. 455.000.000	L. 0	L. 195.000.000	
DM 16/11/99	L. 720.895.036	L. 455.000.000	L. 0	L. 265.895.036	+ Lit. 70895036
Automatico	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	+ Lit. 70895036
DM 21/07/00	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	
DM 01/08/00	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	
DM 14/12/00	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	
DM 14/02/01	L. 791.790.072	L. 455.000.000	L. 0	L. 336.790.072	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/00)	
Opere Civili	538.000.000	608.179.487	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	538.000.000	608.179.487	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	42.000.000	42.400.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	6.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	1.000.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		848.000	
IVA al 10%	54.000.000	60.817.949	
IVA al 20%	9.000.000	8.649.600	
SOMME A DISPOSIZIONE	112.000.000	112.715.549	
TOTALE COSTO	650.000.000	720.895.036	
	Maggiore Spesa	70.895.036	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	455.000.000	455.000.000	
Risorse proprie	195.000.000	265.895.036	
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	650.000.000	720.895.036	

Protocollo d'intervento: **6808****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ACCOGLIENZA E RESIDENZA SANTA MARIA GORETTI*Comune **CORINALDO (AN)**Finanziamento **L. 1.904 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.904.332.142**- Tot. Pagato **L. 1.904.332.142**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **31/08/98 27/08/98**Fine Lavori **31/07/99***Convento degli Agostiniani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CORINALDO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00106410426**Indirizzo **VIA DEL CORSO, 9****CORINALDO (AN)**Recapiti **Telefono: 071 67018****Telefax: 071 67019****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Ditta MISE srl v. marconi 31 Falconara (AN) 00120030424	L. 340.598.800	L. 249.075.200	26,87
LICITAZIONE PRIVATA	Scaglione Carmine v. fontanelle 64 Lanciano CH 00627110695	L. 1.633.154.066	L. 1.429.009.808	12,50
Totali		L. 1.973.752.866	L. 1.678.085.008	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.500.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.200.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	- Lit. -295667858
DM 01/06/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.204.332.142	L. 1.904.332.142	L. 0	L. 300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/01/01)
Opere Civili	1.210.000.000	2.015.478.040
Opere Impiantistiche	330.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	430.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.970.000.000	2.015.478.040
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	144.000.000	285.306.119
Altre Spese Tecniche	69.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	70.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	204.000.000	
IVA al 20%	43.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	530.000.000	285.306.119
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.300.784.159
	Economie	-199.215.841
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.904.330.000	1.904.330.000
Risorse proprie	300.000.000	396.452.017
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.204.330.000	2.300.782.017

Protocollo d'intervento: **6821****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)</i>	
Comune	LORETO (AN)	
Finanziamento	L. 1.909 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.978.249.613
	- Tot. Pagato	L. 1.705.775.918
Cofinanziamento	L. 400 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>31/05/99</i>	<i>05/07/99</i>
Fine Lavori	<i>29/10/99</i>	

*Nuovo centro polivalente***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI LORETO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00319830428	
Indirizzo	CORSO BOCCALINI	LORETO (AN)
Recapiti	Telefono: 071 750561	Telefax: 071 7500150

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
CONCORSO	C.M.V. S.R.L. VIA BOSCHETTI, 1870 VIGNOLA (MO) 02258460365	L. 926.863.944	L. 326.800.000	64,74
LICITAZIONE PRIVATA	C.E.R. CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO VIA CALZONI, 1/3 BOLOGNA	L. 938.530.905	L. 817.460.418	12,90
Totali		L. 1.865.394.849	L. 1.144.260.418	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.500.000.000	L. 2.100.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.328.057.524	L. 1.928.057.524	L. 0	L. 400.000.000	Lit. -171942476
DM 14/12/00	L. 2.328.057.524	L. 1.928.057.524	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.309.256.842	L. 1.909.256.842	L. 0	L. 400.000.000	Lit. -18800682

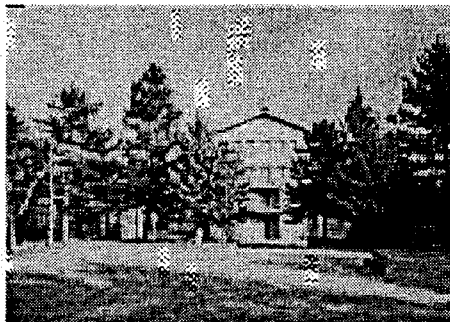
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (04/08/00)
Opere Civili	938.500.000	1.769.260.418
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	926.800.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.865.300.000	1.769.260.418
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	104.000.000	104.000.000
Altre Spese Tecniche	80.000.000	85.280.926
Allacciamenti		27.000.000
Imprevisti	36.400.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.800.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	1.800.000	
- Altre voci		1.000.000
IVA al 10%		
IVA al 20%	410.700.000	391.708.269
SOMME A DISPOSIZIONE	634.700.000	608.989.195
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.378.249.613
	Economie	-121.750.387
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.100.000.000	1.978.249.613
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.378.249.613

Protocollo d'intervento: **6888**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DI STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA CASA GIOIOSA</i>	
Comune	MONTEMONACO (AP)	
Finanziamento	L. 1.000 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.000.000.000
	- Tot. Pagato	L. 1.000.000.000
Cofinanziamento	L. 255 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	03/03/99	03/03/99
Fine Lavori	30/09/99	10/01/00



Casa Gioiosa

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO IN FERRA'	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	80006390449	
Indirizzo	FERRA'	FERRA' MONTEMONACO (AP)
Recapiti	Telefono: 0736 856131	Telefax: 0736 251996

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento DIRETTO	Imp. edile Petrelli Brunati V. C.da collina Montemonaco AP 01496420447	L. 861.000.000	L. 861.000.000	0,00
		Totale	L. 861.000.000	L. 861.000.000
