


RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.794.000.000	L. 1.794.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/02/01)
Opere Civili	1.400.000.000	2.099.435.000
Opere Impiantistiche	400.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.100.000.000	2.099.435.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	210.000.000	210.000.000
Altre Spese Tecniche	35.000.000	35.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.598.500
Imprevisti	150.000.000	114.087.500
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	3.000.000	
- Opere Impiantistiche	1.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		3.744.599
IVA al 10%		205.408.750
IVA al 20%	285.000.000	83.755.620
SOMME A DISPOSIZIONE	694.000.000	662.594.969
TOTALE COSTO	2.794.000.000	2.762.029.969
	Economie	-31.970.031
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.794.000.000	1.757.122.000
Risorse proprie	1.000.000.000	1.004.907.969
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.794.000.000	2.762.029.969

Protocollo d'intervento: **7464****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO FACCIATA CHIESA SAN DOMENICO*Comune **ANCONA (AN)**Finanziamento **L. 295 milioni**- Tot. Impegnato **L. 295.101.773**- Tot. Pagato **L. 295.101.773**Cofinanziamento **L. 0 milioni**. Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **20/05/99 10/05/99**Fine Lavori **17/10/99***Chiesa di S. Domenico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI ANCONA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00351040423**Indirizzo **PIAZZA XXIV MAGGIO****ANCONA (AN)**Recapiti **Telefono: 071 2221****Telefax: 071 2222109****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
SUB APPALTO - INSTALLAZIONE PONTEGGI	CONS ART COOP a.r.l. Via Caduti del Lavoro, 24/F (AN) 00351650429	L. 35.000.000	L. 35.000.000	0,00
PUBBLICO INCANTO	Lares srl v. santa croce 521 Venezia 00163960271	L. 238.844.400	L. 203.352.122	14,86
Totali		L. 273.844.400	L. 238.352.122	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 344.000.000	L. 344.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 295.101.773	L. 295.101.773	L. 0	L. 0	Lit. -48898227

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/01/01)	
Opere Civili	203.352.122	208.244.181	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	203.352.122	208.244.181	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche	17.000.000	12.077.645	
Allacciamenti			
Imprevisti	60.492.278	24.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	29.680.000	23.050.000	
IVA al 10%	28.492.440	25.224.419	
IVA al 20%	4.983.160	2.505.528	
SOMME A DISPOSIZIONE	140.647.878	86.857.592	
TOTALE COSTO	344.000.000	295.101.773	
	Economie	-48.898.227	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	344.000.000	295.101.773	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	344.000.000	295.101.773	

Protocollo d'intervento: **7502****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DI RICETTIVITA' POVERA*

Comune **TOLENTINO (MC)**

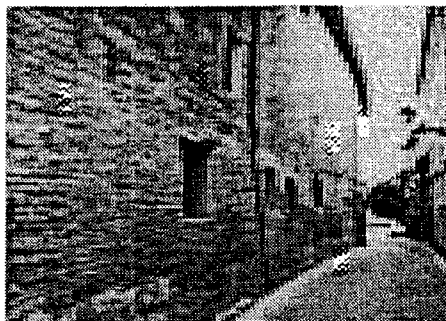
Finanziamento **L. 848 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 847.575.000**

- Tot. Pagato **L. 772.097.500**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/10/98	07/10/98
Fine Lavori	01/10/99	29/12/99

*Santuario di S. Nicola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **83000110433**

Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**

Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Ditta SERENI srl v. galilei 3 Ripe (AN) 01136170428	L. 726.626.838	L. 665.379.431	8,43
Totali		L. 726.626.838	L. 665.379.431	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 928.000.000	L. 928.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	Lit. -80425000
DM 05/08/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 847.575.000	L. 847.575.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/04/99)	
Opere Civili	580.000.000	391.118.431	
Opere Impiantistiche	40.000.000	167.635.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000		
Altre Voci		106.626.000	
TOTALE LAVORI	720.000.000		665.379.431
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	33.000.000	68.657.238	
Altre Spese Tecniche	29.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	50.800.000	33.268.940	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche		13.731.447	
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	62.000.000	66.537.944	
IVA al 20%	33.200.000		
SOMME A DISPOSIZIONE	208.000.000		182.195.569
TOTALE COSTO	928.000.000		847.575.000
	Economie		-80.425.000
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		928.000.000	847.575.000
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	928.000.000		847.575.000

Protocollo d'intervento: **7503****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA PER REALIZZARE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA*

Comune **TOLENTINO (MC)**

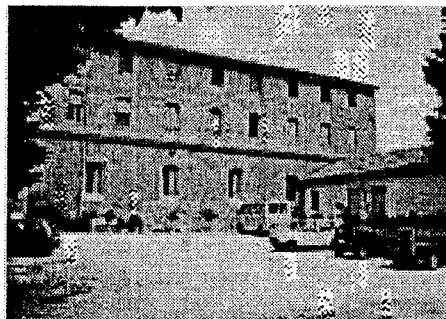
Finanziamento **L. 608 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 607.564.000**

- Tot. Pagato **L. 553.707.600**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/10/98	07/10/98
Fine Lavori	01/10/99	29/12/99

*Santuario di S. Nicola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **83000110433**

Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**

Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Impiglia Luigi v. S. Bartolo 2/E S.S. Quirico (AN) 01171770421	L. 530.001.731	L. 466.822.346	11,92
Totali		L. 530.001.731	L. 466.822.346	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 690.000.000	L. 690.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	Lit. -82436000
DM 05/08/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 607.564.000	L. 607.564.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (29/04/99)
Opere Civili	520.000.000	462.979.046
Opere Impiantistiche	10.000.000	3.673.300
Arredi e/o Attrezzature		170.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	530.000.000	466.822.346
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	58.932.408
Altre Spese Tecniche	35.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	31.200.000	23.340.529
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		11.786.482
IVA al 10%	53.000.000	46.682.235
IVA al 20%	11.800.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	160.000.000	140.741.654
TOTALE COSTO	690.000.000	607.564.000
	Economie	-82.436.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	690.000.000	607.564.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	690.000.000	607.564.000

Protocollo d'intervento: **7505****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA*
Comune **TOLENTINO (MC)**
Finanziamento **L. 718 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 717.521.000**
 - Tot. Pagato **L. 653.168.900**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/10/98 07/10/98
Fine Lavori 01/10/99 29/12/99

*Santuario di S. Nicola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI TOLENTINO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 83000110433
Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 TOLENTINO (MC)
Recapiti Telefono: 0733 9011 Telefax: 0733 901360

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	Pieramici Osvaldo v. sasso 43 Urbino (PS)	L. 580.841.600	L. 563.416.352	3,00
Totali		L. 580.841.600	L. 563.416.352	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 740.000.000	L. 740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	- Lit. -22479000
DM 05/08/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 717.521.000	L. 717.521.000	L. 0	L. 0	

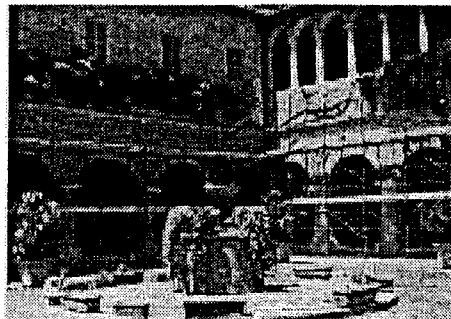
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (29/04/99)
Opere Civili	580.000.000	563.416.352
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	580.000.000	563.416.352
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	31.000.000	57.993.685
Altre Spese Tecniche	27.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	32.400.000	28.170.590
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		11.598.737
IVA al 10%	58.000.000	56.341.636
IVA al 20%	11.600.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	160.000.000	154.104.648
TOTALE COSTO	740.000.000	717.521.000
	Economie	-22.479.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	740.000.000	717.521.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	740.000.000	717.521.000

Protocollo d'intervento: **7506**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO COLONNATO CHIOSTRO DEL COMPLESO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA*
 Comune **TOLENTINO (MC)**
 Finanziamento **L. 377 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 377.260.454**
 - Tot. Pagato **L. 343.454.412**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 30/10/98 07/10/98
 Fine Lavori 01/10/99 10/12/99

*Santuario di S. Nicola*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **83000110433**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**
 Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Alma di Mancini E. e C. snc v. rosselli 1 Tolentino (MC) 00333140432	L. 300.011.974	L. 288.158.731	3,95
Totali		L. 300.011.974	L. 288.158.731	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 392.000.000	L. 392.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	- Lit. -14739000
DM 05/08/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 377.261.000	L. 377.261.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (31/03/99)
Opere Civili	300.000.000	288.158.731
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	300.000.000	288.158.731
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.000.000	38.231.595
Altre Spese Tecniche	23.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	10.400.000	14.407.935
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		7.646.319
IVA al 10%	30.000.000	28.815.874
IVA al 20%	8.600.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	92.000.000	89.101.723
TOTALE COSTO	392.000.000	377.260.454
	Economie	-14.739.546
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	392.000.000	377.260.454
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	392.000.000	377.260.454

Protocollo d'intervento: **7507****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CONSERVAZIONE E RESTAURO TETTO ED INFISSI DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL SANTUARIO DI SAN NICOLA*
Comune **TOLENTINO (MC)**
Finanziamento **L. 321 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 318.118.054**
 - Tot. Pagato **L. 289.516.252**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori **30/10/98** **07/10/98**
Fine Lavori **01/10/99** **30/08/99**

*Santuario di S. Nicola***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione COMUNE DI TOLENTINO
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 83000110433
Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA', 3 TOLENTINO (MC)
Recapiti Telefono: 0733 9011 Telefax: 0733 901360

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	Alma di Mancini E. e C. snc v. rosselli 1 Tolentino (MC) 00333140432	L. 250.002.403	L. 240.125.952	3,95
Totali		L. 250.002.403	L. 240.125.952	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (30/03/99)
Opere Civili	250.000.000	240.125.952
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	250.000.000	240.125.952
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	19.000.000	
Altre Spese Tecniche	17.000.000	34.977.674
Allacciamenti		12.006.297
Imprevisti	2.800.000	6.995.535
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	25.000.000	24.012.596
IVA al 20%	7.200.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	71.000.000	77.992.102
TOTALE COSTO	321.000.000	318.118.054
	Economie	-2.881.946
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	321.000.000	318.118.054
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	321.000.000	318.118.054

Protocollo d'intervento: **7509****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DI UN ACCESSO FACILITATO DAL PARCHEGGIO DI OSMANI FILZI ALLA CHIESA SANTA MARIA NUOVA*

Comune **TOLENTINO (MC)**

Finanziamento **L. 600 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 577.568.504**

- Tot. Pagato **L. 519.811.652**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/11/98	14/12/98
Fine Lavori	15/06/99	30/12/99

*Parcheggio di zona Osmani Filzi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **83000110433**

Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**

Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	Del Bello Fernando v. falcone 40 Tolentino (MC) 00155050438	L. 453.161.545	L. 430.730.049	4,95
Totali		L. 453.161.545	L. 430.730.049	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

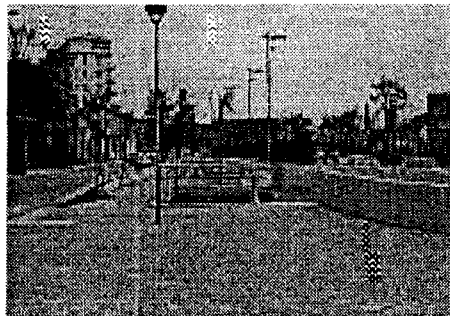
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/09/99)
Opere Civili	336.314.000	430.730.049
Opere Impiantistiche	78.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	5.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	419.314.000	430.730.049
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	30.000.000	37.000.000
Altre Spese Tecniche	37.000.000	27.000.000
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	20.386.000	8.965.450
- Espropri o Acquisizioni	20.000.000	15.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	18.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	41.900.000	43.073.005
IVA al 20%	13.400.000	15.800.000
SOMME A DISPOSIZIONE	185.686.000	146.838.455
TOTALE COSTO	605.000.000	577.568.504
	Economie	-27.431.496
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	600.000.000	577.568.504
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	600.000.000	577.568.504

Protocollo d'intervento: **7513****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DEL PARCHEGGIO DEL FORO BOARIO*
 Comune **TOLENTINO (MC)**
 Finanziamento **L. 400 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 398.599.515**
 - Tot. Pagato **L. 358.739.566**
 Cofinanziamento **L. 700 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *15/09/98* **15/09/98**
 Fine Lavori *15/03/99* **27/04/99**

*Parcheggio Foro boario***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TOLENTINO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **83000110433**
 Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 3** **TOLENTINO (MC)**
 Recapiti **Telefono: 0733 9011** **Telefax: 0733 901360**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Ditta Alma di Mancini Ennio v. f.lli rosselli 1 Tolentino MC 00333140432	L. 317.697.759	L. 313.599.515	1,29
Totali		L. 317.697.759	L. 313.599.515	
