

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.020.000.000	L. 3.020.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.593.207.667	L. 2.593.207.667	L. 0	L. 0	- Lit. -426792333

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (14/02/01)
Opere Civili	2.000.000.000	1.584.320.075
Opere Impiantistiche	300.000.000	514.232.170
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.300.000.000	2.098.552.245
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	145.000.000	176.039.600
Altre Spese Tecniche	95.000.000	49.297.942
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	140.000.000	14.395.148
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	244.000.000	209.855.224
IVA al 20%	56.000.000	45.067.508
SOMME A DISPOSIZIONE	720.000.000	494.655.422
TOTALE COSTO	3.020.000.000	2.593.207.667
	Economie	-426.792.333
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.020.000.000	2.593.207.667
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.020.000.000	2.593.207.667

Protocollo d'intervento: **3761****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DEL COMPLESSO MONUMENTALE CHIESA CHIOSTRI DI S. FRANCESCO*
Comune **SUSA (TO)**
Finanziamento **L. 820 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 819.900.000**
 - Tot. Pagato **L. 819.900.000**
Cofinanziamento **L. 150 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori **30/10/98** **30/10/98**
Fine Lavori **20/07/99** **31/10/99**

*Complesso monumentale di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione PROV. LIGURE PIEMONTESE FRATI MINORI
Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);
C.Fis./P.IVA 80017210107
Indirizzo VIA ALBARO, 33 GENOVA (GE)
Recapiti Telefono: 010 3628624 Telefax: 010 312555

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	LORENZIN COSTRUZIONI FRAZ. VERNETTO, 18 CHIANOCCO	L. 753.000.000	L. 753.000.000	0,00
Totali		L. 753.000.000	L. 753.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 970.000.000	L. 820.000.000	L. 0	L. 150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/04/01)
Opere Civili	673.000.000	673.000.000
Opere Impiantistiche	40.000.000	40.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	40.000.000	40.000.000
TOTALE LAVORI	753.000.000	753.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	78.000.000	78.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	48.100.000	48.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	75.300.000	75.300.000
IVA al 20%	15.600.000	15.600.000
SOMME A DISPOSIZIONE	217.000.000	216.900.000
TOTALE COSTO	970.000.000	969.900.000
	Economie	-100.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	820.000.000	819.900.000
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	970.000.000	969.900.000

Protocollo d'intervento: **3768****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITA' ROSMINIANA*Comune **DOMODOSSOLA (VB)**Finanziamento **L. 578 milioni**- Tot. Impegnato **L. 578.118.645**- Tot. Pagato **L. 578.118.645**Cofinanziamento **L. 148 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/04/99* **15/04/99**Fine Lavori *11/08/99* **11/10/99***Centro di spiritualità rosminiana***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01690750011**Indirizzo **VIA ROSMINI, 6****TORINO (TO)**Recapiti **Telefono: 011 6689887****Telefax: 011 6690604****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA EDIL-MAR SNC STRADA STATALE 337 TRONTANO BB 00591370036	L. 594.691.968	L. 589.934.432	0,80
Totali		L. 594.691.968	L. 589.934.432	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 13/09/99	L. 723.000.000	L. 623.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	+ Lit. 47609230
Automatico	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 21/07/00	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 01/08/00	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 14/12/00	L. 770.609.230	L. 623.000.000	L. 0	L. 147.609.230	
DM 14/02/01	L. 725.727.875	L. 578.118.645	L. 0	L. 147.609.230	- Lit. -44881355

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/07/00)
Opere Civili	376.954.488	387.876.474
Opere Impiantistiche	59.250.000	58.320.000
Arredi e/o Attrezzature	158.487.480	143.737.958
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	594.691.968	589.934.432
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	33.000.000	33.000.000
Altre Spese Tecniche	31.000.000	31.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	21.635.743	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	45.784.023	58.993.443
IVA al 20%	44.497.436	12.800.000
SOMME A DISPOSIZIONE	175.917.202	135.793.443
TOTALE COSTO	770.609.170	725.727.875
	Economie	-44.881.295
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	623.000.000	578.118.645
Risorse proprie	147.609.230	147.609.230
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	770.609.230	725.727.875

Protocollo d'intervento: **3946****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE AL 1° PIANO DELL'ALA EST E SUD DEL CHIOSTRO BENEDETTINO*
 Comune **SAN NAZZARO SESIA (NO)**
 Finanziamento **L. 448 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 450.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 448.391.760**
 Cofinanziamento **L. 50 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *19/09/98* *26/10/98*
 Fine Lavori *27/05/99* *04/06/99*

*Abbazia benedettina dei SS. Nazario e Celso***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ABBAZIA BENEDETTINA SS. NAZARIO E CELSO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80013950037**
 Indirizzo **VIA BARBAVARA, 5** **SAN NAZZARO SESIA (NO)**
 Recapiti **Telefono: 0321 834073** **Telefax: 0321 834073 TP**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFF. FIDUCIARIO	R.A.RENZI ALBERTO IMP.TEC. TRONZANO v.se (VC)	L. 43.058.023	L. 43.058.023	0,00
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	IM.E.P. S.R.L. TRONZANO	L. 57.906.202	L. 57.906.202	0,00
AFFIDAM. FIDUCIARIO	LE TORRI S.R.L. SORRENTINO (BZ)	L. 276.011.787	L. 276.011.787	0,00
Totali		L. 376.976.012	L. 376.976.012	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 500.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 498.391.760	L. 448.391.760	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -1608240

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/04/00)	
Opere Civili	320.000.000	276.000.000	
Opere Impiantistiche	45.000.000	100.900.000	
Arredi e/o Attrezzature	35.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	400.000.000	376.900.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	44.000.000	66.740.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	3.700.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		2.112.000	
IVA al 10%	36.500.000	37.690.000	
IVA al 20%	15.800.000	14.949.760	
SOMME A DISPOSIZIONE	100.000.000	121.491.760	
TOTALE COSTO	500.000.000	498.391.760	
	Economic		-1.608.240
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	450.000.000		448.391.760
Risorse proprie	50.000.000		50.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	500.000.000		498.391.760

Protocollo d'intervento: **5559****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OPERE INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA BASILICA SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GUARDIA*

Comune **TORTONA (AL)**


Finanziamento **L. 1.728 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.727.911.000**

- Tot. Pagato **L. 1.727.911.000**

Cofinanziamento **L. 200 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/01/99	15/02/99
Fine Lavori	15/09/99	26/10/99

*Santuario della Madonna della Guardia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. REL. DI S. MARZIANO DON ORIONE**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **02541960155**

Indirizzo **VIA CATERINA DA FORLÌ , 19** **MILANO (MI)**

Recapiti **Telefono: 02 4294429** **Telefax: 02 4294461**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
trattativa privata	MUTTI COSTRUZIONI S.S. per GE N.15/C TORTONA (AL) 00171840069	L. 1.394.357	L. 1.328.822	4,70
	ANDRIOTTO REMO & ROVINA REMIGIO VIA MORANDI, 15 TORTONA 00527260061	L. 49.000.000	L. 49.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	ROSSI ENNIO SS. PER GE N°68 D TORTONA 00532690062	L. 71.000.000	L. 71.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	SCAPOLAN FABRIZIO VIA P. NENNI 41, PONTECURONE 00512710062	L. 75.000.000	L. 75.000.000	0,00
Totali		L. 196.394.357	L. 196.328.822	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000 - Lit. -72089000	
DM 05/08/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.927.911.000	L. 1.727.911.000	L. 0	L. 200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/11/00)
Opere Civili	1.115.000.000	1.967.990.640
Opere Impiantistiche	190.000.000	195.000.000
Arredi e/o Attrezzature	170.000.000	
Altre Voci	130.000.000	
TOTALE LAVORI	1.605.000.000	2.162.990.640
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	116.000.000	122.400.000
Altre Spese Tecniche	25.000.000	24.106.900
Allacciamenti	15.000.000	
Imprevisti	39.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	162.000.000	216.299.064
IVA al 20%	39.000.000	29.293.380
SOMME A DISPOSIZIONE	396.000.000	392.099.344
TOTALE COSTO	2.001.000.000	2.555.089.984
	Maggiore Spesa	554.089.984
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.800.000.000	1.727.911.000
Risorse proprie	200.000.000	827.178.984
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	2.555.089.984

Protocollo d'intervento: **5564****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SANTA CROCE*Comune **BOSCO MARENGO (AL)**Finanziamento **L. 2.145 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.144.508.727**- Tot. Pagato **L. 1.930.057.850**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/07/98* **26/10/98**Fine Lavori *31/08/99* **18/12/99***Complesso conventuale di Santa Croce***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI BOSCO MARENGO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00366320067**Indirizzo **VIA S. PIO V, 4****BOSCO MARENGO (AL)**Recapiti **Telefono: 0131 299342** **Telefax: 0131 299686****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Mi.Se. s.r.l. via Marconi , 31 Falconara Marittima 00120030424	L. 254.549.000	L. 180.729.790	29,00
LIC. PRIV.	BUCCELLATO S.R.L. SESTU (CA)	L. 1.675.210.464	L. 1.432.757.253	14,47
Totali		L. 1.929.759.464	L. 1.613.487.043	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -355000000
DM 21/07/00	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.145.000.000	L. 2.145.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/11/01)
Opere Civili	1.280.000.000	1.432.700.657
Opere Impiantistiche	410.000.000	179.137.828
Arredi e/o Attrezzature	260.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.950.000.000	1.611.838.485
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	192.000.000	
Altre Spese Tecniche	95.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	3.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili	6.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		529.893.474
IVA al 10%	195.000.000	
IVA al 20%	59.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	550.000.000	529.893.474
TOTALE COSTO	2.500.000.000	2.141.731.959
	Economie	-358.268.041
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.141.731.959
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.500.000.000	2.141.731.959

Protocollo d'intervento: **5799****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento CHIESA DI S. GIUSEPPE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO
Comune ASTI (AT)
Finanziamento L. 1.273 milioni
 - Tot. Impegnato L. 1.179.380.723
 - Tot. Pagato L. 1.179.380.723
Cofinanziamento L. 1.150 milioni
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/12/98 31/12/98
Fine Lavori 27/10/99 31/12/99



Chiesa di S. Giuseppe

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI ASTI
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00072360050
Indirizzo PIAZZA SAN SECONDO ASTI (AT)
Recapiti Telefono: 0141 3991 Telefax: 0141 399250

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC. PRIV.	ATI RECO-COGEAR ITALIA VENAFRO (IS)	L. 2.000.000.000	L. 1.697.000.000	15,15
Totali		L. 2.000.000.000	L. 1.697.000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

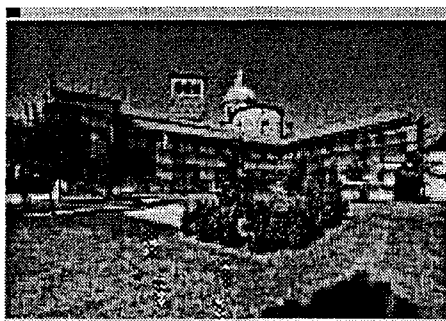
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.650.000.000	L. 1.500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
Automatico	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	- Lit. -330000000
DM 21/07/00	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.320.000.000	L. 1.170.000.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.422.750.000	L. 1.272.750.000	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000	+ Lit. 102750000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/10/01)
Opere Civili	1.700.000.000	1.774.921.198
Opere Impiantistiche	300.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.000.000.000	1.774.921.198
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	170.000.000	216.701.100
Altre Spese Tecniche	135.000.000	140.206.080
Allacciamenti	7.000.000	
Imprevisti	45.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	15.000.000	15.047.945
- Opere Impiantistiche	2.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.012.280
IVA al 10%	200.000.000	177.492.120
IVA al 20%	76.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	650.000.000	554.459.525
TOTALE COSTO	2.650.000.000	2.329.380.723
	Economie	-320.619.277
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.500.000.000	1.179.380.723
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie	1.000.000.000	1.000.000.000
TOTALE COPERTURE	2.650.000.000	2.329.380.723

Protocollo d'intervento: **11622****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO</i>	
Comune	VERCELLI (VC)	
Finanziamento	L. 3.980 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.978.909.788
	- Tot. Pagato	L. 3.978.909.788
Cofinanziamento	L. 3.349 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/11/98	12/04/99
Fine Lavori	31/07/99	20/12/99

*Palazzo Arcivescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	94006750023	
Indirizzo	PIAZZA D'ANGENNES, 5	VERCELLI (VC)
Recapiti	Telefono: 0161 213345	Telefax: 0161 210848

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	NOVARIA RESTAURI S.r.l. Via Marco Polo, 19 - Novara	L. 399.981.653	L. 319.585.340	20,10
	Franco Girelli s.n.c via Cascine 12	L. 633.333.340	L. 514.900.005	18,70
ASTA PUBBLICA	FABE ELETTRIC sas Via Onorato Vigliani, 195 TO	L. 633.333.340	L. 514.900.005	18,70
ASTA PUBBLICA	Carlo AGNESE S.p.a. Via Salita Vanicella, n.3 La Spezia	L. 1.756.394.943	L. 1.634.224.518	6,96
	Franco Girelli s.n.c via Cascine 12	L. 1.951.329.738	L. 1.634.224.518	16,25
Totali		L. 5.374.373.014	L. 4.617.834.386	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 27/01/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 09/02/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 01/06/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 05/08/99	L. 7.494.000.000	L. 4.274.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
DM 13/09/99	L. 6.927.000.000	L. 3.707.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	- Lit. -567000000
DM 16/11/99	L. 6.927.000.000	L. 3.707.000.000	L. 0	L. 3.220.000.000	
Automatico	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	+ Lit. 372256000
DM 21/07/00	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	
DM 01/08/00	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	
DM 14/12/00	L. 7.299.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.319.436.000	
DM 14/02/01	L. 7.329.256.000	L. 3.979.820.000	L. 0	L. 3.349.436.000	+ Lit. 30000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/01/01)	
Opere Civili	4.550.000.000	3.684.719.191	
Opere Impiantistiche	900.000.000	782.123.998	
Arredi e/o Attrezzature	470.000.000	762.258.245	
Altre Voci		462.284.079	
TOTALE LAVORI	5.920.000.000		5.691.385.513
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	545.000.000	514.125.281	
Altre Spese Tecniche	275.000.000	358.954.624	
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	592.000.000	539.143.712	
IVA al 20%	162.000.000	224.736.658	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.574.000.000		1.636.960.275
TOTALE COSTO	7.494.000.000		7.328.345.788
	Economie		-165.654.212
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.274.000.000		3.978.909.788
Risorse proprie	3.220.000.000		3.349.436.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	7.494.000.000		7.328.345.788

Protocollo d'intervento: **13058****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S.MARIA DI CASTELLO*

Comune **ALESSANDRIA (AL)**


Finanziamento **L. 2.832 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.828.475.388**

- Tot. Pagato **L. 2.828.475.388**

Cofinanziamento **L. 1.800 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/10/98	08/10/98
Fine Lavori	20/10/99	28/12/99

*S. Maria di Castello***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **80003870062**

Indirizzo **PIAZZA DELLA LIBERTA', 17** **ALESSANDRIA (AL)**

Recapiti **Telefono: 0131 3041** **Telefax: 0131 55676**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	MI.SE s.r.l. Falconara Marittima s.r.l.	L. 320.000.000	L. 172.512.000	46,09
ASTA PUBBLICA	ED.ART. SRL VIA BAGHETTI 27 TORINO	L. 3.362.130.666	L. 2.852.061.823	15,17
Totali		L. 3.682.130.666	L. 3.024.573.823	
