

SCHEDE DEI SINGOLI INTERVENTI

Schede dei singoli interventi suddivisi per Regione

Si riportano, nel presente volume, le schede di sintesi dei singoli interventi inseriti nel Piano, relative alle seguenti Regioni:

- Sardegna
- Sicilia
- Toscana

Vengono forniti, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi dell'intervento
- dati relativi al titolare dell'intervento
- dati relativi all'appalto
- confronto fra Q.T.E. di progetto e Q.T.E. finale
- riepilogo dei decreti relativi alle variazioni di costo e di finanziamento.

Si rammenta, come anticipato nell'introduzione di cui al volume I, che la Relazione in questione, al momento di andare in stampa, contiene un resoconto dettagliato per circa l'ottanta per cento degli interventi in parola. Non è stato infatti possibile fornire adeguate informazioni sul restante 20% degli interventi, in ragione della mancata chiusura delle attività di collaudo da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi. Si fa riserva, dunque, di produrre un documento integrativo, non appena verranno rese disponibili le succitate informazioni.

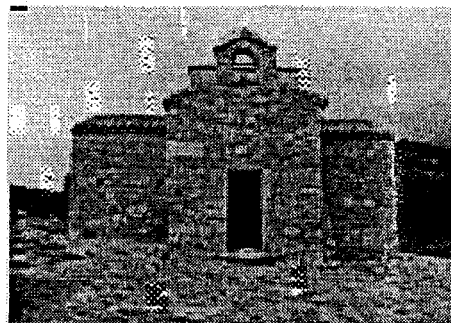
PAGINA BIANCA

SARDEGNA

Protocollo d'intervento: **286**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE AREA PERTINENZA E VIABILITA' DI ACCESSO CHIESA S. ELIA*
 Comune **NUXIS (CA)**
 Finanziamento **L. 263 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 262.376.000**
 - Tot. Pagato **L. 262.376.000**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori *01/03/99* **15/03/99**
 Fine Lavori *01/09/99* **27/09/99**



Chiesa di S. Elisa

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROVINCIA DI CAGLIARI**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00510810922**
 Indirizzo **VIALE CIUSA, 17** **CAGLIARI (CA)**
 Recapiti **Telefono: 070 4092098** **Telefax: 070 494076**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	SOC. E. SAR. snc via Mameli DOMUSNOVAS (CA) 00572300929	L. 200.000.000	L. 176.980.000	11,51
Totali		L. 200.000.000	L. 176.980.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

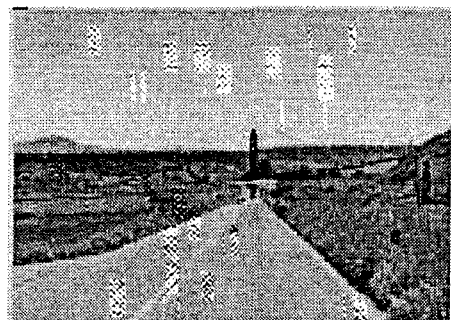
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -37000000
DM 21/07/00	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 263.000.000	L. 263.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/09/01)
Opere Civili	200.000.000	176.980.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	200.000.000	176.980.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	29.000.000	
Altre Spese Tecniche	21.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	4.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	6.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		50.000.000
IVA al 20%	40.000.000	35.396.000
SOMME A DISPOSIZIONE	100.000.000	85.396.000
TOTALE COSTO	300.000.000	262.376.000
	Economie	-37.624.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000	262.376.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	262.376.000

Protocollo d'intervento: **342****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMAZIONE AREA RICETTIVA A SACCARGIA*Comune **CODRONGIANOS (SS)**Finanziamento **L. 3.021 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.926.825.960**- Tot. Pagato **L. 2.911.308.992**Cofinanziamento **L. 1.400 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/11/98* **10/11/98**Fine Lavori *10/10/99* **31/12/99***SS. Trinità di Saccargia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CODRONGIANOS**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00248570905**Indirizzo **PIAZZA DEL COMUNE****CODRONGIANOS (SS)**Recapiti **Telefono: 079 435375****Telefax: 079 435331****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
art.21 L.109/94	Imp.Dott. F. Ticca Viale Umberto, 119 SASSARI 00071800908	L. 3.380.000.000	L. 2.768.558.000	18,09
Totali		L. 3.380.000.000	L. 2.768.558.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

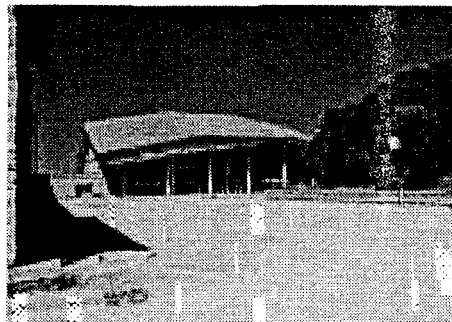
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.205.000.000	L. 3.805.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	- Lit. -784000000
Automatico	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.421.000.000	L. 3.021.000.000	L. 1.250.000.000	L. 150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/10/01)
Opere Civili	1.400.000.000	2.923.100.000
Opere Impiantistiche	230.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	
Altre Voci	1.350.000.000	
TOTALE LAVORI	3.380.000.000	2.923.100.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	304.200.000	321.900.000
Altre Spese Tecniche	151.300.000	146.456.000
Allacciamenti	31.400.000	10.000.000
Imprevisti	169.000.000	2.269.818
- Espropri o Acquisizioni	600.000.000	506.395.960
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		30.500.000
IVA al 10%	358.100.000	292.536.982
IVA al 20%	211.200.000	93.671.200
SOMME A DISPOSIZIONE	1.825.200.000	1.403.729.960
TOTALE COSTO	5.205.200.000	4.326.829.960
	Economie	-878.370.040
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.805.000.000	2.926.829.960
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie	1.250.000.000	1.250.000.000
TOTALE COPERTURE	5.205.000.000	4.326.829.960

Protocollo d'intervento: **343****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE STRUTTURA PER OSPITARE A BASSO COSTO PORTATORI DI HANDICAP*
 Comune **PLOAGHE (SS)**
 Finanziamento **L. 2.400 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.258.356.340**
 - Tot. Pagato **L. 2.258.356.340**
 Cofinanziamento **L. 500 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *02/07/99* **09/07/99**
 Fine Lavori *25/10/99* **31/12/99**

*Fondazione Opera S. Giovanni Battista***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **FONDAZIONE OPERA S. GIOVANNI BATTISTA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **9201590900**
 Indirizzo **LOCALITA' DOMAIORE** **PLOAGHE (SS)**
 Recapiti **Telefono: 079 448888** **Telefax: 079 448888**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
art. 21 L. 109/94 e succ. modif.	CO.GE.MA. S.N.C. Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA VIA SIMPLICIO, 25 SASSARI 01327430904	L. 1.786.000.000	L. 1.693.230.000	5,19
Totali		L. 1.786.000.000	L. 1.693.230.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.900.000.000	L. 2.400.000.000	L. 0	L. 500.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/02/01)
Opere Civili	1.150.000.000	
Opere Impiantistiche	540.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	430.000.000	
Altre Voci	100.000.000	
TOTALE LAVORI	2.220.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	201.000.000	
Altre Spese Tecniche	95.500.000	
Allacciamenti	34.000.000	
Imprevisti	61.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	231.500.000	
IVA al 20%	57.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	680.000.000	0
TOTALE COSTO	2.900.000.000	2.758.499.619
	Economie	-141.500.381
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.400.000.000	2.258.356.340
Risorse proprie	500.000.000	500.143.279
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.900.000.000	2.758.499.619

Protocollo d'intervento: **352**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL COMPLESSO DI SANT'ANTONIO ABATE, DOTAZIONE ATTREZZATURE E ARREDI E REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO</i>	
Comune	TORRALBA (SS)	
Finanziamento	L. 731 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 730.708.879
	- Tot. Pagato	L. 730.708.879
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/10/98	30/10/98
Fine Lavori	30/07/99	11/10/99



Complesso di S. Antonio abate

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI TORRALBA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80005320900	
Indirizzo	PIAZZA MONS. POLA, 5	TORRALBA (SS)
Recapiti	Telefono: 079 847010	Telefax: 079 847085

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	MANCA FRANCO via Custoza OSILO (SS) 00372690909	L. 594.382.901	L. 496.012.531	16,55
Totali		L. 594.382.901	L. 496.012.531	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

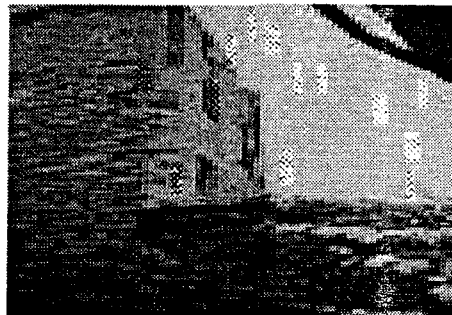
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 839.000.000	L. 839.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -98000000
DM 13/09/99	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 741.000.000	L. 741.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 732.677.963	L. 732.677.963	L. 0	L. 0	- Lit. -8322037
DM 14/12/00	L. 732.677.963	L. 732.677.963	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 730.708.879	L. 730.708.879	L. 0	L. 0	- Lit. -1969084

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/03/99)	
Opere Civili	445.000.000	496.012.531	
Opere Impiantistiche	50.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	70.000.000		
Altre Voci	44.500.000		
TOTALE LAVORI	609.500.000	496.012.531	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	79.803.000	68.479.358	
Altre Spese Tecniche		43.926.555	
Allacciamenti	9.000.000		
Imprevisti	27.690.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		50.000.000	
IVA al 10%		49.601.253	
IVA al 20%	113.000.000	32.481.182	
SOMME A DISPOSIZIONE	229.493.000	244.488.348	
TOTALE COSTO	838.993.000	740.500.879	
	Economie	-98.492.121	
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	839.000.000	730.708.879	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie		4.504.588	
TOTALE COPERTURE	839.000.000	735.213.467	

Protocollo d'intervento: **791****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DI UN FABBRICATO DA DESTINARSI AD OSTELLO*Comune **LANUSEI (NU)**Finanziamento **L. 1.055 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.054.542.687**- Tot. Pagato **L. 1.054.542.687**Cofinanziamento **L. 120 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/09/98* **21/09/98**Fine Lavori *20/07/99* **29/09/99***Immobile sito in via Indipendenza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI LANUSEI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00139020911**Indirizzo **VIA ROMA****LANUSEI (NU)**Recapiti **Telefono: 0782 42585****Telefax: 0782 40168****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
art. 21 L. 109 del 11/02/1994 e succ. modif.	soc. Murgioni Enrico e F. snc Viale Europa LANUSEI (NU) 00771370913	L. 870.857.143	L. 784.206.857	9,95
Totali		L. 870.857.143	L. 784.206.857	
