

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.320.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 120.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	- Lit. -95315315
DM 01/06/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
Automatico	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.224.684.685	L. 1.104.684.685	L. 0	L. 120.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.174.542.687	L. 1.054.542.687	L. 0	L. 120.000.000	- Lit. -50141998

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/07/00)
Opere Civili	550.000.000	784.206.857
Opere Impiantistiche	300.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	160.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.010.000.000	784.206.857
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	85.000.000	187.470.906
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti		8.986.237
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		96.215.000
- Altre voci	48.000.000	
IVA al 10%		78.420.686
IVA al 20%	137.000.000	19.243.000
SOMME A DISPOSIZIONE	310.000.000	390.335.829
TOTALE COSTO	1.320.000.000	1.174.542.686
	Economie	-145.457.314
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.104.685.000	1.054.542.687
Risorse proprie	120.000.000	120.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.224.685.000	1.174.542.687

Protocollo d'intervento: **1806**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RISTRUTTURAZIONE CATTEDRALE</i>	
Comune	NUORO (NU)	
Finanziamento	L. 2.025 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.840.755.392
	- Tot. Pagato	L. 1.840.755.392
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/04/99	14/06/99
Fine Lavori	01/05/99	31/12/99

*Cattedrale di S. Maria della Neve*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA SARTENA ALTA 1	S. GIUSTINA (BL)
Recapiti	Telefono: 0437/858324	Telefax: 0437/8584324

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.950.000.000	L. 1.950.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -109000000
DM 21/07/00	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.841.000.000	L. 1.841.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.025.000.000	L. 2.025.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 184000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (06/10/99)
Opere Civili		1.420.686.720
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI		1.420.686.720
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	230.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	3.000.000	3.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	152.000.000	275.000.000
IVA al 20%	45.000.000	142.068.672
SOMME A DISPOSIZIONE	430.000.000	420.068.672
TOTALE COSTO	430.000.000	1.840.755.392
	Maggiore Spesa	1.410.755.392
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.950.000.000	1.840.755.392
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.950.000.000	1.840.755.392

Protocollo d'intervento: **1852****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo intervento *RESTAURO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DELLE ANTICHE CUMBESSIAS DELLA BASILICA DI SAN GAVINO*

Comune **PORTO TORRES (SS)**

Finanziamento **L. 4.754 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.566.146.420**

- Tot. Pagato **L. 4.566.146.420**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Basilica di S. Gavino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI PORTO TORRES**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00252040902**

Indirizzo **PIAZZA UMBERTO I** **PORTO TORRES (SS)**

Recapiti **Telefono: 079 500800** **Telefax: 079 500868**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
art. 21 L. 109/94 e succ. modif.	Cons. Emiliano Romagnolo BOLOGNA 00416500379	L. 3.336.142.313	L. 2.750.182.277	17,56
Totali		L. 3.336.142.313	L. 2.750.182.277	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.340.000.000	L. 5.340.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -585000000
DM 21/07/00	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.755.000.000	L. 4.755.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.754.039.964	L. 4.754.039.964	L. 0	L. 0	- Lit. -960036

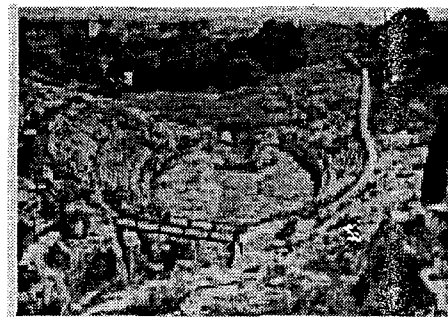
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/04/01)
Opere Civili	3.000.000.000	3.695.778.603
Opere Impiantistiche	600.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	350.000.000	173.280.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.950.000.000	3.869.058.603
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	376.000.000	
Altre Spese Tecniche	210.000.000	640.561.105
Allacciamenti	100.000.000	
Imprevisti	150.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	7.000.000	56.526.700
IVA al 10%	390.000.000	
IVA al 20%	157.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.390.000.000	697.087.805
TOTALE COSTO	5.340.000.000	4.566.146.408
	Economie	-773.853.592
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.340.000.000	4.566.146.420
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.340.000.000	4.566.146.420

Protocollo d'intervento: **2839**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE*
 Comune **CAGLIARI (CA)**
 Finanziamento **L. 2.557 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.433.762.785**
 - Tot. Pagato **L. 2.110.572.107**
 Cofinanziamento **L. 3.500 milioni**

*Anfiteatro romano*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CAGLIARI**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00147990923**
 Indirizzo **PALAZZO CIVICO - - VIA ROMA, 145** **CAGLIARI (CA)**
 Recapiti **Telefono: 070 6771** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
art. 21 L. 109/94 e succ. modif.	C.S.C. Costruzioni Indirizzo via Nuoro CAGLIARI Cod. Fisc./P.IVA 00520310921	L. 5.100.000.000	L. 4.416.170.000	13,41
Totali		L. 5.100.000.000	L. 4.416.170.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.500.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.650.000.000	L. 2.150.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	- Lit. -850000000
DM 16/11/99	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	+ Lit. 407000000
Automatico	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.057.000.000	L. 2.557.000.000	L. 3.185.000.000	L. 315.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (09/11/00)
Opere Civili	3.900.000.000	4.216.170.000
Opere Impiantistiche	800.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci	200.000.000	200.000.000
TOTALE LAVORI	5.100.000.000	4.416.170.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	305.000.000	
Altre Spese Tecniche	370.000.000	250.000.000
Allacciamenti	30.000.000	40.000.000
Imprevisti	50.000.000	50.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		280.000.000
IVA al 10%	510.000.000	441.617.000
IVA al 20%	135.000.000	50.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.400.000.000	1.111.617.000
TOTALE COSTO	6.500.000.000	5.527.787.000
	Economic	-972.213.000
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	1.827.787.000
Risorse proprie	315.000.000	315.000.000
Altre fonti finanziarie	3.185.000.000	3.185.000.000
TOTALE COPERTURE	6.500.000.000	5.327.787.000

Protocollo d'intervento: **2843**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX LAZZARETTO BORGO S. ELIA*Comune **CAGLIARI (CA)**Finanziamento **L. 3.674 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.621.014.649**- Tot. Pagato **L. 3.621.014.649**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/12/98 31/12/98**Fine Lavori **10/10/99 31/12/99***Ex lazzaretto di Borgo S. Elia*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI CAGLIARI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00147990923**Indirizzo **PALAZZO CIVICO - - VIA ROMA, 145****CAGLIARI (CA)**Recapiti **Telefono: 070 6771****Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
art. 1 lett. A L. 14/73	ANDREONI s.p.a. v.le Trento, 86 CAGLIARI	L. 3.606.750.000	L. 2.773.590.750	23,10
Totali		L. 3.606.750.000	L. 2.773.590.750	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.500.000.000	L. 4.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -800000000
DM 13/09/99	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.700.000.000	L. 3.700.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -26000000
DM 21/07/00	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.674.000.000	L. 3.674.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.673.669.825	L. 3.673.669.825	L. 0	L. 0	- Lit. -330175

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (06/03/00)
Opere Civili	2.600.000.000	2.855.540.750
Opere Impiantistiche	1.150.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.750.000.000	2.855.540.750
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	232.000.000	355.000.000
Altre Spese Tecniche		130.000.000
Allacciamenti	15.000.000	
Imprevisti	82.000.000	47.575.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	375.000.000	285.554.075
IVA al 20%	46.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	750.000.000	818.129.075
TOTALE COSTO	4.500.000.000	3.673.669.825
	Economie	-826.330.175
COPERTURA FINANZIARIA		
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Risorse proprie	4.500.000.000	3.673.669.825
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.500.000.000	3.673.669.825

Protocollo d'intervento: **2848****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI*Comune **CAGLIARI (CA)**Finanziamento **L. 1.740 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.704.557.384**- Tot. Pagato **L. 1.704.557.384**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/02/99* **19/03/99**Fine Lavori *15/10/99* **31/12/99***Auditorium in piazza Dettori***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CAGLIARI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00147990923**Indirizzo **PALAZZO CIVICO - - VIA ROMA, 145****CAGLIARI (CA)**Recapiti **Telefono: 070 6771****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
art. 1 lett. A L. 14/73	IBBA Antonio S.r.l, in A.T.I.S.I.E.L.M. S.n.c. via Piave 11 CAGLIARI	L. 1.714.000.000	L. 1.445.416.200	15,67
Totali		L. 1.714.000.000	L. 1.445.416.200	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

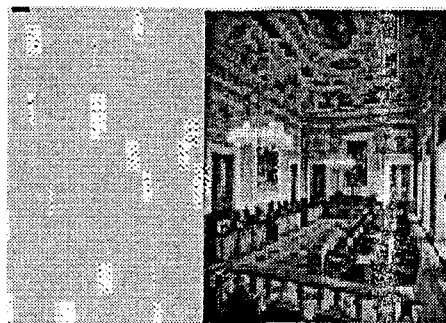
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -260000000
DM 16/11/99	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.740.000.000	L. 1.740.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)
Opere Civili	600.000.000	
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.600.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	150.000.000	
Altre Spese Tecniche	30.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	60.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	160.000.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	400.000.000	0
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.704.557.384
	Economie	-295.442.616
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.704.557.384
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.704.557.384

Protocollo d'intervento: **4910****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI*Comune **CAGLIARI (CA)**Finanziamento **L. 3.105 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.104.617.417**- Tot. Pagato **L. 3.104.617.417**Cofinanziamento **L. 690 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *02/08/99* **25/03/99**Fine Lavori *29/09/99* **26/07/99***Palazzo Viceregio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00510810922**Indirizzo **VIALE CIUSA, 17****CAGLIARI (CA)**Recapiti Telefono: **070 4092721** Telefax: **070 521034****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	impresa SO.DE.CO* via Puccini - Selargius (CA) 01183070927	L. 540.000.000	L. 445.382.000	17,52
Totali		L. 540.000.000	L. 445.382.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
Automatico	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.890.000.000	L. 3.200.000.000	L. 0	L. 690.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.794.617.417	L. 3.104.617.417	L. 0	L. 690.000.000	- Lit. -95382583

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (04/04/00)
Opere Civili	240.000.000	3.254.393.927
Opere Impiantistiche	290.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	540.000.000	
Altre Voci	1.090.000.000	
TOTALE LAVORI	2.160.000.000	3.254.393.927
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		218.400.000
Altre Spese Tecniche	450.000.000	50.266.000
Allacciamenti	10.000.000	
Imprevisti	90.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	70.000.000	
- Altre voci	600.000.000	27.248.000
IVA al 10%		45.538.200
IVA al 20%	510.000.000	49.129.600
SOMME A DISPOSIZIONE	1.730.000.000	390.581.800
TOTALE COSTO	3.890.000.000	3.644.975.727
	Economie	-245.024.273
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.200.000.000	3.104.617.417
Risorse proprie	690.000.000	644.853.500
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.890.000.000	3.749.470.917

Protocollo d'intervento: **4915****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PALAZZO REGIO CENTRO DI COORDINAMENTO GIUBILEO 2000 CAGLIARI CENTRO SERVIZI ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE*

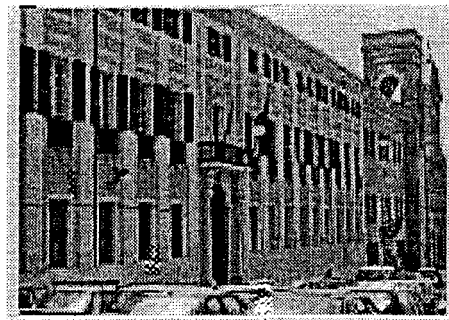
Comune **CAGLIARI (CA)**

Finanziamento **L. 1.394 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.373.704.730**

- Tot. Pagato **L. 1.373.704.730**

Cofinanziamento **L. 610 milioni**

*Palazzo Reale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CAGLIARI**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00510870922**

Indirizzo **VIALE CIUSA** **CAGLIARI ()**

Recapiti **Telefono: 070 4092721** **Telefax: 070 521034**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	ATI: SARDACOSIP S.p.A - A.L.E.S.S S.r.L. v.le Monastir km 5,450 09122 (CA) 00185120920	L. 1.869.000.000	L. 1.558.175.970	16,63
Totali		L. 1.869.000.000	L. 1.558.175.970	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
Automatico	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.436.000.000	L. 1.826.000.000	L. 0	L. 610.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.004.093.567	L. 1.394.093.567	L. 0	L. 610.000.000	- Lit. -431906433

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (13/04/01)
Opere Civili	1.400.000.000	1.558.175.970
Opere Impiantistiche	300.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.700.000.000	1.558.175.970
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	150.000.000	160.600.000
Altre Spese Tecniche	150.000.000	128.800.000
Allacciamenti		
Imprevisti	30.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		700.000
IVA al 10%		155.817.597
IVA al 20%	400.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	730.000.000	445.917.597
TOTALE COSTO	2.430.000.000	2.004.093.567
	Economie	-425.906.433
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.826.000.000	1.394.093.567
Risorse proprie	610.000.000	610.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.436.000.000	2.004.093.567

PAGINA BIANCA
