

SICILIA

Protocollo d'intervento: **616****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE*Comune **MESSINA (ME)**Finanziamento **L. 7.119 milioni**- Tot. Impegnato **L. 7.118.532.000**- Tot. Pagato **L. 7.118.532.000**Cofinanziamento **L. 845 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *15/07/98* **08/09/98**Fine Lavori *30/09/99* **30/12/99***Istituto Don Orione***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **02710380581**Indirizzo **VIA DELLA CAMILLUCCIA, 112****ROMA (RM)**Recapiti **Telefono: 06 35497857 Telefax: 06 35346552****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	A.T.I.-TRAVIA SANTI-ITACO S.P.A. VIA NICOLA FABRIZI 31- MESSINA 00082610833	L. 6.150.000.000	L. 5.086.050.000	17,30
Totali		L. 6.150.000.000	L. 5.086.050.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 06/08/98	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 20/11/98	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 27/01/99	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 09/02/99	L. 8.412.000.000	L. 7.567.000.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 01/06/99	L. 7.213.532.000	L. 6.368.532.000	L. 0	L. 845.000.000	- Lit. -1198468000
DM 05/08/99	L. 8.233.532.000	L. 7.388.532.000	L. 0	L. 845.000.000	+ Lit. 1020000000
DM 13/09/99	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	- Lit. -270000000
DM 16/11/99	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
Automatico	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 21/07/00	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 01/08/00	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 14/12/00	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	
DM 14/02/01	L. 7.963.532.000	L. 7.118.532.000	L. 0	L. 845.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (09/07/01)
Opere Civili	4.100.000.000	
Opere Impiantistiche	1.500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	550.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	6.150.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	527.000.000	
Altre Spese Tecniche	575.000.000	
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	250.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	560.000.000	
IVA al 20%	330.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	2.262.000.000	0
TOTALE COSTO	8.412.000.000	8.174.333.889
	Economie	-237.666.111
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	7.567.000.000	7.329.333.889
Risorse proprie	845.000.000	845.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	8.412.000.000	8.174.333.889

Protocollo d'intervento: **1576****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DI PARTI EDILIZIE DI VECCHIA STRUTTURA GIA' ATTIVA*Comune **MODICA (RG)**Finanziamento **L. 3.514 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.480.703.329**- Tot. Pagato **L. 3.158.932.997**Cofinanziamento **L. 100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/08/98* **10/12/98**Fine Lavori *10/09/99* **02/03/00***Casa di riposo "Boccone del povero"***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGREGAZIONE FEMM. SERVE DEI POVERI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **03905750828**Indirizzo **VIA RE RUGGERO, 2****PALERMO (PA)**Recapiti **Telefono: 091 486288****Telefax: 091 595679****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
licitazione privata	Amaddio Salvatore Via S. Alessandra Km 3 - Rosolini (SR) 00790980898	L. 2.999.269.420	L. 2.893.545.173	3,52
Totali		L. 2.999.269.420	L. 2.893.545.173	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.730.000.000	L. 3.630.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -116000000
DM 13/09/99	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.614.000.000	L. 3.514.000.000	L. 0	L. 100.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/11/01)
Opere Civili	1.962.000.000	
Opere Impiantistiche	1.037.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci	13.000.000	
TOTALE LAVORI	3.042.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	170.500.000	
Altre Spese Tecniche	138.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	13.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	299.900.000	
IVA al 20%	61.600.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	688.000.000	0
TOTALE COSTO	3.730.000.000	3.813.346.357
	Maggiore Spesa	83.346.357
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.630.000.000	3.513.703.329
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		199.643.028
TOTALE COPERTURE	3.730.000.000	3.813.346.357

Protocollo d'intervento: **1873**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>RIQUALIFICAZIONE INGRESSI ALLA CATACOMBA DI S. GIOVANNI E ALLA CRIPTA DI S. MARZIANO</i>	
Comune	SIRACUSA (SR)	
Finanziamento	L. 556 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 530.162.827
	- Tot. Pagato	L. 530.162.827
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	29/01/99	29/01/99
Fine Lavori	27/09/99	27/09/99



Catacomba di S. Giovanni e Cripta di S. Marziano

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	ARCIDIOCESI DI SIRACUSA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	93007980894	
Indirizzo	PIAZZA DUOMO, 5	SIRACUSA (SR)
Recapiti	Telefono: 0931 66571	Telefax: 0931 463776

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Trattativa privata	Assennato Costruzioni Edilizie S.r.l. Via Tevere 11 - Siracusa 0008570890	L. 379.000.000	L. 347.732.500	8,25
Totali		L. 379.000.000	L. 347.732.500	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 509.000.000	L. 509.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 475.000.000	L. 475.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -34000000
DM 13/09/99	L. 475.000.000	L. 475.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 475.000.000	L. 475.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	+ Lit. 80630963
DM 21/07/00	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 555.630.963	L. 555.630.963	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (23/01/01)	
Opere Civili	347.732.500	414.346.121	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	347.732.500	414.346.121	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	36.000.000	31.891.486	
Altre Spese Tecniche	30.000.000	22.360.905	
Allacciamenti	12.000.000	8.372.180	
Imprevisti	12.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	37.173.750	42.074.598	
IVA al 20%		11.117.537	
SOMME A DISPOSIZIONE	127.173.750	115.816.706	
TOTALE COSTO	474.906.250	530.162.827	
	Maggiore Spesa	55.256.577	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	474.905.750	530.162.827	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	474.905.750	530.162.827	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.290.000.000	L. 1.240.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -84069100
DM 01/06/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.205.930.900	L. 1.155.930.900	L. 0	L. 50.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/01/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	220.988.055	220.988.055
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	522.720.309	522.720.309
TOTALE LAVORI	743.708.364	743.708.364
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	144.602.764	144.602.764
Altre Spese Tecniche	15.623.072	15.623.072
Allacciamenti		
Imprevisti	131.894	131.894
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	114.000.000	114.000.000
- Altre voci	50.761.263	50.761.263
IVA al 10%	85.770.836	85.770.836
IVA al 20%	41.681.901	41.681.901
SOMME A DISPOSIZIONE	452.571.730	452.571.730
TOTALE COSTO	1.196.280.094	1.196.280.094
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.146.280.094	1.146.280.094
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.196.280.094	1.196.280.094

Protocollo d'intervento: **1960****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S. VENERANDA*Comune **MAZARA DEL VALLO (TP)**Finanziamento **L. 1.728 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.727.825.388**- Tot. Pagato **L. 1.696.613.388**Cofinanziamento **L. 50 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/03/99 31/03/99**Fine Lavori **20/09/99 03/11/99***Ex Convento di S. Veneranda***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91003120812**Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA 6****MAZARA DEL VALLO
(TP)**Recapiti **Telefono: 0923 941108****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA SCIACCA NICOLÒ VAI SIRACUSA, 8/A - MAZARA DEL VALLO 00609220819	L. 1.100.000.000	L. 1.081.300.000	1,70
Totali		L. 1.100.000.000	L. 1.081.300.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

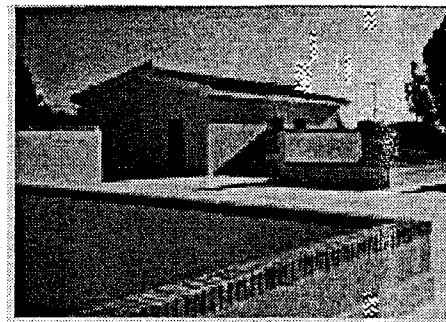
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 1.750.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -19000000
DM 16/11/99	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.781.000.000	L. 1.731.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.777.825.388	L. 1.727.825.388	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -3174612

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/07/00)
Opere Civili	1.081.300.000	1.106.282.353
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.081.300.000	1.106.282.353
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	175.540.000	175.540.000
Altre Spese Tecniche	103.069.000	103.069.000
Allacciamenti		
Imprevisti	25.036.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	180.000.000	177.840.000
- Altre voci	25.800.000	25.800.000
IVA al 10%	128.633.600	128.412.288
IVA al 20%	60.881.800	60.881.800
SOMME A DISPOSIZIONE	698.960.400	671.543.088
TOTALE COSTO	1.780.260.400	1.777.825.441
	Economie	-2.434.959
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.550.260.400	1.727.825.388
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie	180.000.000	
TOTALE COPERTURE	1.780.260.400	1.777.825.388

Protocollo d'intervento: **2011****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA*Comune **SIRACUSA (SR)**Finanziamento **L. 345 milioni**- Tot. Impegnato **L. 344.811.395**- Tot. Pagato **L. 344.811.389**Cofinanziamento **L. 45 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *12/07/99* **14/12/98**Fine Lavori *31/07/99* **24/09/99***Casa Nostra Signora del Cenacolo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ARCIDIOCESI DI SIRACUSA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **93007980894**Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 5****SIRACUSA (SR)**Recapiti **Telefono: 0931 66571****Telefax: 0931 463776****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CO.EDIL. RESTAURI S.R.L. VIA BOSCO DI SOPRA,1 CANICATTI' BAGNI (SR) 01156250894	L. 378.013.024	L. 309.025.647	18,25
Totali		L. 378.013.024	L. 309.025.647	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 06/08/98	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 20/11/98	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 27/01/99	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 09/02/99	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 01/06/99	L. 466.000.000	L. 421.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 05/08/99	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	- Lit. -76000000
DM 13/09/99	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 16/11/99	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
Automatico	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 21/07/00	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 01/08/00	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 14/12/00	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	
DM 14/02/01	L. 390.000.000	L. 345.000.000	L. 0	L. 45.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/05/01)
Opere Civili	335.000.000	308.919.450
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	335.000.000	308.919.450
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	25.000.000	25.000.000
Altre Spese Tecniche	25.000.000	25.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	17.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	26.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	38.000.000	30.891.945
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	131.000.000	80.891.945
TOTALE COSTO	466.000.000	389.811.395
	Economie	-76.188.605
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	421.000.000	344.811.395
Risorse proprie	45.000.000	45.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	466.000.000	389.811.395

Protocollo d'intervento: **2163****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZ. E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA VILLA S. BARTOLOMEO*
 Comune **CALTAGIRONE (CT)**
 Finanziamento **L. 790 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 790.287.183**
 - Tot. Pagato **L. 790.287.183**
 Cofinanziamento **L. 100 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori *01/10/98* **24/09/98**
 Fine Lavori *30/07/99* **31/12/99**

*Villa S. Bartolomeo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SEMINARIO VESCOVILE**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **82000470870**
 Indirizzo **PIAZZA S. FRANCESCO D'ASSISI, 9** **CALTAGIRONE (CT)**
 Recapiti **Telefono: 0933 31654** **Telefax: 0933 21070**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
trattativa privata	Impresa Zapparrata Giuseppe Via Ragusa 29 - Scordia 00479440877	L. 801.100.000	L. 559.880.779	30,11
Totali		L. 801.100.000	L. 559.880.779	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.160.000.000	L. 1.060.000.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 870.291.900	L. 770.291.900	L. 0	L. 100.000.000	- Lit. -289708100
DM 01/06/99	L. 870.291.900	L. 770.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 05/08/99	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 20000000
DM 13/09/99	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 890.291.900	L. 790.291.900	L. 0	L. 100.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)
Opere Civili	646.000.000	
Opere Impiantistiche	155.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	123.994.390
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	901.000.000	123.994.390
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	120.000.000	119.829.000
Altre Spese Tecniche	4.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	35.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		642.659.406
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		5.590.000
IVA al 10%	100.000.000	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	259.000.000	768.078.406
TOTALE COSTO	1.160.000.000	892.072.796
	Economie	-267.927.204
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.060.000.000	790.284.183
Risorse proprie	100.000.000	100.000.000
Altre fonti finanziarie		1.788.613
TOTALE COPERTURE	1.160.000.000	892.072.796

Protocollo d'intervento: **2181****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RECUPERO E CONSERVAZIONE DELL' EX ORFANOTROFIO DON ORIONE DELLA PINETA E DEGLI SPAZI ANNESSI AL FINE DI REALIZZARE UN OSTELLO ED UN CAMPING STAGIONALE</i>	
Comune	NOTO (SR)	
Finanziamento	L. 2.075 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.983.593.615
	- Tot. Pagato	L. 1.983.593.614
Cofinanziamento	L. 25 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>15/09/98</i>	10/12/98
Fine Lavori	<i>10/08/99</i>	14/01/00

*Ex orfanotrofio Don Orione***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	DIOCESI DI NOTO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	92001090891	
Indirizzo	VIA MONS. G.BLANDINI, 6	NOTO (SR)
Recapiti	Telefono: 0931 835286	Telefax: 0931 573310

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	IMPRESA EDILE PUCCIA VINCENZO- LASAGNA-AGOSTA VIAPOIDOMANI,13 MODICA 00751370883	L. 1.597.478.653	L. 1.277.982.923	20,00
	Totali	L. 1.597.478.653	L. 1.277.982.923	
