

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 879.000.000	L. 829.000.000	L. 0	L. 50.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/02/00)	
Opere Civili	440.000.000	438.240.000	
Opere Impiantistiche	164.500.000	163.842.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	10.084.800	
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>634.500.000</b>	<b>612.166.800</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	43.900.000	43.900.000	
Altre Spese Tecniche	84.000.000	84.000.000	
Allacciamenti	2.000.000		
Imprevisti	21.460.000	75.031.846	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	61.600.000	67.711.385	
IVA al 20%	31.580.000	27.596.960	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>244.540.000</b>	<b>298.240.191</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>879.040.000</b>	<b>910.406.991</b>	
	<b>Maggiore Spesa</b>	<b>31.366.991</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	829.000.000	825.230.200	
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000	
Altre fonti finanziarie		35.176.791	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>879.000.000</b>	<b>910.406.991</b>	

Protocollo d'intervento: **3510****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO LOCALI NEL COMPLESSO DEL CARMINE PER OSTELLO*

Comune **FIRENZE (FI)**

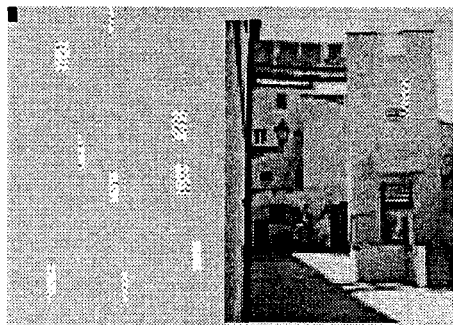
Finanziamento **L. 1.833 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.833.249.718**

- Tot. Pagato **L. 1.833.249.718**

Cofinanziamento **L. 397 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/01/99	01/03/99
Fine Lavori	30/09/99	10/12/99

*Complesso del Carmine***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **01307110484**

Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1** **FIRENZE (FI)**

Recapiti **Telefono: 055 27681** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
licitazione privata	DITTA COSIMO PANCANI SPA VIA UGO LAMALFA 6 SIGNA FIRENZE 00436690481	L. 2.270.000.000	L. 1.891.136.988	16,69
<b>Totali</b>		<b>L. 2.270.000.000</b>	<b>L. 1.891.136.988</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
Automatico	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.647.000.000	L. 2.250.000.000	L. 0	L. 397.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.230.249.718	L. 1.833.249.718	L. 0	L. 397.000.000	- Lit. -416750282

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/11/00)
Opere Civili	1.600.000.000	2.079.583.421
Opere Impiantistiche	670.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.270.000.000</b>	<b>2.079.583.421</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	75.000.000	149.999.018
Altre Spese Tecniche	50.000.000	22.700.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	227.000.000	
IVA al 20%	25.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>377.000.000</b>	<b>172.699.018</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.647.000.000</b>	<b>2.252.282.439</b>
	<b>Economie</b>	<b>-394.717.561</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.250.000.000	1.833.249.718
Risorse proprie	397.000.000	419.032.721
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.647.000.000</b>	<b>2.252.282.439</b>

Protocollo d'intervento: **3711****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PERCORSI TURISTICI E RELIGIOSI NEL TERRITORIO DI ABBADIA SAN SALVATORE</i>	
Comune	<b>ABBADIA SAN SALVATORE (SI)</b>	
Finanziamento	<b>L. 132 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 130.767.480</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 130.767.480</b>
Cofinanziamento	<b>L. 0 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<b>20/04/98</b>	<b>25/07/99</b>
Fine Lavori	<b>30/08/99</b>	<b>10/12/99</b>

*Territorio di Abbadia S. Salvatore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>CONGR. IT. ORDINE CISTERCENSE</b>	
Categoria	<b>AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>80059490583</b>	
Indirizzo	<b>PIAZZA SANTA CROCE IN GERUSALEMME, 12</b>	<b>ROMA (RM)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 06 7014779</b>	<b>Telefax: 06 7029287</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/06/01)	
Opere Civili	40.000.000		
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	78.174.900	
Altre Voci	20.000.000	25.800.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>100.000.000</b>		<b>103.974.900</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	10.000.000	5.000.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	22.000.000	21.794.980	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>32.000.000</b>		<b>26.794.980</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>132.000.000</b>		<b>130.769.880</b>
		Economie	-1.230.120
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	132.000.000		130.767.480
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>132.000.000</b>		<b>130.767.480</b>

Protocollo d'intervento: **3725****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO DELL'EX ISTITUTO LA MADONNINA MONTENERO*Comune **LIVORNO (LI)**Finanziamento **L. 841 milioni**- Tot. Impegnato **L. 840.857.143**- Tot. Pagato **L. 840.857.143**Cofinanziamento **L. 1.130 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **20/05/98** **25/05/98**Fine Lavori **01/10/99***Ex "Istituto la Madonna" - Montenero***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGR. FIGLIE POVERE S.GIUSEPPE CALASANZIO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **01339010488**Indirizzo **VIA FAENZA, 62****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 217224****Telefax: 055 247224****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
INCARICO FIDUCIARIO	GEOM EDILIO BINI COSTRUZIONI EDILI VIA DI FRANCO, 9 (LI) 00110630498	L. 2.030.000.000	L. 2.030.400.000	-0,02
<b>Totali</b>		<b>L. 2.030.000.000</b>	<b>L. 2.030.400.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
Automatico	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.030.000.000	L. 900.000.000	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.970.857.143	L. 840.857.143	L. 565.000.000	L. 565.000.000	Lit. -59142857
DM 14/12/00	L. 1.970.857.143	L. 840.857.143	L. 565.000.000	L. 565.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.970.857.143	L. 840.857.143	L. 565.000.000	L. 565.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/07/01)	
Opere Civili	1.000.000.000	1.000.000.000	
Opere Impiantistiche	400.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000		
Altre Voci	100.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.600.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	120.000.000	120.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	410.000.000	
Allacciamenti	4.000.000	4.000.000	
Imprevisti	100.000.000	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		100.000.000	
- Altre voci		100.000.000	
IVA al 10%	140.000.000	150.400.000	
IVA al 20%	56.000.000	46.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>430.000.000</b>		<b>1.030.400.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.030.000.000</b>		<b>2.030.400.000</b>
	Maggiore Spesa		400.000
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	900.000.000		840.857.143
Risorse proprie	1.130.000.000		1.189.542.857
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.030.000.000</b>		<b>2.030.400.000</b>

Protocollo d'intervento: **3771****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *POTENZIAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI*  
**Comune** **FIRENZE (FI)**  
**Finanziamento** **L. 884 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 832.875.567**  
 - Tot. Pagato **L. 832.875.567**  
**Cofinanziamento** **L. 110 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
**Inizio Lavori**                    *01/04/99*                    *24/03/99*  
**Fine Lavori**                      *28/09/99*                    *23/12/99*

*Impianti di illuminazione pubblica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** COMUNE DI FIRENZE  
**Categoria** AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)  
**C.Fis./P.IVA** 01307110484  
**Indirizzo** PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1 FIRENZE (FI)  
**Recapiti** Telefono: 055 27681 Telefax:

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO A DITTA CONCESSIONARIA	SILFI SPA VIA DELLA ROBBIA 47 FIRENZE 03576790483	L. 691.825.800	L. 691.825.800	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 691.825.800</b>	<b>L. 691.825.800</b>	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 06/08/98	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 20/11/98	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 27/01/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 09/02/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 01/06/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 05/08/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 13/09/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 16/11/99	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
Automatico	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 21/07/00	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 01/08/00	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 14/12/00	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	
DM 14/02/01	L. 994.000.000	L. 884.000.000	L. 57.000.000	L. 53.000.000	

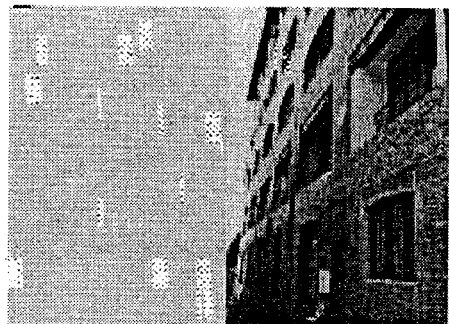
## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/04/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	693.000.000	693.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>693.000.000</b>	<b>693.000.000</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	47.000.000	47.000.000
Altre Spese Tecniche	8.000.000	8.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti	33.000.000	33.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	37.000.000	37.000.000
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	166.000.000	166.000.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>301.000.000</b>	<b>301.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>994.000.000</b>	<b>994.000.000</b>
		0
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	884.000.000	832.875.567
Risorse proprie	110.000.000	110.000.000
Altre fonti finanziarie		57.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>994.000.000</b>	<b>999.875.567</b>

Protocollo d'intervento: **3885**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *STRUTTURA RICETTIVA EXTRA ALBERGHIERA CASA PER FERIE*  
 Comune **SIENA (SI)**  
 Finanziamento **L. 824 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 813.264.592**  
 - Tot. Pagato **L. 813.264.592**  
 Cofinanziamento **L. 240 milioni**  
 Previsione Effettiva  
 Inizio Lavori **30/12/98 02/11/98**  
 Fine Lavori **10/09/99 28/12/99**

*Cittadella Cateriniana*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI SIENA**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **00507750529**  
 Indirizzo **VIA MONTARIOSO, 35** **MONTERIGGIONI (SI)**  
 Recapiti **Telefono: 0577 587083** **Telefax: 0577 587088**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO DIRETTO	CHIANTINI ALFIO VIA DOCCIA 18 SIENA 00274640523	L. 200.000.000	L. 195.200.000	2,40
TRATTATIVA PRIVATA AD INVITO	PETRI SRL VIA DI CITTA' 15 SIENA 00803730522	L. 585.000.000	L. 562.770.000	3,80
Totali		L. 785.000.000	L. 757.970.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.086.000.000	L. 846.000.000	L. 220.000.000	L. 20.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	- Lit. -22230000
DM 01/06/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
Automatico	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.063.770.000	L. 823.770.000	L. 0	L. 240.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (10/02/01)	
Opere Civili	452.000.000	600.645.318	
Opere Impiantistiche	133.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>785.000.000</b>	<b>600.645.318</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	90.260.000	143.317.229	
Altre Spese Tecniche	48.480.000	195.200.000	
Allacciamenti	6.000.000	5.800.000	
Imprevisti	39.250.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato	120.000		
- Opere Civili	1.190.000		
- Opere Impiantistiche	550.000		
- Arredi e/o attrezzature	920.000		
- Altre voci	1.920.000		
IVA al 10%	82.430.000		
IVA al 20%	29.880.000	108.302.045	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>301.000.000</b>	<b>452.619.274</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.086.000.000</b>	<b>1.053.264.592</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-32.735.408</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	846.000.000	813.264.592	
Risorse proprie	240.000.000	240.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.086.000.000</b>	<b>1.053.264.592</b>	

Protocollo d'intervento: **4111****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *AMMODERNAMENTO DELLA CASA PER FERIE POSTA ALL'INTERNO DEL SANTUARIO DELLA VERNA*  
 Comune **CHIUSI DELLA VERNA (AR)**  
 Finanziamento **L. 715 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 610.000.000**  
     - Tot. Pagato **L. 549.000.000**  
 Cofinanziamento **L. 400 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori                      *01/09/98*                      **02/11/98**  
 Fine Lavori                         *01/09/99*                      **29/12/99**

*Santuario della Verna***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. TOSCANA FRATI MINORI S.FRANCESCO**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **01306860485**  
 Indirizzo **VIA A. GIACOMINI, 3** **FIRENZE (FI)**  
 Recapiti **Telefono: 055 572713** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	DITTA M.B.F. EDILIZIA S.P.A.  VIA MOLINARA,33 AREZZO 00343100517	L. 790.048.261	L. 736.324.980	6,80
Totali		L. 790.048.261	L. 736.324.980	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

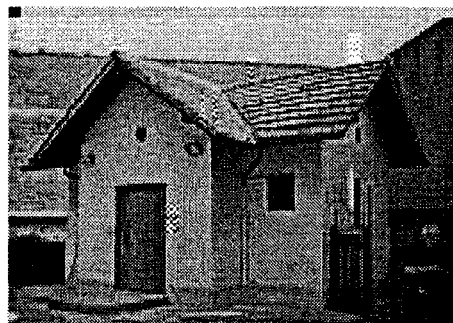
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.177.000.000	L. 777.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -62000000
DM 05/08/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.115.000.000	L. 715.000.000	L. 0	L. 400.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (22/09/00)
Opere Civili	581.800.742	542.238.292
Opere Impiantistiche	208.247.519	194.086.688
Arredi e/o Attrezzature	105.000.000	105.000.000
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>895.048.261</b>	<b>841.324.980</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	99.267.974	99.267.974
Altre Spese Tecniche	8.575.000	8.575.164
Allacciamenti		
Imprevisti	49.946.911	47.042.519
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.720.931	
- Opere Impiantistiche	435.931	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.156.862
IVA al 10%	79.004.827	73.632.500
IVA al 20%	43.000.001	43.000.001
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>281.951.575</b>	<b>273.675.020</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.176.999.836</b>	<b>1.115.000.000</b>
	<b>Economie</b>	<b>-61.999.836</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	777.000.000	715.000.000
Risorse proprie	400.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.177.000.000</b>	<b>1.115.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **4196****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SERVIZI IGIENICI PUBBLICI*  
 Comune **FIRENZE (FI)**  
 Finanziamento **L. 1.272 milioni**  
   - Tot. Impegnato **L. 1.147.178.236**  
   - Tot. Pagato **L. 1.147.178.246**  
 Cofinanziamento **L. 172 milioni**  
   Previsione            Effettiva  
 Inizio Lavori        *06/08/99*        *10/06/99*  
 Fine Lavori         *15/09/99*        *31/12/99*

*Servizi igienici pubblici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **01307110484**  
 Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1** **FIRENZE (FI)**  
 Recapiti **Telefono: 055 27681** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EDILIZIA BALDINI GEOM.BORIS SNC VIA ALESSANDRO D'ANCONA 53 FIRENZE 01652620483	L. 158.100.000	L. 150.282.300	4,94
LICITAZIONE PRIVATA	EDILIZIA SAN GIORGIO VIA EINAUDI 11 FIGLINE VALDARNO FI 04883450480	L. 218.130.000	L. 196.854.960	9,75
LICITAZIONE PRIVATA	F.LLI RAGIONIERI SRL VIA VINEGIA 7 FIRENZE 00391510484	L. 784.600.000	L. 710.880.250	9,40
<b>Totali</b>		<b>L. 1.160.830.000</b>	<b>L. 1.058.017.510</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

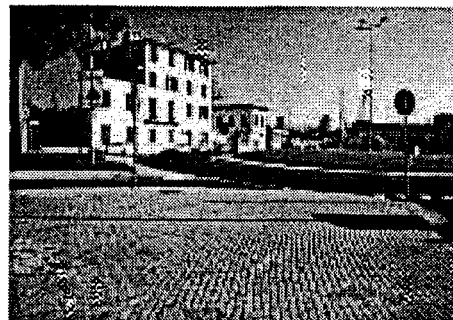
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.567.000.000	L. 1.395.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
Automatico	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	- Lit. -123000000
DM 21/07/00	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.444.000.000	L. 1.272.000.000	L. 0	L. 172.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili	600.000.000	1.048.645.672
Opere Impiantistiche	409.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.109.000.000</b>	<b>1.048.645.672</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	70.000.000	20.317.440
Altre Spese Tecniche	50.000.000	10.486.000
Allacciamenti	15.000.000	30.000.000
Imprevisti	62.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	261.200.000	209.729.134
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>458.200.000</b>	<b>270.532.574</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.567.200.000</b>	<b>1.319.178.246</b>
	<b>Economie</b>	<b>-248.021.754</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.395.000.000	1.147.178.246
Risorse proprie	172.000.000	172.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.567.000.000</b>	<b>1.319.178.246</b>

Protocollo d'intervento: **4198****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>AREA ATTREZZATA DI ACCOGLIENZA E SMISTAMENTO BUS TURISTICI A FIRENZE CASTELLO</i>	
Comune	<b>FIRENZE (FI)</b>	
Finanziamento	L. 1.122 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.122.063.771
	- Tot. Pagato	L. 1.122.063.771
Cofinanziamento	L. 219 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/03/99	08/03/99
Fine Lavori	31/08/99	14/09/99

*Area per bus turistici a Firenze Castello***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI FIRENZE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01307110484	
Indirizzo	PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1	FIRENZE (FI)
Recapiti	Telefono: 055 27681	Telefax:

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione privata	Grazzini Cav. Fortunato s. p. a. P.zza Ferrucci, 4 Firenze 01507260485	L. 957.557.280	L. 853.044.115	10,91
Totali		L. 957.557.280	L. 853.044.115	
