

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
Automatico	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.460.000.000	L. 1.241.000.000	L. 0	L. 219.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.341.063.771	L. 1.122.063.771	L. 0	L. 219.000.000	- Lit. -118936229

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/08/00)	
Opere Civili	670.000.000	853.044.000	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	128.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>798.000.000</b>	<b>853.044.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	38.000.000	90.448.000	
Altre Spese Tecniche	52.000.000	12.623.000	
Allacciamenti	5.000.000	4.545.000	
Imprevisti		13.700.000	
- Espropri o Acquisizioni	380.000.000	263.300.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	67.000.000	84.872.000	
IVA al 20%	120.000.000	22.196.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>662.000.000</b>	<b>491.684.000</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>1.344.728.000</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-115.272.000</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	1.241.000.000	1.122.063.771	
Risorse proprie	219.000.000	219.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.460.000.000</b>	<b>1.341.063.771</b>	

Protocollo d'intervento: **4298****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO CON RIORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DEI VISITATORI DELLA CITTA'</i>	
Comune	<b>SAN GIMIGNANO (SI)</b>	
Finanziamento	<b>L. 2.711 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 2.627.990.089</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 2.627.990.089</b>
Cofinanziamento	<b>L. 500 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/12/98	16/12/98
Fine Lavori	31/08/99	13/12/99

*Viabilità e servizi a supporto dei visitatori***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI SAN GIMIGNANO	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00102500527	
Indirizzo	PIAZZA DEL DUOMO, 2	SAN GIMIGNANO (SI)
Recapiti	Telefono: 0577 940340	Telefax: 0577 940112

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	GEOBETON SRL LOC. GANGUZZA CZ 01212540791	L. 390.000.000	L. 305.136.000	21,76
PUBBLICO INCANTO	ACE SRL VIALE BARDANZELLU 110 ROMA 00475670584	L. 615.000.000	L. 507.830.100	17,43
PUBBLICO INCANTO	GRANCHI RODOLFO SRL LOCALITA' PONTE DI FERRO 296 POMARANCE PISA 01248990507	L. 2.090.000.000	L. 1.564.992.000	25,12
<b>Totali</b>		<b>L. 3.095.000.000</b>	<b>L. 2.377.958.100</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.000.000.000	L. 3.500.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.211.253.910	L. 2.711.253.910	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -788746090

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/07/01)
Opere Civili	2.141.000.000	
Opere Impiantistiche	735.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	230.000.000	
Altre Voci		2.717.452.632
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.106.000.000</b>	<b>2.717.452.632</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	115.000.000	182.653.687
Altre Spese Tecniche	50.000.000	2.545.000
Allacciamenti	10.000.000	46.148.370
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	250.000.000	121.606.920
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	288.000.000	57.583.480
IVA al 20%	81.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>894.000.000</b>	<b>410.537.457</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.127.990.089</b>
	<b>Economie</b>	<b>-872.009.911</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.500.000.000	2.627.990.089
Risorse proprie	500.000.000	500.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>3.127.990.089</b>

Protocollo d'intervento: **4531****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DEL LOGGIATO DEI PELLEGRINI*Comune **IMPRUNETA (FI)**Finanziamento **L. 160 milioni**- Tot. Impegnato **L. 159.285.998**- Tot. Pagato **L. 159.285.998**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/09/99* **30/09/99**Fine Lavori *10/10/99* **29/12/99***Loggiato dei pellegrini***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI IMPRUNETA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **8001143087**Indirizzo **P.ZZA BUONDELMONTI, 41****IMPRUNETA (FI)**Recapiti **Telefono: 055 2313800****Telefax: 055 2313714****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	SICOS SRL VIA BRUNO BUOZZI 5 FIRENZE 0306775048	L. 367.495.161	L. 307.556.700	16,31
<b>Totali</b>		<b>L. 367.495.161</b>	<b>L. 307.556.700</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
Automatico	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 450.000.000	L. 200.000.000	L. 200.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 459.519.944	L. 159.519.944	L. 200.000.000	L. 100.000.000	+ Lit. 9519944


## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/06/01)
Opere Civili	250.000.000	
Opere Impiantistiche	50.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		371.473.566
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>300.000.000</b>	<b>371.473.566</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	33.000.000	
Altre Spese Tecniche	42.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	30.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		87.812.432
IVA al 10%		
IVA al 20%	45.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>150.000.000</b>	<b>87.812.432</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>450.000.000</b>	<b>459.285.998</b>
	Maggiore Spesa	9.285.998
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	150.017.693
Risorse proprie	250.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		9.268.305
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>450.000.000</b>	<b>459.285.998</b>

Protocollo d'intervento: **4559**

### DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMA INFORMATICO SULLO STATO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA CITTA'*  
 Comune **FIRENZE (FI)**  
 Finanziamento **L. 232 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 231.766.800**  
 - Tot. Pagato **L. 231.766.800**  
 Cofinanziamento **L. 33 milioni**  
 Previsione Effettiva  
 Inizio Lavori *01/02/99* *17/02/99*  
 Fine Lavori *15/09/99* *16/11/99*

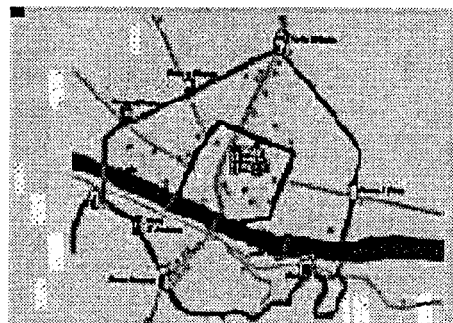

*Sistema informatico sullo stato d'accessibilità della città*

### DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI FIRENZE**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **01307110484**  
 Indirizzo **PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1** **FIRENZE (FI)**  
 Recapiti **Telefono: 055 27681** **Telefax:**

### DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA UFFICIOSA AD OFFERTA SEGRETA	INTELCO SRL VIA G.PAPINI 28/A FIRENZE 03158680482	L. 75.000.000	L. 71.925.000	4,10
Totali		L. 75.000.000	L. 71.925.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 267.000.000	L. 0	L. 33.000.000	
DM 14/02/01	L. 264.802.000	L. 231.802.000	L. 0	L. 33.000.000	- Lit. -35198000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/11/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche	18.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	85.000.000	71.925.000	
Altre Voci	180.000.000		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>283.000.000</b>		<b>71.925.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche	1.000.000		
Allacciamenti	80.000		
Imprevisti	1.600.000		
- Espropri o Acquisizioni		155.200.000	
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	2.800.000		
IVA al 10%	11.520.000	5.981.000	
IVA al 20%		31.660.800	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>17.000.000</b>		<b>192.841.800</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>300.000.000</b>		<b>264.766.800</b>
	Economie		-35.233.200
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	267.000.000		231.766.800
Risorse proprie	33.000.000		33.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>300.000.000</b>		<b>264.766.800</b>

Protocollo d'intervento: **4609****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA DI ACCOGLIENZA VILLA PIERAGNOLI*Comune **FIRENZE (FI)**Finanziamento **L. 2.150 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.123.617.983**- Tot. Pagato **L. 2.123.617.983**Cofinanziamento **L. 220 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **25/07/98 02/10/98**Fine Lavori **25/05/99 30/09/99***Villa Pieragnoli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ENTE ARCIDIOCESI DI FIRENZE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **94019430480**Indirizzo **PIAZZA SAN GIOVANNI, 3****FIRENZE (FI)**Recapiti **Telefono: 055 271071****Telefax: 055 2710741****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
trattativa privata	Romano Scarpettini e C. s. n. c. Via del Pozzino, 47 Firenze 03677030482	L. 1.600.000.000	L. 1.504.000.000	6,00
<b>Totali</b>		<b>L. 1.600.000.000</b>	<b>L. 1.504.000.000</b>	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.366.000.000	L. 2.146.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	- Lit. -96000000
DM 01/06/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
Automatico	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.270.000.000	L. 2.050.000.000	L. 0	L. 220.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.370.000.000	L. 2.150.000.000	L. 0	L. 220.000.000	+ Lit. 100000000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/06/01)	
Opere Civili	1.100.000.000	1.645.000.000	
Opere Impiantistiche	500.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.750.000.000</b>		<b>1.645.000.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	90.000.000		
Altre Spese Tecniche	80.000.000	160.000.000	
Allacciamenti	50.000.000	52.500.000	
Imprevisti	152.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		150.948.319	
- Altre voci		149.803.400	
IVA al 10%	180.000.000	169.750.000	
IVA al 20%	64.000.000	30.189.760	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>616.000.000</b>		<b>713.191.479</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.366.000.000</b>		<b>2.358.191.479</b>
		<b>Economie</b>	<b>-7.808.521</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.146.000.000		2.123.617.983
Risorse proprie	220.000.000		220.000.000
Altre fonti finanziarie			14.573.496
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.366.000.000</b>		<b>2.358.191.479</b>

Protocollo d'intervento: **4610****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>IL GIUBILEO INTERPELLA LE CHIESE E LE GENTI TUTTE DELLA TOSCANA ALL'OSPITALITA' E ALL'ACCOGLIENZA DEL PELLEGRINO - ATTIVITA' DI FORMAZIONE</i>	
Comune	<b>FIRENZE (FI)</b>	
Finanziamento	<b>L. 1.120 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 1.524.485.907</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 1.524.485.907</b>
Cofinanziamento	<b>L. 480 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/03/99</i>	<b>30/11/98</b>
Fine Lavori	<i>29/05/99</i>	<b>31/12/99</b>

*Attività di formazione***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA</b>	
Categoria	<b>AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>PVLSVN24B21B036M</b>	
Indirizzo	<b>VIALE MATTEOTTI, 8</b>	<b>FIRENZE (FI)</b>
Recapiti	<b>Telefono: 055 580446</b>	<b>Telefax:</b>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
Automatico	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.600.000.000	L. 1.120.000.000	L. 0	L. 480.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/02/00)
Opere Civili		1.023.524.670
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	1.120.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.120.000.000</b>	<b>1.023.524.670</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	380.000.000	380.755.346
IVA al 10%		5.622.426
IVA al 20%		114.583.465
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>480.000.000</b>	<b>500.961.237</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>1.524.485.907</b>
	Economie	-75.514.093
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.120.000.000	1.040.000.000
Risorse proprie	480.000.000	480.000.000
Altre fonti finanziarie		4.485.907
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>1.524.485.907</b>

Protocollo d'intervento: **4707****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *IL FULIGNO RITORNA ALLA CITTA' - RECUPERO DELLA CHIESA E DEI LOCALI ANNESSI*  
 Comune **FIRENZE (FI)**  
 Finanziamento **L. 2.397 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 2.354.111.200**  
     - Tot. Pagato **L. 2.354.111.200**  
 Cofinanziamento **L. 200 milioni**  
     Previsione **Effettiva**  
 Inizio Lavori **30/10/98 27/10/98**  
 Fine Lavori **15/07/99 30/12/99**



*Educatore della SS. Concezione detto "Il Fuligno"*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **I. P. A. B. EDUC. SS. CONCEZIONE**  
 Categoria **AB Enti pubblici**  
 C.Fis./P.IVA **80013770484**  
 Indirizzo **VIA FAENZA, 48 FIRENZE (FI)**  
 Recapiti **Telefono: 210232 Telefax: 210232**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Licitazione Privata	Consorzio cooperative Costruzioni Via della cooperazione, 30 Bologna 00281620377	L. 2.100.000.000	L. 1.765.680.000	15,92
Totali		L. 2.100.000.000	L. 1.765.680.000	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.960.000.000	L. 2.760.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	- Lit. -363472000
DM 05/08/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.596.528.000	L. 2.396.528.000	L. 0	L. 200.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/10/01)
Opere Civili	1.500.000.000	2.062.482.400
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>2.062.482.400</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	122.000.000	222.800.000
Altre Spese Tecniche	78.000.000	
Allacciamenti	30.000.000	
Imprevisti	220.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		268.828.800
IVA al 10%	185.000.000	
IVA al 20%	125.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>760.000.000</b>	<b>491.628.800</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.960.000.000</b>	<b>2.554.111.200</b>
	<b>Economie</b>	<b>-405.888.800</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.760.000.000	2.354.111.200
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.960.000.000</b>	<b>2.554.111.200</b>

Protocollo d'intervento: **4740****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ADEGUAMENTO PARCHEGGIO E SISTEMAZIONE VIA RISORGIMENTO VIA PRADO E VIA BIBOLOTTI</i>	
Comune	<b>MASSA (MS)</b>	
Finanziamento	<b>L. 105 milioni</b>	
	- Tot. Impegnato	<b>L. 104.571.347</b>
	- Tot. Pagato	<b>L. 104.571.347</b>
Cofinanziamento	<b>L. 360 milioni</b>	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>24/05/98</i>	<b>15/06/98</b>
Fine Lavori	<i>24/10/98</i>	<b>30/04/99</b>

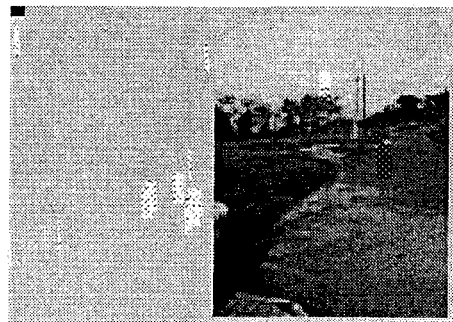*Viabilità comunale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	<b>COMUNE DI MASSA</b>	
Categoria	<b>AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)</b>	
C.Fis./P.IVA	<b>00181760455</b>	
Indirizzo	<b>VIA PORTA FABBRICA</b>	<b>MASSA (MS)</b>
Recapiti	Telefono: <b>0585 4901</b>	Telefax: <b>0585 41245</b>

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
gara ufficiosa	DITTA FRATELLI D'ADDETTA VIA PELIZZARI, 7 BERCETO PR 00335880340	L. 440.000.000	L. 357.808.000	18,68
LICITAZIONE PRIVATA	DITTA CEMENBIT SRL VIA AURELIA KM. 373 PIETRASANTA 01229510464	L. 450.000.000	L. 352.440.000	21,68
<b>Totale</b>		<b>L. 890.000.000</b>	<b>L. 710.248.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
Automatico	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/02/01	L. 465.245.600	L. 105.245.600	L. 0	L. 360.000.000	Lit. -134754400

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)
Opere Civili	530.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		416.883.042
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>530.000.000</b>	<b>416.883.042</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	6.000.000	6.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	11.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	53.000.000	41.688.305
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>70.000.000</b>	<b>47.688.305</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>600.000.000</b>	<b>464.571.347</b>
	Economie	-135.428.653
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	240.000.000	104.571.347
Risorse proprie	360.000.000	360.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>600.000.000</b>	<b>464.571.347</b>

Protocollo d'intervento: **4756****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTO STRUTTURE PER ACCOGLIENZA SOSTA E RISTORO PELLEGRINI*Comune **SIENA (SI)**Finanziamento **L. 160 milioni**- Tot. Impegnato **L. 160.444.948**- Tot. Pagato **L. 160.444.948**Cofinanziamento **L. 30 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/12/98 25/11/98**Fine Lavori **10/09/99 25/10/99***Complesso del Costone***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80010540526**Indirizzo **PIAZZA S. GIOVANNI****SIENA (SI)**Recapiti **Telefono: 0577 288487****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	F.TA.LA INOX VIA LIGURIA 2/R MONTERONI D'ARBIA SI	L. 25.277.150	L. 25.150.765	0,50
TRATTATIVA PRIVATA AD INVITO	BELLINI MARIO E FIGLI SRL STRADA MASSETANA ROMANA 54 SIENA 00736850520	L. 130.638.489	L. 125.021.034	4,30
<b>Totali</b>		<b>L. 155.915.639</b>	<b>L. 150.171.799</b>	
