

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.500.000.000	L. 1.335.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	- Lit. -152000000
Automatico	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.348.000.000	L. 1.183.000.000	L. 0	L. 165.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/02/01)	
Opere Civili		1.023.196.829	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	920.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	920.000.000		1.023.196.829
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	125.000.000	27.840.000	
Altre Spese Tecniche	65.000.000	9.081.000	
Allacciamenti	30.000.000		
Imprevisti	60.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	50.000.000		
IVA al 10%			
IVA al 20%	250.000.000	250.680.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	580.000.000		287.601.000
TOTALE COSTO	1.500.000.000		1.310.797.829
	Economie		-189.202.171
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.335.000.000		1.145.797.829
Risorse proprie	165.000.000		165.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.500.000.000		1.310.797.829

Protocollo d'intervento: **6227****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CHIESA DI S. MARIA NOVELLA INTERVENTO DI CONSERVAZIONE E PULITURA DEGLI INTERNI SUPERFICI INTONACATE COLONNE ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI ED INFISSI</i>	
Comune	FIRENZE (FI)	
Finanziamento	L. 2.902 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 2.902.083.752
	- Tot. Pagato	L. 2.902.083.752
Cofinanziamento	L. 1.116 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/01/99	30/12/98
Fine Lavori	20/09/99	20/12/99

*Chiesa di S. Maria Novella***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI FIRENZE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	01307110484	
Indirizzo	PIAZZA DELLA SIGNORIA, 1	FIRENZE (FI)
Recapiti	Telefono: 055 27681	Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA A INVITO	DE VIVO S. p. A. Potenza, via dell'Edilizia, 18 00545040768	L. 630.000.000	L. 556.290.000	11,70
Licitazione Privata	ATI Cellini s. r. l. mandataria via Ximenes, 20 Firenze 00394740484	L. 3.070.000.000	L. 2.901.150.000	5,50
Totale		L. 3.700.000.000	L. 3.457.440.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
Automatico	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.291.000.000	L. 3.175.000.000	L. 472.000.000	L. 644.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.018.083.752	L. 2.902.083.752	L. 472.000.000	L. 644.000.000	- Lit. -272916248

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/12/00)
Opere Civili	3.700.000.000	3.457.440.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.700.000.000	3.457.440.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	37.000.000
Altre Spese Tecniche	125.650.000	153.333.000
Allacciamenti		
Imprevisti	58.350.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		18.465.162
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	370.000.000	345.744.000
IVA al 20%		30.667.000
SOMME A DISPOSIZIONE	591.000.000	585.209.162
TOTALE COSTO	4.291.000.000	4.042.649.162
	Economie	-248.350.838
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.175.000.000	2.902.083.752
Risorse proprie	644.000.000	1.140.565.410
Altre fonti finanziarie	472.000.000	
TOTALE COPERTURE	4.291.000.000	4.042.649.162

Protocollo d'intervento: **3144/A****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *ITINERARI DELLA VIA FRANCIGENA E DEI LUOGHI DELLA FEDE IN TOSCANA - SEGNALETICA*
 Comune **FIRENZE (FI)**
 Finanziamento **L. 3.087 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.938.832.400**
 - Tot. Pagato **L. 2.938.832.400**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**



Itinerari della via Francigena e dei luoghi della fede in Toscana

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **REGIONE TOSCANA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **01386030488**
 Indirizzo **VIA CAVOUR, 18** **FIRENZE (FI)**
 Recapiti **Telefono: 055 438211** **Telefax: 055 212820**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	SI.SE SRL Via dell'industria 41 - Castiglione delle Stiviere 01210380208	L. 833.787.000	L. 833.787.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	PA.PI.RI SRL Via Statale 22 - Scafati (SA) 02625990656	L. 1.343.040.000	L. 1.343.040.000	0,00
Totali		L. 2.176.827.000	L. 2.176.827.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 05/08/99	L. 3.257.000.000	L. 3.257.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.257.000.000	L. 3.257.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.257.000.000	L. 3.257.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -318000000
DM 21/07/00	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.939.000.000	L. 2.939.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.087.000.000	L. 3.087.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 148000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/06/01)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	2.565.000.000	2.176.827.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	2.565.000.000		2.176.827.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	129.000.000	129.000.000	
Altre Spese Tecniche		143.200.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	20.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	543.000.000	489.805.400	
SOMME A DISPOSIZIONE	692.000.000		762.005.400
TOTALE COSTO	3.257.000.000		2.938.832.400
		Economie	-318.167.600
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.257.000.000		2.938.832.400
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.257.000.000		2.938.832.400

Protocollo d'intervento: **6104/B****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL DUOMO.*

Comune **PIETRASANTA (LU)**

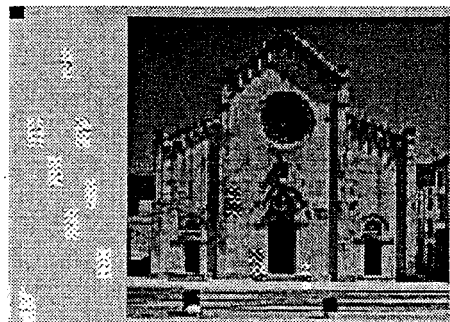
Finanziamento **L. 1.981 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.966.336.907**

- Tot. Pagato **L. 1.966.336.454**

Cofinanziamento **L. 685 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/06/98	30/06/98
Fine Lavori	15/10/99	23/12/99

*Duomo di San Martino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. MARTINO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **94000610462**

Indirizzo **VIA XX SETTEMBRE** **PIETRASANTA (LU)**

Recapiti **Telefono: 0584 790177** **Telefax: 0584 790177**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
licitazione privata	A.T.I vedi note via Urbicciani 660/E Lucca 01469950461	L. 1.964.093.422	L. 1.953.290.908	0,55
Totali		L. 1.964.093.422	L. 1.953.290.908	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
Automatico	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.666.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 685.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/11/00)
Opere Civili	1.964.000.000	1.953.290.908
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.964.000.000	1.953.290.908
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	296.000.000	296.000.000
Altre Spese Tecniche	50.000.000	50.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	80.000.000	79.560.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	206.000.000	203.285.091
IVA al 20%	70.000.000	69.200.000
SOMME A DISPOSIZIONE	702.000.000	698.045.091
TOTALE COSTO	2.666.000.000	2.651.335.999
	Economie	-14.664.001
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.981.000.000	1.966.335.999
Risorse proprie	685.000.000	685.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.666.000.000	2.651.335.999

Protocollo d'intervento: **6104/C****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL DUOMO DI S. MARTINO IN PIETRASANTA, RESTAURO DI AFFRESCHI.*

Comune **PIETRASANTA (LU)**

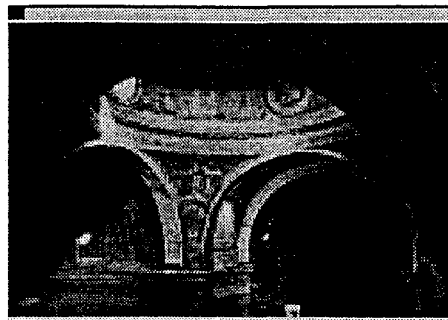
Finanziamento **L. 547 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 543.793.611**

- Tot. Pagato **L. 543.793.611**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/06/98	30/06/98
Fine Lavori	15/10/99	23/12/99

*Duomo di San Martino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA S. MARTINO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **94000610462**

Indirizzo **VIA XX SETTEMBRE** **PIETRASANTA (LU)**

Recapiti **Telefono: 0584 790177** **Telefax: 0584 790177**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
trattativa privata	A.T.I Studio Veronica Hartman - Eco Eng. Controls Capezzano Pianore - Milano 0047810467	L. 497.091.833	L. 494.357.828	0,55
Totali		L. 497.091.833	L. 494.357.828	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 547.000.000	L. 547.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/11/00)
Opere Civili	497.000.000	494.357.828
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	497.000.000	494.357.828
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	50.000.000	49.435.783
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	50.000.000	49.435.783
TOTALE COSTO	547.000.000	543.793.611
	Economie	-3.206.389
COPERTURA FINANZIARIA		
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Risorse proprie	547.000.000	543.793.611
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	547.000.000	543.793.611
