

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
Automatico	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.974.000.000	L. 3.179.000.000	L. 795.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 3.973.200.000	L. 3.178.200.000	L. 795.000.000	L. 0 - Lit. -800000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/02/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	3.010.000.000	3.974.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.010.000.000	3.974.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	552.500.000	
Allacciamenti		
Imprevisti		15.599.100
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	301.000.000	
IVA al 20%	110.500.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	964.000.000	15.599.100
TOTALE COSTO	3.974.000.000	3.989.599.100
	Maggiore Spesa	15.599.100
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.179.000.000	3.178.200.000
Risorse proprie		795.000.000
Altre fonti finanziarie	795.000.000	16.399.100
TOTALE COPERTURE	3.974.000.000	3.989.599.100

Protocollo d'intervento: **6453**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO L'ADEGUAMENTO E LA CRESCITA DELLA STRUTTURA RICETTIVA CASA DI S. BRIGIDA</i>	
Comune	ASSISI (PG)	
Finanziamento	L. 1.045 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.045.000.000
	- Tot. Pagato	L. 1.045.000.000
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	26/02/99	15/06/99
Fine Lavori	10/10/99	23/02/00



Casa di S. Brigida

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	ORDINE DEL SS.MO SALVATORE DI S. BRIGIDA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	01190270585	
Indirizzo	PIAZZA FARNESE 96	ROMA ()
Recapiti	Telefono: 06 68892497	Telefax: 06 68219126

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
licitazione privata	ARTE E RESTAURO S.R.L. VIA NAZARIO SAURO, 15 - 35100 PADOVA 01652840792	L. 950.000.000	L. 726.600.000	23,52
Totali		L. 950.000.000	L. 726.600.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 950.000.000	L. 950.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.045.000.000	L. 1.045.000.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 95000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/08/01)
Opere Civili	436.000.000	529.600.000
Opere Impiantistiche	75.000.000	75.000.000
Arredi e/o Attrezzature	42.000.000	42.000.000
Altre Voci	80.000.000	80.000.000
TOTALE LAVORI	633.000.000	726.600.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	58.000.000	65.140.000
Altre Spese Tecniche	50.000.000	58.000.000
Allacciamenti	24.000.000	24.000.000
Imprevisti	33.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		34.200.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	7.000.000	7.000.000
IVA al 20%	145.000.000	155.948.000
SOMME A DISPOSIZIONE	317.000.000	344.288.000
TOTALE COSTO	950.000.000	1.070.888.000
	Maggiore Spesa	120.888.000
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	950.000.000	1.045.000.000
Risorse proprie		25.888.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	950.000.000	1.070.888.000

Protocollo d'intervento: **6476****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO ABITATO FRAZ. COLLELUNGO*
 Comune **SAN VENANZO (TR)**
 Finanziamento **L. 160 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 159.860.835**
 - Tot. Pagato **L. 159.860.835**
 Cofinanziamento **L. 15 milioni**

*Frazione Collelungo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI SAN VENANZO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00185990553**
 Indirizzo **PIAZZA ROMA, 22** **SAN VENANZO (TR)**
 Recapiti **Telefono: 075 875123** **Telefax: 075 875407**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
COTTIMO FIDUCIARIO	EDILIZIA SCIRI SNC VIA SALITA S.FRANCESCO,MARSCIANO-PG 01158360543	L. 173.793.059	L. 150.939.272	13,15
Totali		L. 173.793.059	L. 150.939.272	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 06/08/98	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 20/11/98	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 27/01/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 09/02/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 01/06/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 05/08/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 13/09/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 16/11/99	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
Automatico	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 21/07/00	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 01/08/00	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/12/00	L. 200.000.000	L. 185.000.000	L. 0	L. 15.000.000	
DM 14/02/01	L. 174.860.835	L. 159.860.835	L. 0	L. 15.000.000	- Lit. -25139165

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/06/99)
Opere Civili	173.000.000	150.939.272
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	173.000.000	150.939.272
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		2.545.920
Allacciamenti		
Imprevisti	9.000.000	6.281.716
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	18.000.000	15.093.927
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	27.000.000	23.921.563
TOTALE COSTO	200.000.000	174.860.835
	Economie	-25.139.165
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	185.000.000	159.860.835
Risorse proprie	15.000.000	15.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	200.000.000	174.860.835

Protocollo d'intervento: **6553**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *G.AUDI.U.M. GIUBILEO ALL'AUDITORIO DELLA CITTADELLA PER L'UNIVERSALITA' DELLE ARTI DELLA CULTURA E DELLA MUSICA*

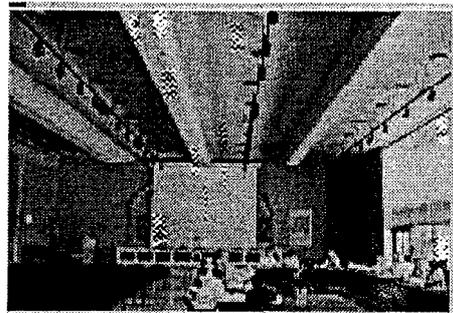
Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **L. 1.379 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.378.584.722**

- Tot. Pagato **L. 1.378.345.616**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Cittadella di Assisi -Progetto G.Audi.U.M.*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PRO CIVITATE CHRISTIANA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DEGLI ANCAJANI, 3** **ASSISI (PG)**

Recapiti **Telefono:** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	CITTADELLA MULTIMEDIALE S.R.L. VIA ANCAJANI,3 ASSISI	L. 184.849.000	L. 184.849.000	0,00
	ARREDOCASA DI MOSCONI & C S.N.C. VIA UMBERTO I, 28 FOLIGNO (PG)	L. 247.955.000	L. 242.995.900	2,00
	FAENZA IMPRESA S.R.L. VIA PORTISANO, 32 FAENZA (RA)	L. 627.803.000	L. 618.385.955	1,50
Totali		L. 1.060.607.000	L. 1.046.230.855	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.400.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.378.584.722	L. 1.378.584.722	L. 0	L. 0	Lit. -21415278

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/07/00)
Opere Civili	171.591.000	618.186.700
Opere Impiantistiche	456.212.000	
Arredi e/o Attrezzature	247.955.000	242.995.900
Altre Voci	184.849.000	183.000.510
TOTALE LAVORI	1.060.607.000	1.044.183.110
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	106.058.900	104.438.237
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	233.334.100	229.724.269
SOMME A DISPOSIZIONE	339.393.000	334.162.506
TOTALE COSTO	1.400.000.000	1.378.345.616
	Economie	-21.654.384
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.400.000.000	1.378.345.616
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.400.000.000	1.378.345.616

Protocollo d'intervento: **6603**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO*
 Comune **PERUGIA (PG)**
 Finanziamento **L. 300 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 260.499.924**
 - Tot. Pagato **L. 260.499.924**
 Cofinanziamento **L. 300 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *30/10/98* **30/11/98**
 Fine Lavori *09/09/99* **30/10/99**

*Aree attrezzate per sosta e ristoro*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI PERUGIA**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00163570542**
 Indirizzo **CORSO VANNUCCI, 1** **PERUGIA (PG)**
 Recapiti **Telefono: 075 5771** **Telefax: 075 5730424**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT.PRIV.	COMUNITA' MONTANA "MONTI DEL TRASIMENO" VIA S. BONAVENTURA, 10 PERUGIA	L. 479.848.525	L. 469.292.885	2,20
Totali		L. 479.848.525	L. 469.292.885	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 600.000.000	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE


A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/09/00)	
Opere Civili	400.000.000	462.997.628	
Opere Impiantistiche	30.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	480.000.000		462.997.628
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	25.000.000		
Altre Spese Tecniche	25.000.000	15.009.999	
Allacciamenti	10.000.000	6.396.700	
Imprevisti	4.000.000	9.200.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	56.000.000	46.299.763	
IVA al 20%		5.051.341	
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000		81.957.803
TOTALE COSTO	600.000.000		544.955.431
		Economie	-55.044.569
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000		244.955.431
Risorse proprie	300.000.000		300.000.000
Altre fonti finanziarie			300.000.000
TOTALE COPERTURE	600.000.000		844.955.431

Protocollo d'intervento: **6611**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SISTEMAZIONE DEL CASSERO DI PORTA S. ANGELO*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 289 milioni**- Tot. Impegnato **L. 276.000.000**- Tot. Pagato **L. 248.400.000**Cofinanziamento **L. 184 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/12/98* **19/05/99**Fine Lavori *09/09/99* **19/05/00***Cassero di Porta S. Angelo*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI PERUGIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00163570542**Indirizzo **CORSO VANNUCCI, 1****PERUGIA (PG)**Recapiti **Telefono: 075 5771****Telefax: 075 5730424**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA LA NORMANNA SOC. COOP. ARL. VIA MICHELANGELO ,23 -AVERSA-CE-	L. 0	L. 251.062.000	0,00
Totali		L. 0	L. 251.062.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 06/08/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 20/11/98	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 27/01/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 09/02/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/06/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 05/08/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 13/09/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 16/11/99	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
Automatico	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 21/07/00	L. 450.000.000	L. 320.000.000	L. 0	L. 130.000.000	
DM 01/08/00	L. 431.974.871	L. 301.974.871	L. 0	L. 130.000.000	- Lit. -18025129
DM 14/12/00	L. 431.974.871	L. 301.974.871	L. 0	L. 130.000.000	
DM 14/02/01	L. 472.679.796	L. 288.679.796	L. 0	L. 184.000.000	+ Lit. 40704925

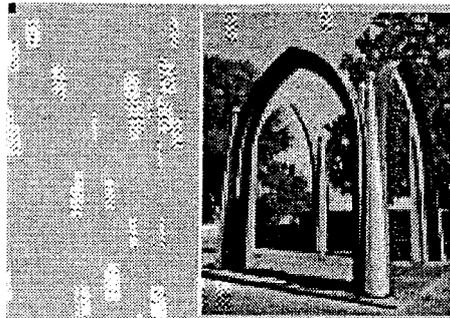
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (24/11/99)
Opere Civili	200.000.000	169.874.000
Opere Impiantistiche	95.000.000	81.188.000
Arredi e/o Attrezzature	20.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	315.000.000	251.062.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	25.000.000	25.000.000
Altre Spese Tecniche	35.000.000	10.000.000
Allacciamenti	10.000.000	10.000.000
Imprevisti	19.500.000	10.670.800
- Espropri o Acquisizioni		51.850.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.950.000
IVA al 10%	29.500.000	25.097.200
IVA al 20%	16.000.000	19.370.000
SOMME A DISPOSIZIONE	135.000.000	154.938.000
TOTALE COSTO	450.000.000	406.000.000
	Economie	-44.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	320.000.000	276.000.000
Risorse proprie	130.000.000	130.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	450.000.000	406.000.000

Protocollo d'intervento: **6628**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SERVIZI E PRODOTTI INFORMATIVI PER L' ACCOGLIENZA - PROGETTO UMBRIA 2000*
 Comune **PERUGIA (PG)**
 Finanziamento **L. 12.877 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 12.877.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 11.589.300.000**
 Cofinanziamento **L. 6.527 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori 18/08/98 20/09/98
 Fine Lavori 15/09/99 31/12/99



Progetto Umbria 2000

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione REGIONE DELL'UMBRIA
 Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
 C.Fis./P.IVA 80000130544
 Indirizzo CORSO VANNUCCI, 96 PERUGIA (PG)
 Recapiti Telefono: 075 5041 Telefax: 075 5728616

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAM DIRETTO	CRUED SERVIZI INFORMATICI SPA VIA XX SETTEMBRE ,150/A-PERUGIA 00271540544	L. 19.404.000.000	L. 19.404.000.000	0,00
Totali		L. 19.404.000.000	L. 19.404.000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
Automatico	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 19.404.000.000	L. 12.877.000.000	L. 6.027.000.000	L. 500.000.000	


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/05/99)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche	1.824.000.000	1.824.000.000
Arredi e/o Attrezzature	4.980.000.000	4.980.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	6.804.000.000	6.804.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	250.000.000	250.000.000
Altre Spese Tecniche	2.980.000.000	2.980.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	7.270.000.000	7.270.000.000
IVA al 10%		
IVA al 20%	2.100.000.000	2.100.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	12.600.000.000	12.600.000.000
TOTALE COSTO	19.404.000.000	19.404.000.000
		0
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	12.877.000.000	12.877.000.000
Risorse proprie	6.527.000.000	6.527.000.000
Altre fonti finanziarie		6.027.000.000
TOTALE COPERTURE	19.404.000.000	25.431.000.000

Protocollo d'intervento: **6652**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA A BASSO COSTO PRESSO IL CONVENTO DI S. FRANCESCO</i>	
Comune	STRONCONE (TR)	
Finanziamento	L. 400 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 396.259.149
	- Tot. Pagato	L. 396.259.149
Cofinanziamento	L. 12 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>09/10/98</i>	08/10/98
Fine Lavori	<i>30/04/99</i>	20/04/99



Convento di S. Francesco

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00160170544	
Indirizzo	PIAZZA PORZIUNCOLA, 1	SANTA MARIA DEGLI ANGELI (PG)
Recapiti	Telefono: 075 80511	Telefax: 075 8043023

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	EDILCOS di Fraschetti Luciano & Egidio S.N.C. VIA SAN PAOLO,13 -FRAZ. DI AGRIANO- NORCIA-PS 01529260547	L. 308.257.308	L. 304.126.660	1,34
Totali		L. 308.257.308	L. 304.126.660	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

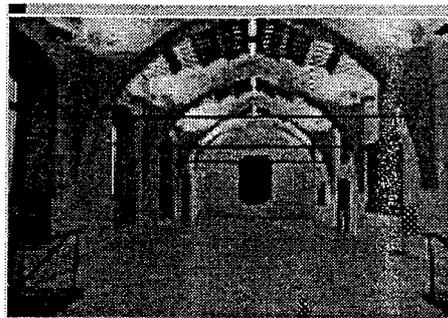
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 06/08/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 20/11/98	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 27/01/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 09/02/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 01/06/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 05/08/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 13/09/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 16/11/99	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
Automatico	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 21/07/00	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 01/08/00	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 14/12/00	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	
DM 14/02/01	L. 412.000.000	L. 400.000.000	L. 0	L. 12.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/10/01)
Opere Civili	173.000.000	322.118.432
Opere Impiantistiche	135.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	21.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	329.000.000	322.118.432
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	30.000.000	14.577.000
Altre Spese Tecniche		31.635.166
Allacciamenti	3.000.000	
Imprevisti	7.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		1.581.000
IVA al 10%	35.000.000	32.211.843
IVA al 20%	8.000.000	6.135.708
SOMME A DISPOSIZIONE	83.000.000	86.140.717
TOTALE COSTO	412.000.000	408.259.149
	Economie	-3.740.851
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	400.000.000	396.259.149
Risorse proprie	12.000.000	12.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	412.000.000	408.259.149

Protocollo d'intervento: **6656****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO ADEGUAMENTI ED ABBATTIMENTO BARRIERE*
 Comune **CITTA' DI CASTELLO (PG)**
 Finanziamento **L. 756 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 750.498.500**
 - Tot. Pagato **L. 750.498.500**
 Cofinanziamento **L. 93 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **02/07/98 07/09/98**
 Fine Lavori **30/06/99**

*Museo diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **81001990548**
 Indirizzo **PIAZZA GABRIOTTI, 10** **CITTA' DI CASTELLO (PG)**
 Recapiti **Telefono: 075 8554328** **Telefax: 075 8553359**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	SAMER srl Loc. Taverne - SS. 75bis del Trasimeno 22- CORCIANO		L. 630.000.000	
PROCEDURA FIDUCIARIA	DITTA GOPPION SRL TREZZANO SUL NAVIGLIO-MI 01230150151	L. 245.000.000	L. 240.590.000	1,80
PROCEDURA FIDUCIARIA	DITTA CESA DI FALCINI ENZO SNC. VIA ROMA ,55 -CITTA' DI CASTELLO-PG 00198230542	L. 330.000.000	L. 317.790.000	3,70
Totali		L. 575.000.000	L. 1.188.380.000	
