

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 06/08/98	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 20/11/98	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 27/01/99	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 09/02/99	L. 900.000.000	L. 807.000.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 01/06/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	- Lit. -51209000
DM 05/08/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 13/09/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 16/11/99	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
Automatico	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 21/07/00	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 01/08/00	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 14/12/00	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	
DM 14/02/01	L. 848.791.000	L. 755.791.000	L. 0	L. 93.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

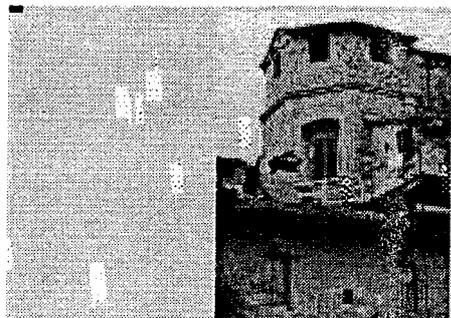
A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/09/01)
Opere Civili	200.000.000	500.884.260
Opere Impiantistiche	130.000.000	240.590.000
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	630.000.000	741.474.260
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	56.000.000	50.509.380
Altre Spese Tecniche	37.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	50.000.000	1.596.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	2.000.000	
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		39.900.000
IVA al 10%	20.000.000	50.088.426
IVA al 20%	105.000.000	58.219.876
SOMME A DISPOSIZIONE	270.000.000	200.313.682
TOTALE COSTO	900.000.000	941.787.942
	Maggiore Spesa	41.787.942
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	807.000.000	750.498.500
Risorse proprie	93.000.000	93.000.000
Altre fonti finanziarie		98.289.442
TOTALE COPERTURE	900.000.000	941.787.942

Protocollo d'intervento: **6659**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO DELL'ABBADIA DI MONTECORONA*Comune **UMBERTIDE (PG)**Finanziamento **L. 897 milioni**- Tot. Impegnato **L. 897.280.804**- Tot. Pagato **L. 897.280.804**Cofinanziamento **L. 120 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *30/08/98* **28/07/98**Fine Lavori *30/07/99* **29/12/99***Abbadia di Montecorona*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI SAN SALVATORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **90002300540**Indirizzo **BADIA DI MONTECORONA, 317****UMBERTIDE (PG)**Recapiti **Telefono: 075 9415013****Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA EDILUMBRIA DI PASCOLINI IVO S.R.L. STR. DELLA FRATICCIOLA,3 -PONTE PATTOLI	L. 664.000.000	L. 663.933.600	0,01
Totali		L. 664.000.000	L. 663.933.600	

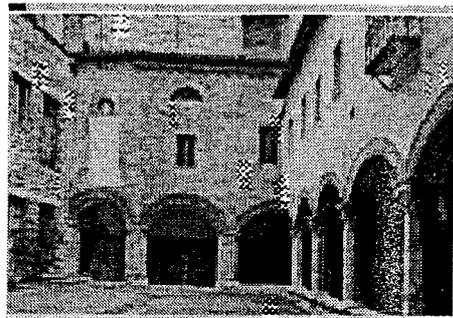
XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 850.000.000	L. 730.000.000	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
Automatico	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	+ Lit. 167953844
DM 21/07/00	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.017.953.844	L. 897.953.844	L. 70.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.017.280.804	L. 897.280.804	L. 70.000.000	L. 50.000.000	- Lit. -673040

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/09/00)	
Opere Civili	600.000.000	827.418.913	
Opere Impiantistiche	64.000.000		
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	664.000.000	827.418.913	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	40.300.000	49.300.000	
Altre Spese Tecniche	25.600.000	36.850.000	
Allacciamenti	3.400.000	3.400.000	
Imprevisti	33.200.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		744.630	
IVA al 10%	70.410.000	83.081.891	
IVA al 20%	12.820.000	17.230.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	185.730.000	190.606.521	
TOTALE COSTO	849.730.000	1.018.025.434	
	Maggiore Spesa	168.295.434	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	730.000.000	897.280.804	
Risorse proprie	120.000.000	120.000.000	
Altre fonti finanziarie		744.630	
TOTALE COPERTURE	850.000.000	1.018.025.434	

Protocollo d'intervento: **6663****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX CASA DEI CANONICI CITTADELLA SAN FLORIDO*Comune **CITTA' DI CASTELLO (PG)**Finanziamento **L. 1.444 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.444.245.500**- Tot. Pagato **L. 1.444.245.500**Cofinanziamento **L. 256 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori *07/09/98* **07/09/98**Fine Lavori *10/08/99* **28/10/99***Cittadella San Florido***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81001990548**Indirizzo **PIAZZA GABRIOTTI, 10****CITTA' DI CASTELLO
(PG)**Recapiti **Telefono: 075 8554328****Telefax: 075 8553359****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PROC.FIDUCIARIA	C.E.S.A. DI FALCINI & C. SNC. VIA ROMA ,55 -CITTA' DI CASTELLO -PG- 00198230542	L. 1.190.000.000	L. 1.145.970.000	3,70
Totali		L. 1.190.000.000	L. 1.145.970.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.854.000.000	L. 1.598.000.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	- Lit. -153755000
DM 05/08/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
Automatico	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.700.245.000	L. 1.444.245.000	L. 100.000.000	L. 156.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE


A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/07/01)
Opere Civili	1.000.000.000	1.482.462.350
Opere Impiantistiche	190.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	
Altre Voci		191.271.090
TOTALE LAVORI	1.340.000.000	1.673.733.440
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	119.000.000	
Altre Spese Tecniche	37.000.000	154.306.807
Allacciamenti	6.000.000	12.761.690
Imprevisti	155.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		4.893.516
IVA al 10%	133.000.000	148.246.281
IVA al 20%	64.000.000	62.987.169
SOMME A DISPOSIZIONE	514.000.000	383.195.463
TOTALE COSTO	1.854.000.000	2.056.928.903
	Maggiore Spesa	202.928.903
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.598.000.000	1.444.245.000
Risorse proprie	256.000.000	256.000.000
Altre fonti finanziarie		356.683.903
TOTALE COPERTURE	1.854.000.000	2.056.928.903

Protocollo d'intervento: **6664**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *CHIESA DI S. SILVESTRO IN CORPOSANO*Comune **SAN GIUSTINO (PG)**Finanziamento **L. 100 milioni**- Tot. Impegnato **L. 86.383.200**- Tot. Pagato **L. 86.383.200**Cofinanziamento **L. 214 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *12/11/98* **12/11/98**Fine Lavori *30/05/99* **12/08/99***Chiesa di S. Silvestro in Corposano*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA SAN GIUSTINO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **VIA DELLA CHIESA, 13****SAN GIUSTINO (PG)**

Recapiti Telefono:

Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA DITTA SCARSCELLI NATALE VIA FIUME,5-SAN GIUSTINO-PG- 00086360542	L. 224.000.000	L. 215.712.000	3,70
Totali		L. 224.000.000	L. 215.712.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

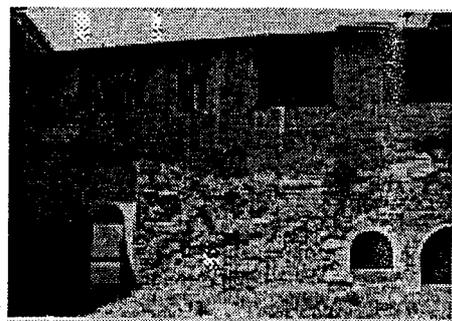
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 06/08/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 20/11/98	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 27/01/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 09/02/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 01/06/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 05/08/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 13/09/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 16/11/99	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
Automatico	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 21/07/00	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 01/08/00	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 14/12/00	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	
DM 14/02/01	L. 314.000.000	L. 100.000.000	L. 0	L. 214.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/07/01)
Opere Civili	200.000.000	
Opere Impiantistiche	23.500.000	
Arredi e/o Attrezzature	30.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	253.500.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	18.000.000	
Altre Spese Tecniche	3.000.000	
Allacciamenti	1.500.000	
Imprevisti	8.600.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	25.350.000	
IVA al 20%	4.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	60.450.000	0
TOTALE COSTO	313.950.000	310.882.821
	Economie	-3.067.179
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	100.000.000	86.383.200
Risorse proprie	214.000.000	224.499.621
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	314.000.000	310.882.821

Protocollo d'intervento: **6712****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO*Comune **CITTA' DI CASTELLO (PG)**Finanziamento **L. 227 milioni**- Tot. Impegnato **L. 215.068.062**- Tot. Pagato **L. 215.068.062**Cofinanziamento **L. 21 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **28/06/98 07/09/98**Fine Lavori **30/06/99 06/09/99***Museo diocesano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI CITTA' DI CASTELLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **81001990548**Indirizzo **PIAZZA GABRIOTTI, 10****CITTA' DI CASTELLO
(PG)**Recapiti **Telefono: 075 8554328****Telefax: 075 8553359****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PROC.FIDUCIARIA	DITTA GOPPION SRL. TREZZANO SUL NAVIGLIO-MI 01230150151	L. 18.000.000	L. 17.676.000	1,80
PROC.FIDUCIARIA	DITTA CESA DI FALCINELLI & C SNC. VIA ROMA ,55 -CITTA' DI CASTELLO-PG 00198230542	L. 178.000.000	L. 171.414.000	3,70
Totali		L. 196.000.000	L. 189.090.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 06/08/98	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 20/11/98	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 27/01/99	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 09/02/99	L. 271.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 01/06/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	- Lit. -22663000
DM 05/08/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 13/09/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 16/11/99	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
Automatico	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 21/07/00	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 01/08/00	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 14/12/00	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	
DM 14/02/01	L. 248.337.000	L. 227.337.000	L. 0	L. 21.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/07/01)	
Opere Civili	158.000.000	174.808.935	
Opere Impiantistiche	20.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	18.000.000	17.670.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	196.000.000		192.478.935
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	18.000.000	15.600.000	
Altre Spese Tecniche	6.000.000	2.843.000	
Allacciamenti	1.000.000		
Imprevisti	21.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		368.860	
IVA al 10%	18.000.000	17.480.895	
IVA al 20%	11.000.000	7.296.372	
SOMME A DISPOSIZIONE	75.000.000		43.589.127
TOTALE COSTO	271.000.000		236.068.062
	Economie		-34.931.938
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	250.000.000		215.068.062
Risorse proprie	21.000.000		21.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	271.000.000		236.068.062

Protocollo d'intervento: **6718****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA E DEL PORTICO DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA IN TERNI*

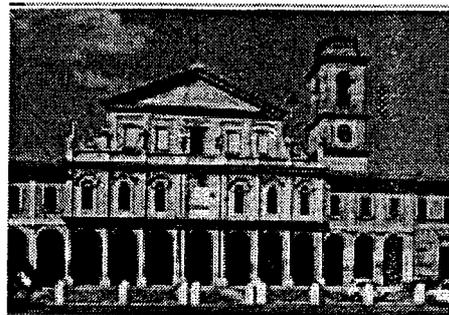
Comune **TERNI (TR)**

Finanziamento **L. 300 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 293.668.320**

- Tot. Pagato **L. 293.668.320**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Chiesa di S. Maria Assunta***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **91008370552**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
Scrittura privata	IMMOBILIARE VALNERINA S.A.S. VIALE GIANNELLI, 83 TERNI 00183270552	L. 300.000.000	L. 191.869.036	36,04
Totali		L. 300.000.000	L. 191.869.036	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

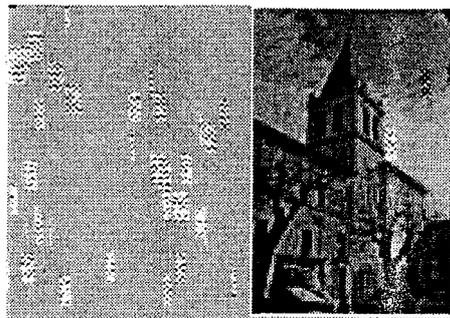
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
<i>Automatico</i>	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/07/01)
Opere Civili	191.869.036	189.919.331
Opere Impiantistiche	50.000.000	50.000.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	241.869.036	239.919.331
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	18.430.833	18.491.485
Altre Spese Tecniche	7.674.761	7.709.420
Allacciamenti		
Imprevisti	2.617.348	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	24.186.904	18.991.933
IVA al 20%	5.221.118	15.240.181
SOMME A DISPOSIZIONE	58.130.964	60.433.019
TOTALE COSTO	300.000.000	300.352.350
	Maggiore Spesa	352.350
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	300.000.000	293.668.320
Risorse proprie		6.684.030
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	300.000.000	300.352.350

Protocollo d'intervento: **6734****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RISANAMENTO DI EDIFICI DELLA COLLAGIATA DI S. MARIA MAGGIORE</i>	
Comune	SPELLO (PG)	
Finanziamento	L. 1.276 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.275.217.165
	- Tot. Pagato	L. 1.275.217.165
Cofinanziamento	L. 1.447 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>30/09/98</i>	03/10/98
Fine Lavori	<i>25/09/99</i>	30/12/99

*Collegiata di S. Maria Maggiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA DI S. M. MAGGIORE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	91004350541	
Indirizzo	PIAZZA MATTEOTTI, 13	SPELLO (PG)
Recapiti	Telefono: 0742 301792	Telefax: 0742 301792

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	ASS. DI IMPRESE: COSTRUZIONI S.R.L.- MANTELLI VIA STIGLIANI,72 00647730770	L. 1.921.000.000	L. 1.906.592.500	0,75
Totali		L. 1.921.000.000	L. 1.906.592.500	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.437.000.000	L. 1.090.000.000	L. 1.300.000.000	L. 47.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	+ Lit. 100000000
DM 09/02/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.537.000.000	L. 1.090.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
Automatico	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	+ Lit. 200000000
DM 21/07/00	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.737.000.000	L. 1.290.000.000	L. 0	L. 1.447.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.722.592.500	L. 1.275.592.500	L. 0	L. 1.447.000.000	- Lit. -14407500

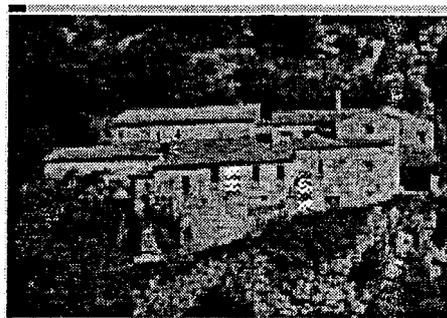
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/09/01)	
Opere Civili	1.576.000.000	2.223.607.275	
Opere Impiantistiche	200.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	65.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	1.841.000.000		2.223.607.275
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	131.000.000		
Altre Spese Tecniche	45.000.000	230.207.635	
Allacciamenti	5.000.000		
Imprevisti	177.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	184.000.000	222.360.728	
IVA al 20%	54.000.000	46.041.527	
SOMME A DISPOSIZIONE	596.000.000		498.609.890
TOTALE COSTO	2.437.000.000		2.722.217.165
	Maggiore Spesa		285.217.165
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.090.000.000		1.275.217.165
Risorse proprie	1.347.000.000		1.447.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	2.437.000.000		2.722.217.165

Protocollo d'intervento: **6782**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RECUPERO DELL' EREMO DI S. AMBROGIO*
 Comune **GUBBIO (PG)**
 Finanziamento **L. 700 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 700.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 700.000.000**
 Cofinanziamento **L. 1.300 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *15/07/98* **03/11/98**
 Fine Lavori *30/09/99* **30/12/99**

*Eremo di S. Ambrogio*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA NS. DEL CARMINE**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA
 Indirizzo **PIAZZA VITTORIO EMANUELE II** **CREMOLINO (AL)**
 Recapiti **Telefono: 0143879031** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
	ATI COOPERATIVA EDILE EUGUBINA SRL.ECC. VIA LEONARDO DA VINCI-GUBBIO-PG- 00428390546	L. 1.818.181.800	L. 1.818.181.800	0,00
Totali		L. 1.818.181.800	L. 1.818.181.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.000.000.000	L. 700.000.000	L. 1.000.000.000	L. 300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/04/01)
Opere Civili	1.610.149.740	1.652.864.159
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.610.149.740	1.652.864.159
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	84.289.060	
Altre Spese Tecniche	84.000.000	168.592.144
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	39.743.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	181.818.200	182.145.630
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	389.850.260	350.737.774
TOTALE COSTO	2.000.000.000	2.003.601.933
	Maggiore Spesa	3.601.933
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	700.000.000	700.000.000
Risorse proprie	1.300.000.000	1.300.000.000
Altre fonti finanziarie		3.601.933
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	2.003.601.933

Protocollo d'intervento: **6790**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *INTERVENTO DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S. VENTURA DA ADIBIRE AD ACCOGLIENZA POVERA*Comune **SPELLO (PG)**Finanziamento **L. 442 milioni**- Tot. Impegnato **L. 431.494.884**- Tot. Pagato **L. 431.494.884**Cofinanziamento **L. 36 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **30/11/98 30/11/98**Fine Lavori **30/08/99 30/12/99***Chiesa di S. Ventura*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PARROCCHIA DI S.MARIA MAGGIORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **P.ZZA MATTEOTTI, 13****SPELLO (PG)**Recapiti **Telefono:****Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	IMPRESA EDILE DI NANNI E FIGLI SNC. FRAZ.COLLE DEL MARCHESE,72.CASTEL RITALDI-PG 01306970540	L. 345.000.000	L. 334.650.000	3,00
Totali		L. 345.000.000	L. 334.650.000	
