

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 174.000.000	L. 174.000.000	L. 0	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (16/07/01)
Opere Civili	72.359.576	114.234.607
Opere Impiantistiche	10.383.000	
Arredi e/o Attrezzature	39.000.000	
Altre Voci	5.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>126.742.576</b>	<b>114.234.607</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	9.900.000	
Altre Spese Tecniche	11.100.000	17.700.000
Allacciamenti	2.000.000	
Imprevisti	2.783.166	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		23.323.182
IVA al 10%	8.474.258	11.423.461
IVA al 20%	13.000.000	4.664.636
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>47.257.424</b>	<b>57.111.279</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>174.000.000</b>	<b>171.345.886</b>
	<b>Economie</b>	<b>-2.654.114</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	174.000.000	171.345.886
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>174.000.000</b>	<b>171.345.886</b>

Protocollo d'intervento: **7077****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO ED AMPLIAMENTO PER UN CENTRO DI ACCOGLIENZA NELLA LOCALITA' COLLEVALENZA*

Comune **TODI (PG)**

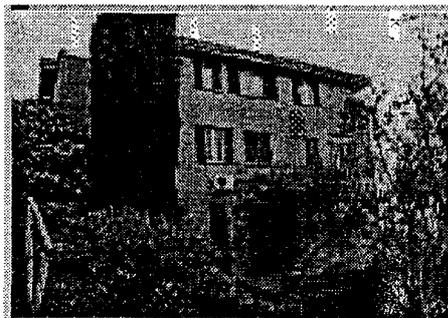
Finanziamento **L. 3.307 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.288.941.930**

- Tot. Pagato **L. 3.288.941.930**

Cofinanziamento **L. 3.611 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	21/08/98	14/08/98
Fine Lavori	05/08/99	15/11/99

*Immobile in località Collevalenza***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **91008370552**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATT.PRIV	CAMAD SRL VIA CRESCENZIO, 25 - ROMA 00843870585	L. 2.164.202.668	L. 2.128.493.324	1,65
Totali		L. 2.164.202.668	L. 2.128.493.324	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.946.000.000	L. 3.346.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 05/08/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	- Lit. -39000000
DM 13/09/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
Automatico	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 21/07/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 01/08/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/12/00	L. 6.907.000.000	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.600.000.000	
DM 14/02/01	L. 6.917.706.186	L. 3.307.000.000	L. 0	L. 3.610.706.186	+ Lit. 10706186

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/02/01)
Opere Civili	2.164.202.668	2.292.455.291
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.164.202.668</b>	<b>2.292.455.291</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	333.228.000	333.238.296
Allacciamenti	33.869.065	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni	3.500.000.000	3.500.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature	698.280.000	544.212.600
- Altre voci		496.400
IVA al 10%	216.420.267	229.245.529
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>4.781.797.332</b>	<b>4.607.192.825</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>6.946.000.000</b>	<b>6.899.648.116</b>
	<b>Economie</b>	<b>-46.351.884</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	3.346.000.000	3.288.941.930
Risorse proprie	3.600.000.000	3.610.706.186
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>6.946.000.000</b>	<b>6.899.648.116</b>

Protocollo d'intervento: **7084**

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN LOCALITA' CASALI DI VALLO*  
 Comune **VALLO DI NERA (PG)**  
 Finanziamento **L. 2.019 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 2.018.770.000**  
 - Tot. Pagato **L. 2.018.770.000**  
 Cofinanziamento **L. 100 milioni**

*Località Casali di Vallo*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI VALLO DI NERA**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **@PERUGIA**  
 Indirizzo **PIEDIPATERNO** **VALLO DI NERA (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 0743 616143** **Telefax:**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
lic.privata	ATI SEPRIM.SAS./ASEI SRL. VIA FAZI,4-FOLIGNO-PG- 01978310546	L. 1.000.000.000	L. 937.700.000	6,23
<b>Totali</b>		<b>L. 1.000.000.000</b>	<b>L. 937.700.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.560.000.000	L. 1.560.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.491.470.000	L. 1.491.470.000	L. 0	L. 0	- Lit. -68530000
DM 01/06/99	L. 1.491.470.000	L. 1.491.470.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 565000000
DM 13/09/99	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
Automatico	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.056.470.000	L. 1.956.470.000	L. 0	L. 100.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.118.770.000	L. 2.018.770.000	L. 0	L. 100.000.000	+ Lit. 62300000

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/05/01)
Opere Civili	850.000.000	1.350.633.178
Opere Impiantistiche	180.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	75.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.105.000.000</b>	<b>1.350.633.178</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	103.000.000	104.346.800
Altre Spese Tecniche	80.250.000	
Allacciamenti	15.500.000	10.504.000
Imprevisti		35.469.757
- Espropri o Acquisizioni	100.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	86.500.000	
- Opere Impiantistiche	18.100.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	51.650.000	624.011.793
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>455.000.000</b>	<b>774.332.350</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.560.000.000</b>	<b>2.124.965.528</b>
	Maggiore Spesa	564.965.528
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.491.470.000	2.018.770.000
Risorse proprie		101.595.925
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.491.470.000</b>	<b>2.120.365.925</b>

Protocollo d'intervento: **7102****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *PATRIARCALE BASILICA DI S. FRANCESCO DI ASSISI PALAZZO PAPALE MUSEO PALAZZO  
NORD PALAZZO OVEST RESTAURO CONSOLIDAMENTO ED ACCOGLIENZA*

Comune **ASSISI (PG)**

Finanziamento **L. 22.583 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 22.582.626.975**

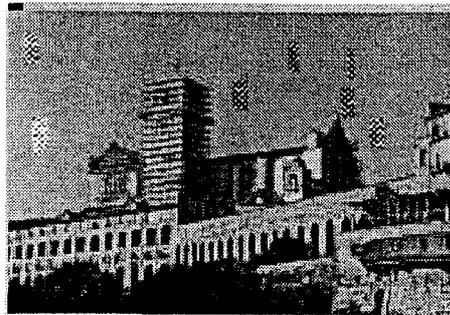
- Tot. Pagato **L. 22.582.626.975**

Cofinanziamento **L. 1.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/07/98* *26/09/98*

Fine Lavori *13/10/99*

*Patriarcale Basilica di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PATRIARCALE BASILICA DI SAN FRANCESCO**

Categoria **AD** *Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge  
27 maggio 1929, n.810);*

C.Fis./P.IVA **80003330547**

Indirizzo **PIAZZA SAN FRANCESCO, 2** **ASSISI (PG)**

Recapiti **Telefono: 075 819001** **Telefax: 075 816187**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIVATA	FILIPUCCI COSTRUZIONI SRL VIA DEL CONSERVATORIO,3 MATERA	L. 17.124.389.153	L. 13.442.645.105	21,50
Totali		L. 17.124.389.153	L. 13.442.645.105	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 23.633.000.000	L. 22.633.000.000	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	- Lit. -4049937510
DM 01/06/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 19.583.062.490	L. 18.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 3000000000
Automatico	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 22.583.062.490	L. 21.583.062.490	L. 0	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 23.582.626.975	L. 22.582.626.975	L. 0	L. 1.000.000.000	+ Lit. 999564485

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/11/00)
Opere Civili	12.900.000.000	17.779.347.544
Opere Impiantistiche	4.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	1.000.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>17.900.000.000</b>	<b>17.779.347.544</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	679.689.000	1.322.136.578
Altre Spese Tecniche	1.860.396.000	1.216.452.600
Allacciamenti		
Imprevisti	895.000.000	2.070.691.472
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	1.790.000.000	1.193.998.793
IVA al 20%	508.019.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.733.104.000</b>	<b>5.803.279.443</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>23.633.104.000</b>	<b>23.582.626.987</b>
	<b>Economie</b>	<b>-50.477.013</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	22.633.000.000	22.582.626.975
Risorse proprie	1.000.000.000	1.000.000.000
Altre fonti finanziarie		12
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>23.633.000.000</b>	<b>23.582.626.987</b>

Protocollo d'intervento: **7081****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO E RECUPERO COME CENTRO DI ACCOGLIENZA DELLA VILLA VESCOVILE IN LOC. PODERE ANGELETTI*

Comune **AMELIA (TR)**

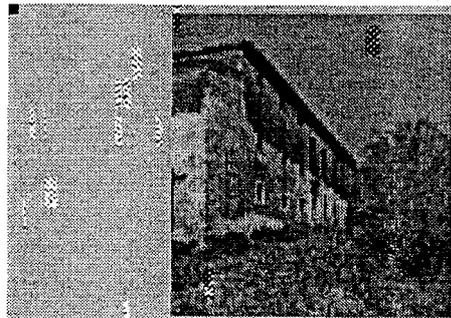
Finanziamento **L. 922 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 891.923.034**

- Tot. Pagato **L. 891.923.034**

Cofinanziamento **L. 300 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	11/08/98	02/09/98
Fine Lavori	11/07/99	30/10/99

*Villa vescovile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **91008370552**

Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 10** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 428236** **Telefax: 0744 428236**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	<b>LU.PI.CA. EDIL COSTRUZIONI SAS.</b>	<b>L. 850.000.000</b>	<b>L. 850.000.000</b>	<b>0,00</b>
	<b>CORSO DEL POPOLO,69-TERNI</b>			
	<b>00736010554</b>			
	<b>Totali</b>	<b>L. 850.000.000</b>	<b>L. 850.000.000</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.222.000.000	L. 922.000.000	L. 0	L. 300.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/11/00)
Opere Civili	600.000.000	599.689.813
Opere Impiantistiche	250.000.000	250.000.000
Arredi e/o Attrezzature	108.900.000	108.595.200
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>958.900.000</b>	<b>958.285.013</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	59.930.000	59.930.000
Altre Spese Tecniche	45.960.000	35.861.667
Allacciamenti		
Imprevisti	29.250.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		10.000.000
IVA al 10%	85.000.000	84.968.981
IVA al 20%	42.960.000	42.877.373
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>263.100.000</b>	<b>233.638.021</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.222.000.000</b>	<b>1.191.923.034</b>
	<b>Economic</b>	<b>-30.076.966</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	922.000.000	891.923.034
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.222.000.000</b>	<b>1.191.923.034</b>

Protocollo d'intervento: **7163****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMI DI DIFFUSIONE CULTURALI E RELIGIOSI*  
 Comune **FOLIGNO (PG)**  
 Finanziamento **L. 648 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 646.707.760**  
 - Tot. Pagato **L. 646.407.760**  
 Cofinanziamento **L. 150 milioni**

*Foligno e la Beata Angela***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI FOLIGNO**  
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
 C.Fis./P.IVA **00166560540**  
 Indirizzo **PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 10** **FOLIGNO (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 0742 357989** **Telefax: 0742 357989**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Scrittura privata	I teatranti dell'Olt Via Pagliarini, 16 - 06034 Folignano (PG) 0226890540	L. 798.000.000	L. 547.800.000	31,35
<b>Totali</b>		<b>L. 798.000.000</b>	<b>L. 547.800.000</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
Automatico	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 798.000.000	L. 648.000.000	L. 100.000.000	L. 50.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)	
Opere Civili	18.000.000	12.246.667	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>18.000.000</b>	<b>12.246.667</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	688.500.000	693.176.467	
IVA al 10%	49.800.000	49.800.000	
IVA al 20%	41.700.000	41.484.626	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>780.000.000</b>	<b>784.461.093</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>798.000.000</b>	<b>796.707.760</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-1.292.240</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	648.000.000	646.707.760	
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000	
Altre fonti finanziarie	100.000.000	100.000.000	
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>798.000.000</b>	<b>796.707.760</b>	

Protocollo d'intervento: **7171****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO DEL PALAZZO DEL CAPITOLO DEI CANONICI ANNESSO ALLA CATTEDRALE DI GUBBIO MUSEO DIOCESANO CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE*

Comune **GUBBIO (PG)**

Finanziamento **L. 4.079 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 4.072.526.172**

- Tot. Pagato **L. 4.072.526.172**

Cofinanziamento **L. 938 milioni**

Previsione	Effettiva	
Inizio Lavori	01/09/98	01/09/98
Fine Lavori	01/09/99	28/10/99

*Palazzo del Capitolo dei Canonici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CAPITOLO CANONICI DELLA CATTEDRALE**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **83000250544**

Indirizzo **LARGO VESCOVATO, 1** **GUBBIO (PG)**

Recapiti **Telefono: 075 9273980** **Telefax: 075 9273980**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT. PRIV.	ATI C.A.R.E.A. PIAZZA 40 MARTIRI,27-GUBBIO 00418460549	L. 3.525.809.932	L. 3.483.500.213	1,20
Totali		L. 3.525.809.932	L. 3.483.500.213	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.059.000.000	L. 4.121.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	- Lit. -42000000
DM 01/06/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
Automatico	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.017.000.000	L. 4.079.000.000	L. 0	L. 938.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/04/01)
Opere Civili	2.484.000.000	3.650.570.862
Opere Impiantistiche	1.042.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.526.000.000</b>	<b>3.650.570.862</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	674.000.000	565.926.120
Altre Spese Tecniche	108.000.000	215.934.000
Allacciamenti	44.000.000	47.228.400
Imprevisti	179.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	371.000.000	365.057.086
IVA al 20%	157.000.000	165.809.704
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.533.000.000</b>	<b>1.359.955.310</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.059.000.000</b>	<b>5.010.526.172</b>
	<b>Economie</b>	<b>-48.473.828</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	4.121.000.000	4.072.526.172
Risorse proprie	938.000.000	938.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.059.000.000</b>	<b>5.010.526.172</b>



## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/06/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 619.000.000	L. 569.000.000	L. 0	L. 50.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/11/01)
Opere Civili	300.000.000	495.859.585
Opere Impiantistiche	90.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>450.000.000</b>	<b>495.859.585</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	41.200.000	
Altre Spese Tecniche	15.500.000	99.277.792
Allacciamenti	6.300.000	6.709.200
Imprevisti	45.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		34.042.510
- Altre voci		
IVA al 10%	50.130.000	
IVA al 20%	11.340.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>169.470.000</b>	<b>140.029.502</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>619.470.000</b>	<b>635.889.087</b>
	Maggiore Spesa	16.419.087
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	569.000.000	564.457.017
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		21.432.070
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>619.000.000</b>	<b>635.889.087</b>

Protocollo d'intervento: **7235****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO UBICATO NEL BORGO MEDIOEVALE DI S. GREGORIO DA DESTINARE A STRUTTURA RICETTIVA*  
 Comune **ASSISI (PG)**  
 Finanziamento **836 milioni**  
     - Tot. Impegnato **L. 779.770.000**  
     - Tot. Pagato **L. 701.793.000**  
 Cofinanziamento **696 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
 Inizio Lavori                      *03/11/98*                      **18/11/98**  
 Fine Lavori                         *15/09/99*                      **30/12/99**



*Complesso edilizio ubicato nel borgo medioevale di S. Gregorio*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO**  
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**  
 C.Fis./P.IVA **94017420541**  
 Indirizzo **TORCHIAGINA** **ASSISI (PG)**  
 Recapiti **Telefono: 075 8039086** **Telefax:**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC.PRIVATA	DITTA BARDIN ROMOLO SPA. VIA LUNGARDO,76 BELLUNO 00136840253	L. 1.300.000.000	L. 1.246.700.000	4,10
<b>Totali</b>		<b>L. 1.300.000.000</b>	<b>L. 1.246.700.000</b>	
