

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.582.000.000	L. 870.000.000	L. 430.000.000	L. 282.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.531.770.000	L. 819.770.000	L. 0	L. 712.000.000	- Lit. -50230000
DM 01/06/99	L. 1.531.770.000	L. 819.770.000	L. 0	L. 712.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.531.770.000	L. 836.384.538	L. 0	L. 695.385.462	
DM 13/09/99	L. 1.531.770.000	L. 836.384.538	L. 0	L. 695.385.462	
DM 16/11/99	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
Automatico	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 21/07/00	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 01/08/00	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 14/12/00	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	
DM 14/02/01	L. 1.531.770.000	L. 835.797.861	L. 0	L. 695.972.139	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (**/**/)**	
Opere Civili	850.000.000	1.119.957.160	
Opere Impiantistiche	220.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	110.000.000	40.023.000	
Altre Voci	20.000.000	68.617.512	
TOTALE LAVORI	1.200.000.000		1.228.597.672
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	109.500.000	115.895.328	
Altre Spese Tecniche	43.500.000		
Allacciamenti	10.000.000		
Imprevisti	59.000.000	36.226.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	125.900.000	115.618.317	
IVA al 20%	34.550.000	38.651.558	
SOMME A DISPOSIZIONE	382.450.000		306.391.203
TOTALE COSTO	1.582.450.000		1.534.988.875
		Economie	-47.461.125
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	819.770.000		835.797.861
Risorse proprie	712.000.000		695.972.139
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.531.770.000		1.531.770.000

Protocollo d'intervento: **7266****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO COSTITUITO DALL'EX CHIESA DI S. ANGELO E SUE DIPENDENZE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER L'ACCOGLIENZA LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE*

Comune **TERNI (TR)**

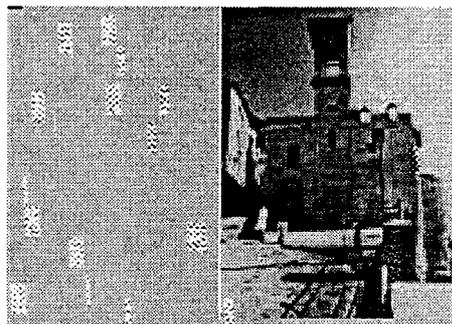
Finanziamento **L. 882 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 841.556.566**

- Tot. Pagato **L. 841.556.566**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/04/99	30/07/99
Fine Lavori	30/09/99	23/12/99

*Ex Chiesa di S. Angelo e sue dipendenze***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI TERNI**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00175660554**

Indirizzo **CORSO DEL POPOLO, 111** **TERNI (TR)**

Recapiti **Telefono: 0744 549540** **Telefax: 0744 549542**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
Gara d'appalto	LATTANZI S.R.L. VIA BEVAGNA, 15 ROMA 0563631002	L. 882.000.000	L. 667.174.712	24,36
Totali		L. 882.000.000	L. 667.174.712	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 920.000.000	L. 920.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -38000000
DM 21/07/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 882.000.000	L. 882.000.000	L. 0	L. 0	


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/02/01)	
Opere Civili	406.926.407	658.390.445	
Opere Impiantistiche	200.000.000	62.989.156	
Arredi e/o Attrezzature	145.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	751.926.407		721.379.601
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione		11.260.090	
Altre Spese Tecniche	39.000.000	24.480.000	
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000	
Imprevisti	30.346.320		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	63.727.273	65.839.043	
IVA al 20%	30.000.000	13.597.832	
SOMME A DISPOSIZIONE	168.073.593		120.176.965
TOTALE COSTO	920.000.000		841.556.566
		Economie	-78.443.434
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	920.000.000		841.556.566
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	920.000.000		841.556.566

Protocollo d'intervento: 7278

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO ESTETICO E FUNZIONALE DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI IN PORZIUNCOLA*
 Comune **ASSISI (PG)**
 Finanziamento **L. 9.418 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 9.417.877.336**
 - Tot. Pagato **L. 9.417.877.336**
 Cofinanziamento **L. 8.700 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **01/10/98** **03/09/98**
 Fine Lavori **31/08/99** **29/12/99**



Basilica di S. Maria degli Angeli in Porziuncola

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROV. SERAFICA DI S. FRANCESCO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **00160170544**
 Indirizzo **PIAZZA PORZIUNCOLA, 1** **ASSISI (PG)**
 Recapiti **Telefono: 075 80511** **Telefax: 075 8051510**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC. PRIV	ATI CARENA SPA/BONATTI SPA VIA DELLA PORTA DEGLI ARCHI,10/16 - GE 00271490104	L. 11.170.210.000	L. 8.396.646.857	24,83
Totali		L. 11.170.210.000	L. 8.396.646.857	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 16.575.000.000	L. 5.803.000.000	L. 10.772.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 13.579.571.000	L. 2.807.571.000	L. 0	L. 10.772.000.000	Lit. -2995429000
DM 01/06/99	L. 13.579.571.000	L. 2.807.571.000	L. 0	L. 10.772.000.000	
DM 05/08/99	L. 13.579.571.000	L. 4.587.697.302	L. 0	L. 8.991.873.698	
DM 13/09/99	L. 13.579.571.000	L. 4.587.697.302	L. 0	L. 8.991.873.698	
DM 16/11/99	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	+ Lit. 3700000000
Automatico	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 21/07/00	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 01/08/00	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 14/12/00	L. 17.279.571.000	L. 8.579.571.000	L. 0	L. 8.700.000.000	
DM 14/02/01	L. 18.117.877.336	L. 9.417.877.336	L. 0	L. 8.700.000.000	+ Lit. 838306336

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/06/01)
Opere Civili	9.818.000.000	9.322.292.709
Opere Impiantistiche	1.352.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	912.000.000	5.927.479.843
Altre Voci	745.000.000	
TOTALE LAVORI	12.827.000.000	15.249.772.552
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	631.000.000	714.400.940
Altre Spese Tecniche	777.000.000	985.135.000
Allacciamenti		
Imprevisti	559.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	28.000.000	31.256.719
IVA al 10%	1.172.000.000	1.374.880.171
IVA al 20%	581.000.000	619.012.670
SOMME A DISPOSIZIONE	3.748.000.000	3.724.685.500
TOTALE COSTO	16.575.000.000	18.974.458.052
	Maggiore Spesa	2.399.458.052
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.803.000.000	9.417.877.336
Risorse proprie	10.772.000.000	8.700.000.000
Altre fonti finanziarie		856.580.716
TOTALE COPERTURE	16.575.000.000	18.974.458.052

Protocollo d'intervento: **7323****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento REALIZZAZIONE DI SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA ALL'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI VISITATORI PER L'ACCESSO ALLA BASILICA DI S. RITA DA CASCIA
Comune CASCIA (PG)
Finanziamento L. 5.953 milioni
 - Tot. Impegnato L. 5.952.698.000
 - Tot. Pagato L. 5.946.962.491
Cofinanziamento L. 6.124 milioni
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 01/08/98 07/08/98
Fine Lavori 15/08/99 31/10/99



Sistemi per l'accesso alla Basilica di S. Rita da Cascia

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI CASCIA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA @CASCIA
Indirizzo PIAZZA ALDO MORO CASCIA (PG)
Recapiti Telefono: 0743 71220 Telefax:

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LIC.PRIV.	DE.CO.SRL. VIA SATURNIA ,49-ROMA 00920551009	L. 4.641.650.000	L. 3.847.927.850	17,10
Totali		L. 4.641.650.000	L. 3.847.927.850	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

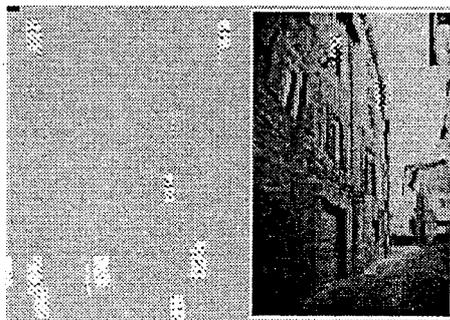
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 13.078.000.000	L. 6.954.000.000	L. 6.124.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	- Lit. -1000802000
DM 01/06/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 05/08/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 13/09/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 16/11/99	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
Automatico	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 21/07/00	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 01/08/00	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 14/12/00	L. 12.077.198.000	L. 5.953.198.000	L. 0	L. 6.124.000.000	
DM 14/02/01	L. 12.076.698.000	L. 5.952.698.000	L. 0	L. 6.124.000.000	- Lit. -500000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/05/01)
Opere Civili	4.854.379.000	
Opere Impiantistiche	3.601.547.000	
Arredi e/o Attrezzature	686.742.000	
Altre Voci	230.000.000	
TOTALE LAVORI	9.372.668.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	733.734.000	
Altre Spese Tecniche	814.878.000	
Allacciamenti	92.652.000	
Imprevisti	167.141.000	
- Espropri o Acquisizioni	75.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	266.955.000	
IVA al 10%	449.475.000	
IVA al 20%	1.105.601.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	3.705.436.000	0
TOTALE COSTO	13.078.104.000	12.071.462.491
	Economie	-1.006.641.509
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	6.954.000.000	5.947.462.491
Risorse proprie	6.124.000.000	6.124.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	13.078.000.000	12.071.462.491

Protocollo d'intervento: **7377****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DA DESTINARE AD OSTELLO DELLA GIOVENTU' VIA BONTEMPI 13*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 1.936 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.880.996.112**- Tot. Pagato **L. 1.880.996.112**Cofinanziamento **L. 230 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *06/07/99* **14/09/98**Fine Lavori *27/09/99* **30/12/99***Immobile di interesse storico artistico sito in via Bontempi 13***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **OPERA PIA M. PAOLETTI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80004290542**Indirizzo **VIA BONTEMPI, 13****PERUGIA (PG)**Recapiti **Telefono: 075 5726910****Telefax: 075 5732672****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	CINGOLI N. & FIGLIO SRL. VIA ACQUAVIVA N° 11 -TERAMO 00219940673	L. 1.399.250.000	L. 1.348.500.000	3,63
Totali		L. 1.399.250.000	L. 1.348.500.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

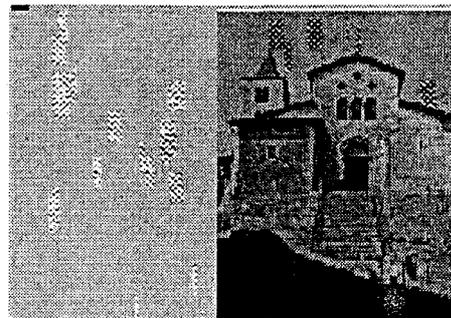
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.230.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000 - Lit. -64000000	
DM 13/09/99	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
Automatico	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.166.000.000	L. 1.936.000.000	L. 0	L. 230.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)
Opere Civili	1.200.000.000	
Opere Impiantistiche	250.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.650.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	98.000.000	
Altre Spese Tecniche	10.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	165.000.000	
IVA al 10%	145.000.000	
IVA al 20%	62.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	580.000.000	0
TOTALE COSTO	2.230.000.000	2.110.996.112
	Economiche	-119.003.888
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.880.996.112
Risorse proprie	230.000.000	230.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.230.000.000	2.110.996.112

Protocollo d'intervento: **7394****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ABBAZIA DI S. CASSIANO AL FINE DI
CONSENTIRE L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI*Comune **NARNI (TR)**Finanziamento **L. 961 milioni**- Tot. Impegnato **L. 949.313.199**- Tot. Pagato **L. 949.313.199**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/08/98* **26/01/99**Fine Lavori *11/07/99* **28/12/99***Abbazia di S. Cassiano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI TERNI NARNI AMELIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **91008370552**Indirizzo **PIAZZA DUOMO, 11****TERNI (TR)**Recapiti **Telefono: 0774 426237****Telefax: 0744 426237****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATT.PRIV.	IMPRESA STRUZZI VIA DEL LEONE,32 TERNI 00097010551	L. 683.900.000	L. 683.900.000	0,00
Totali		L. 683.900.000	L. 683.900.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 961.000.000	L. 961.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/07/01)	
Opere Civili	549.900.000	716.119.999	
Opere Impiantistiche	134.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	743.900.000		716.119.999
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	42.735.000		
Altre Spese Tecniche	34.655.000	77.390.000	
Allacciamenti	7.000.000		
Imprevisti	35.440.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature		57.261.000	
- Altre voci			
IVA al 10%	68.390.000	71.612.000	
IVA al 20%	28.880.000	26.930.200	
SOMME A DISPOSIZIONE	217.100.000		233.193.200
TOTALE COSTO	961.000.000		949.313.199
	Economie		-11.686.801
COPERTURA FINANZIARIA			
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Risorse proprie	961.000.000		949.313.199
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	961.000.000		949.313.199

Protocollo d'intervento: **7401****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO FUNZIONALE DI UN IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ED ARCHITETTONICO DA DESTINARE A ACCOGLIENZA A BASSO COSTO*Comune **PERUGIA (PG)**Finanziamento **L. 1.119 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.118.653.000**- Tot. Pagato **L. 1.118.653.000**Cofinanziamento **L. 62 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **22/07/98 07/09/98**Fine Lavori **27/09/99 26/08/99**

*Immobile di interesse storico artistico sito in
località Monte Morcino*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTODenominazione **SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI PERUGIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80001130543**Indirizzo **STRADA S. GALIGANO S. LUCIA, 12/A PERUGIA (PG)**Recapiti **Telefono: 075 5726910 Telefax: 075 5726910****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA ERCOLANETTI MAURIZIO FRAZ. S. VITALE,180-ASSISI-PG	L. 700.000.000	L. 629.230.000	10,11
Totali		L. 700.000.000	L. 629.230.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.262.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	- Lit. -70770000
DM 01/06/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
Automatico	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.191.230.000	L. 1.129.230.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.180.653.000	L. 1.118.653.000	L. 0	L. 62.000.000	- Lit. -10577000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/09/01)
Opere Civili	700.000.000	749.230.000
Opere Impiantistiche	150.000.000	147.000.000
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	52.883.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	950.000.000	949.113.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	51.000.000	60.178.580
Altre Spese Tecniche	8.000.000	3.823.404
Allacciamenti		
Imprevisti	43.000.000	48.457.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	93.000.000	
IVA al 10%	85.000.000	94.468.700
IVA al 20%	32.000.000	30.789.316
SOMME A DISPOSIZIONE	312.000.000	237.717.000
TOTALE COSTO	1.262.000.000	1.186.830.000
	Economie	-75.170.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.200.000.000	1.118.653.000
Risorse proprie	62.000.000	62.000.000
Altre fonti finanziarie		6.176.596
TOTALE COPERTURE	1.262.000.000	1.186.829.596

Protocollo d'intervento: **7416****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CASA DEL PELLEGRINO PER L'ACCOGLIENZA A BASSO COSTO IN ROCCAPORENA*
 Comune **CASCIA (PG)**
 Finanziamento **L. 3.630 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 3.629.776.690**
 - Tot. Pagato **L. 3.629.776.690**
 Cofinanziamento **L. 1.190 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *06/06/98* *06/08/98*
 Fine Lavori *05/08/99* *04/09/99*

*Santuario di S. Rita in Roccaporena***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CHIESA SANTUARIO DI S. RITA**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **84001560543**
 Indirizzo **FRAZIONE ROCCAPORENA** **CASCIA (PG)**
 Recapiti **Telefono: 0743 76947** **Telefax: 0743 76947**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LIC.PRIV.	IMPRESA EDIL 2000 SRL. VIA GARIGLIANO ,15 ORVIETO-TR- 00259610558	L. 2.981.551.647	L. 2.633.902.704	11,66
Totali		L. 2.981.551.647	L. 2.633.902.704	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.322.000.000	L. 3.890.000.000	L. 0	L. 432.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.974.351.078	L. 3.542.351.078	L. 0	L. 432.000.000	- Lit. -347648922
DM 01/06/99	L. 4.121.813.054	L. 3.542.351.078	L. 0	L. 579.461.976	+ Lit. 147461976
DM 05/08/99	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	+ Lit. 157493422
DM 13/09/99	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 16/11/99	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
Automatico	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 21/07/00	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 01/08/00	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 14/12/00	L. 4.279.306.476	L. 3.699.844.500	L. 0	L. 579.461.976	
DM 14/02/01	L. 4.819.306.476	L. 3.629.776.690	L. 0	L. 1.189.529.786	+ Lit. 540000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/09/01)
Opere Civili	2.860.000.000	3.804.403.813
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	360.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.160.000.000	4.164.403.813
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	342.000.000	418.608.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	20.000.000	
Imprevisti	81.000.000	13.591.560
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		157.493.062
IVA al 10%		
IVA al 20%	719.000.000	65.210.041
SOMME A DISPOSIZIONE	1.162.000.000	654.902.663
TOTALE COSTO	4.322.000.000	4.819.306.476
	Maggiore Spesa	497.306.476
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.890.000.000	3.629.776.690
Risorse proprie	432.000.000	579.461.976
Altre fonti finanziarie		610.067.810
TOTALE COPERTURE	4.322.000.000	4.819.306.476

PAGINA BIANCA
