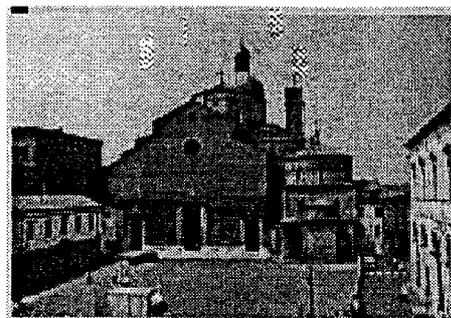


## VENETO

Protocollo d'intervento: **233****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CATTEDRALE DI PADOVA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 4.343 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.343.130.473**- Tot. Pagato **L. 4.343.130.473**Cofinanziamento **L. 1.282 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/08/98* **27/10/98**Fine Lavori *30/09/99* **20/12/99***Cattedrale di Padova***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI PADOVA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92026380284**Indirizzo **VIA DIETRO DUOMO, 15****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8226111****Telefax: 049 8226150****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 5.250.000.000	L. 4.541.027.703	13,50
<b>Totali</b>		<b>L. 5.250.000.000</b>	<b>L. 4.541.027.703</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 06/08/98	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 20/11/98	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 27/01/99	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 09/02/99	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 01/06/99	L. 6.426.000.000	L. 5.144.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	- Lit. -800000000
DM 13/09/99	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
Automatico	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.626.000.000	L. 4.344.000.000	L. 0	L. 1.282.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.625.130.473	L. 4.343.130.473	L. 0	L. 1.282.000.000	- Lit. -869527

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/09/00)
Opere Civili	4.560.000.000	4.995.129.189
Opere Impiantistiche	220.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.780.000.000</b>	<b>4.995.129.189</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		642.600.000
Altre Spese Tecniche	525.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	489.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	527.000.000	
IVA al 20%	105.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.646.000.000</b>	<b>642.600.000</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>6.426.000.000</b>	<b>5.637.729.189</b>
	Economie	-788.270.811
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	5.144.000.000	4.343.130.473
Risorse proprie	1.282.000.000	1.282.000.000
Altre fonti finanziarie		12.598.716
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>6.426.000.000</b>	<b>5.637.729.189</b>

Protocollo d'intervento: **245****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 4.443 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.443.414.791**- Tot. Pagato **L. 4.443.414.791**Cofinanziamento **L. 1.188 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/08/98* **07/10/98**Fine Lavori *30/09/98* **25/10/99***Palazzo vescovile - Museo diocesano d'arte sacra***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOCESI DI PADOVA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92026380284**Indirizzo **VIA DIETRO DUOMO, 15****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8226111****Telefax: 049 8226150****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	COGES SRL COSTRUZIONI GENERALI VIA BEGGIO 1, PADOVA 01461790287	L. 350.000.000	L. 339.500.000	3,00
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 4.745.940.000	L. 4.310.877.083	9,17
<b>Totali</b>		<b>L. 5.095.940.000</b>	<b>L. 4.650.377.083</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.936.000.000	L. 4.748.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	- Lit. -293000000
DM 13/09/99	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 16/11/99	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
Automatico	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 21/07/00	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.643.000.000	L. 4.455.000.000	L. 0	L. 1.188.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.631.414.791	L. 4.443.414.791	L. 0	L. 1.188.000.000	- Lit. -11585209

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/09/00)
Opere Civili	3.100.000.000	4.310.876.363
Opere Impiantistiche	1.000.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	350.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>4.450.000.000</b>	<b>4.310.876.363</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	459.000.000	459.000.000
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	445.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		374.500.000
IVA al 10%	490.000.000	468.537.635
IVA al 20%	92.000.000	91.800.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.486.000.000</b>	<b>1.393.837.635</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.936.000.000</b>	<b>5.704.713.998</b>
	<b>Economie</b>	<b>-231.286.002</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	4.748.000.000	4.443.414.791
Risorse proprie	1.188.000.000	1.188.000.000
Altre fonti finanziarie		73.299.207
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.936.000.000</b>	<b>5.704.713.998</b>

Protocollo d'intervento: **375****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OPERE RELATIVE ALL'OTTENIMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE PER COMPLESSO  
COMPLEMENTARE RICETTIVO*


Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 790 milioni**  
- Tot. Impegnato **L. 789.600.000**  
- Tot. Pagato **L. 789.600.000**

Cofinanziamento **L. 1.700 milioni**  
Previsione Effettiva

Inizio Lavori *05/04/99* **03/05/99**

Fine Lavori *15/10/99* **30/12/99**

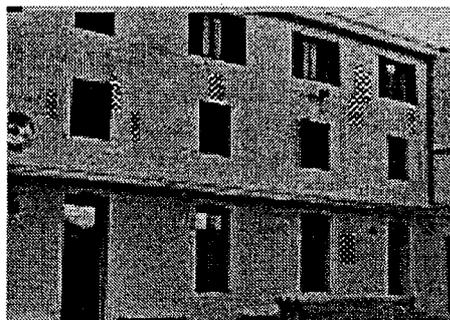*Ex Istituto degli Artigianelli***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. REL. DI S. MARZIANO DON ORIONE**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **02541960155**

Indirizzo **VIA CATERINA DA FORLÌ, 19 MILANO (MI)**

Recapiti **Telefono: 02 4294429 Telefax: 02 4294461**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	SOCIETA' BERGER SRL VIA DEL RICORDO 55, MILANO 11586470152	L. 167.740.000	L. 167.740.000	0,00
	SOC. TONELLO SERVIZI SNC DI TONELLO A. E G. VIA BAITE 6, ODERZO (TV) 02356950267	L. 270.286.000	L. 270.286.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	IMPRESA SCHIAVINA VIE DEL LAVORO	L. 359.366.310	L. 359.366.310	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	IMPRESA GEOM. ENRICO SCHIAVINA VIA DEL LAVORO 85, CASALECCHIO DI RENO (BO) 00209000371	L. 1.499.850.637	L. 1.499.850.637	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 2.297.242.947</b>	<b>L. 2.297.242.947</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
Automatico	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.490.000.000	L. 790.000.000	L. 0	L. 1.700.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/03/01)	
Opere Civili	1.450.000.000	1.799.216.130	
Opere Impiantistiche	150.000.000	438.026.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.800.000.000</b>		<b>2.237.242.130</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	126.000.000	127.357.870	
Altre Spese Tecniche	54.000.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	90.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	3.600.000		
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	416.000.000	125.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>689.600.000</b>		<b>252.357.870</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.489.600.000</b>		<b>2.489.600.000</b>
			0
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	790.000.000	789.600.000	
Risorse proprie	1.700.000.000	1.700.000.000	
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.490.000.000</b>		<b>2.489.600.000</b>

Protocollo d'intervento: **625****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO CONSERVATIVO DEL MONASTERO DI LENDINARA  
**Comune** LENDINARA (RO)  
**Finanziamento** L. 1.723 milioni  
 - Tot. Impegnato L. 1.723.436.879  
 - Tot. Pagato L. 1.723.436.879  
**Cofinanziamento** L. 550 milioni  
     Previsione Effettiva  
**Inizio Lavori** 15/09/98 15/09/98  
**Fine Lavori** 15/09/99 31/10/99

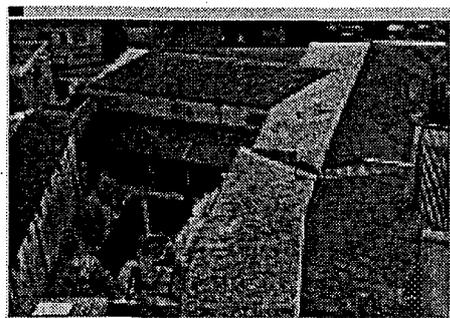

Monastero di Nostra Signora del Pilastrello

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA  
**Categoria** AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);  
**C.Fis./P.IVA** 00087990529  
**Indirizzo** MONTEOLIVETO MAGGIORE ASCIANO (SI)  
**Recapiti** Telefono: 0577 707017 Telefax: 0577 707070

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	MOBILI AL SANTUARIO VIA SANTUARIO 46, LENDINARA (RO) 007690800292	L. 165.000.000	L. 163.000.000	1,21
TRATTATIVA PRIVATA	SACRAMATI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 1.550.000.000	L. 136.270.000	91,21
<b>Totali</b>		L. 1.715.000.000	L. 299.270.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.374.000.000	L. 1.824.000.000	L. 400.000.000	L. 150.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -197003000
DM 01/06/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.176.997.000	L. 1.626.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
Automatico	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	+ Lit. 99000000
DM 21/07/00	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.275.997.000	L. 1.725.997.000	L. 0	L. 550.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.273.436.879	L. 1.723.436.879	L. 0	L. 550.000.000	- Lit. -2560121

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE


A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/05/00)
Opere Civili	1.200.000.000	
Opere Impiantistiche	350.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	165.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.715.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	237.000.000	
Altre Spese Tecniche	73.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	77.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	6.000.000	
- Opere Impiantistiche	2.500.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	163.500.000	
IVA al 20%	100.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>659.500.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.374.500.000</b>	<b>2.273.436.879</b>
	Economie	-101.063.121
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.824.000.000	1.723.436.879
Risorse proprie	550.000.000	550.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.374.000.000</b>	<b>2.273.436.879</b>

Protocollo d'intervento: 713

## DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PARCHEGGIO DELL'ABBAZIA DI PRAGLIA*Comune **TEOLO (PD)**Finanziamento **L. 1.272 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.230.662.700**- Tot. Pagato **L. 1.107.596.430**Cofinanziamento **L. 485 milioni**

Previsione Effettiva

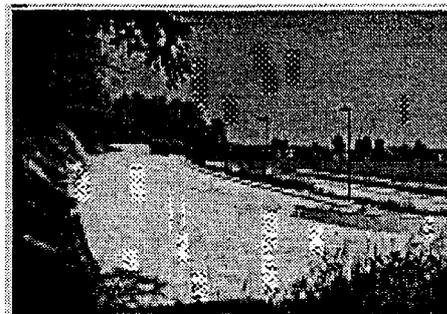Inizio Lavori *01/11/98* **03/11/98**Fine Lavori *01/06/99* **21/10/99***Abbazia di Praglia*

## DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI TEOLO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **80010150284**Indirizzo **VIA EUGANEA, 34****TREPONTI TEOLO (PD)**Recapiti **Telefono: 049 9998511****Telefax: 049 9900264**

## DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
MASSIMO RIBASSO SULL'IMPORTO	MURANO GEOM. FRANCESCO VIA C. DA RISI COLI 8, LUZZI (CS) MRNFNC66A28E773E	L. 1.120.000.000	L. 992.511.000	11,38
		Totali	L. 1.120.000.000	L. 992.511.000

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.760.000.000	L. 1.408.000.000	L. 252.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	- Lit. -187337300
DM 01/06/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.572.662.700	L. 1.220.662.700	L. 0	L. 352.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.627.207.400	L. 1.275.207.400	L. 0	L. 352.000.000	+ Lit. 54544700
Automatico	L. 1.627.207.400	L. 1.275.207.400	L. 0	L. 352.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.627.207.400	L. 1.275.207.400	L. 0	L. 352.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.624.021.347	L. 1.272.021.347	L. 0	L. 352.000.000	- Lit. -3186053
DM 14/12/00	L. 1.624.021.347	L. 1.272.021.347	L. 0	L. 352.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.756.813.947	L. 1.272.021.347	L. 0	L. 484.792.600	+ Lit. 132792600

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (14/04/00)
Opere Civili	806.007.000	
Opere Impiantistiche	295.605.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	68.388.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.170.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	161.000.000	
Altre Spese Tecniche	28.500.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	30.550.000	
- Espropri o Acquisizioni	200.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	5.000.000	
IVA al 10%	120.050.000	
IVA al 20%	39.900.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>590.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>1.627.207.400</b>
	<b>Economie</b>	<b>-132.792.600</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	1.408.000.000	1.275.207.400
Risorse proprie	352.000.000	352.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.760.000.000</b>	<b>1.627.207.400</b>

Protocollo d'intervento: **981****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO D'ACCOGLIENZA PELLEGRINI PER GIOVANI E ANZIANI*  
 Comune **VENEZIA (VE)**  
 Finanziamento **L. 2.455 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 2.454.891.386**  
 - Tot. Pagato **L. 2.454.891.386**  
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**



*Palazzo Ca' Cappello Memmo e Ca' Cappello,  
attuale sede dell'Istituto Provinciale per  
l'Infanzia*

**DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **IST. PROV. PER L'INFANZIA S.MARIA**  
 Categoria **AB Enti pubblici**  
 C.Fis./P.IVA **80009610272**  
 Indirizzo **CASTELLO** **VENEZIA (VE)**  
 Recapiti **Telefono: 041 5222171** **Telefax: 041 5204431**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
A RIBASSO D'ASTA	PA. CO. PACIFICO COSTRUZIONI SRL LARGO S. ORSOLA A CHIAIA 6, NAPOLI 01447350636	L. 1.850.000.000	L. 1.802.876.333	2,55
<b>Totali</b>		<b>L. 1.850.000.000</b>	<b>L. 1.802.876.333</b>	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.500.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.454.891.386	L. 2.454.891.386	L. 0	L. 0	- Lit. -45108614

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (13/09/01)
Opere Civili	1.400.000.000	1.802.876.333
Opere Impiantistiche	400.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	154.618.200
Altre Voci	500.000.000	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>1.957.494.533</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione		150.000.000
Altre Spese Tecniche		11.923.800
Allacciamenti		14.194.040
Imprevisti		127.123.667
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		450.859.640
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>0</b>	<b>754.101.147</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.711.595.680</b>
	Maggiore Spesa	211.595.680
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.711.595.680
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>2.711.595.680</b>

Protocollo d'intervento: **1059****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI RESTAURO ED ADATTAMENTO DELL'EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' A BASSO COSTO DEI PELLEGRINI*

Comune **CONEGLIANO (TV)**

Finanziamento **L. 4.003 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 3.902.605.205**

- Tot. Pagato **L. 3.902.605.205**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/98** **02/12/98**

Fine Lavori **15/10/99**

*Ex Convento di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI CONEGLIANO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **82002490264**

Indirizzo **P.ZZA G. B. CIMA, 8** **CONEGLIANO (TV)**

Recapiti **Telefono: 0438 4131** **Telefax: 0438 410564**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA		Ribasso	
GARA UFFICIOSA	PROPOSTA SAS PREGANZIOL (TV)	L. 55.900.000	L. 55.899.400	0,00
PUBBLICO INCANTO	R.C.A. RESTAURI E COSTRUZIONI ALBANESE SRL VIA SPAGNA 16, PALERMO 04576490827	L. 3.329.446.136	L. 2.826.699.770	15,10
<b>Totali</b>		<b>L. 3.385.346.136</b>	<b>L. 2.882.599.170</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 5.000.000.000	L. 5.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.003.049.747	L. 4.003.049.747	L. 0	L. 0	- Lit. -996950253

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/09/01)
Opere Civili	2.655.000.000	2.883.760.112
Opere Impiantistiche	530.520.000	
Arredi e/o Attrezzature	638.880.000	55.899.400
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>3.824.400.000</b>	<b>2.939.659.512</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	280.000.000	324.161.908
Altre Spese Tecniche	320.000.000	231.524.925
Allacciamenti		
Imprevisti	73.160.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	382.440.000	288.376.012
IVA al 20%	120.000.000	118.882.848
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.175.600.000</b>	<b>962.945.693</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>3.902.605.205</b>
	Economie	-1.097.394.795
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
Finanziamento ex 270/97	di progetto (Lire)	finale (Lire)
	5.000.000.000	3.902.605.205
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>3.902.605.205</b>

Protocollo d'intervento: **1124****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO ACCOGLIENZA TORRI*  
Comune **ARCUGNANO (VI)**  
Finanziamento **L. 490 milioni**  
- Tot. Impegnato **L. 487.828.077**  
- Tot. Pagato **L. 487.828.077**  
Cofinanziamento **L. 119 milioni**

*Centro di Accoglienza Torri***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI ARCUGNANO**  
Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**  
C.Fis./P.IVA **00176710242**  
Indirizzo **VIA TORRI 19/21** **ARCUGNANO (VI)**  
Recapiti **Telefono: 0444 530622** **Telefax: 0444 240450**
