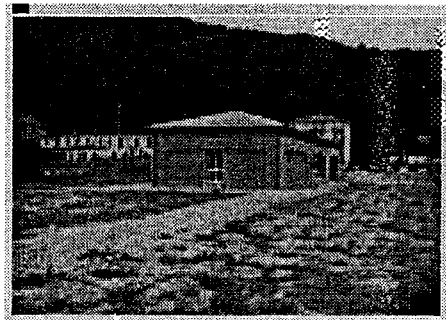


RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 529.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 529.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 529.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	+ Lit. 119000000
Automatico	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 21/07/00	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 01/08/00	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 14/12/00	L. 648.000.000	L. 529.000.000	L. 0	L. 119.000.000	
DM 14/02/01	L. 608.526.068	L. 489.526.068	L. 0	L. 119.000.000	- Lit. -39473932

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (07/08/01)
Opere Civili	421.078.000	391.208.477
Opere Impiantistiche	84.806.000	78.791.523
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	505.884.000	470.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	63.813.000	67.455.412
Altre Spese Tecniche	5.058.000	5.058.856
Allacciamenti	2.000.000	
Imprevisti	2.235.000	3.822.727
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	3.614.000	
IVA al 10%	50.588.400	47.000.000
IVA al 20%	14.806.900	13.491.082
SOMME A DISPOSIZIONE	142.115.300	136.828.077
TOTALE COSTO	647.999.300	606.828.077
	Economie	-41.171.223
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	529.000.000	487.828.077
Risorse proprie	119.000.000	119.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	648.000.000	606.828.077

Protocollo d'intervento: **1125****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CENTRO ACCOGLIENZA S. AGOSTINO*Comune **ARCUGNANO (VI)**Finanziamento **L. 446 milioni**- Tot. Impegnato **L. 444.428.875**- Tot. Pagato **L. 444.428.875**Cofinanziamento **L. 51 milioni***Centro di accoglienza S. Agostino***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI ARCUGNANO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00176710242**Indirizzo **VIA TORRI 19/21****ARCUGNANO (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 530622****Telefax: 0444 240450**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

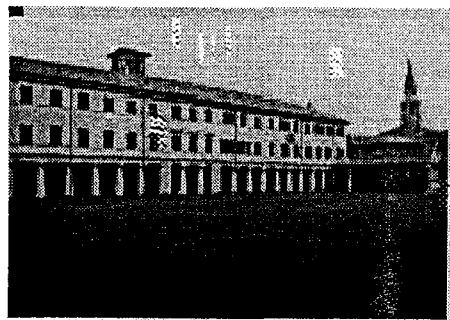
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 473.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	+ Lit. 51000000
DM 21/07/00	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	
DM 01/08/00	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	
DM 14/12/00	L. 524.000.000	L. 473.000.000	L. 0	L. 51.000.000	
DM 14/02/01	L. 496.777.166	L. 445.777.166	L. 0	L. 51.000.000	- Lit. -27222834

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (26/06/01)
Opere Civili	313.412.422	313.412.166
Opere Impiantistiche	58.624.578	58.624.783
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	372.037.000	372.036.949
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	67.437.000	67.465.526
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	4.000.000	2.028.000
Imprevisti	2.342.466	2.545.456
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbicato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	37.203.700	37.458.239
IVA al 20%	13.757.000	13.894.705
SOMME A DISPOSIZIONE	124.740.166	123.391.926
TOTALE COSTO	496.777.166	495.428.875
	Economie	-1.348.291
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	449.477.166	444.428.875
Risorse proprie	47.300.000	51.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	496.777.166	495.428.875

Protocollo d'intervento: **1264****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ACCOGLIENZA CULTURALE RELIGIOSA NEL COLLEGIO MARCONI*Comune **PORTOGRUARO (VE)**Finanziamento **L. 2.830 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.830.000.000**- Tot. Pagato **L. 2.828.436.131**Cofinanziamento **L. 1.020 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **24/08/98 13/08/98**Fine Lavori **24/08/99 27/10/99***Collegio Marconi***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **FONDAZIONE COLLEGIO MARCONI**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **83002490270**Indirizzo **VIA SEMINARIO, 34****PORTOGRUARO (VE)**Recapiti **Telefono: 0421 71014****Telefax: 0421 72497****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
APPALTO INTEGRATO, PUBBLICO INCANTO	SETTEN GENESIO SRL BASALGHELLE DI MANSUE' (TV) 00705200269	L. 2.881.553.875	L. 2.738.837.101	4,95
Totali		L. 2.881.553.875	L. 2.738.837.101	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.400.000.000	L. 2.380.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.261.324.811	L. 2.241.324.811	L. 0	L. 1.020.000.000	- Lit. -138675189
DM 01/06/99	L. 3.261.324.811	L. 2.241.324.811	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	+ Lit. 588775189
DM 13/09/99	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
Automatico	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.850.100.000	L. 2.830.100.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.850.000.000	L. 2.830.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	- Lit. -100000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/05/99)
Opere Civili	1.995.000.000	3.285.877.903
Opere Impiantistiche	870.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.865.000.000	3.285.877.903
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	143.250.000	151.473.413
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	20.000.000	5.521.280
Imprevisti	49.636.364	32.600.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		7.547.339
IVA al 10%	293.463.636	328.587.790
IVA al 20%	28.650.000	36.828.406
SOMME A DISPOSIZIONE	535.000.000	562.558.228
TOTALE COSTO	3.400.000.000	3.848.436.131
	Maggiore Spesa	448.436.131
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.380.000.000	2.828.436.131
Risorse proprie	1.020.000.000	1.020.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.400.000.000	3.848.436.131

Protocollo d'intervento: **1337****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PROGETTO DI RESTAURO E AMPLIAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DISMESSE DI GIARE DA DESTINARE AD OSTELLO</i>	
Comune	MIRA (VE)	
Finanziamento	L. 917 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 900.621.291
	- Tot. Pagato	L. 810.559.401
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>11/12/98</i>	<i>11/12/98</i>
Fine Lavori	<i>28/06/99</i>	<i>03/08/99</i>

*Scuole elementari dismesse di Giare***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI MIRA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00368570271	
Indirizzo	PIAZZA 9 MARTIRI	MIRA (VE)
Recapiti	Telefono: 041 5628211	Telefax: 041 5628354

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	INGROSS FORNITURE SRL ROVIGO	L. 65.240.000	L. 52.266.000	19,89
PUBBLICO INCANTO	C.I.P.E.A. SCRL VIA ARCOVEGGIO 49/5, RIOVEGGIO (BO) 03047870377	L. 726.222.337	L. 650.114.237	10,48
Totali		L. 791.462.337	L. 702.380.237	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

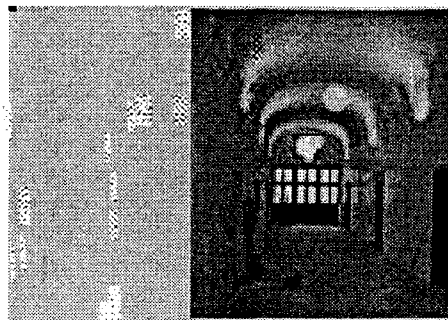
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.000.000.000	L. 1.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -83000000
DM 13/09/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 917.000.000	L. 917.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/05/99)
Opere Civili	550.000.000	576.000.000
Opere Impiantistiche	160.000.000	74.000.000
Arredi e/o Attrezzature	103.000.000	78.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	813.000.000	728.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	48.000.000	48.000.000
Altre Spese Tecniche		36.000.000
Allacciamenti	6.000.000	6.000.000
Imprevisti	5.000.000	7.000.000
- Espropri o Acquisizioni	26.000.000	26.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	31.000.000	
IVA al 10%	71.000.000	66.000.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	187.000.000	189.000.000
TOTALE COSTO	1.000.000.000	917.000.000
	Economie	-83.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.000.000.000	917.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.000.000.000	917.000.000

Protocollo d'intervento: **1344****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO CELLERARIA BENEDETTINA DI CORREZZOLA*Comune **CORREZZOLA (PD)**Finanziamento **L. 1.686 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.685.571.424**- Tot. Pagato **L. 1.685.571.425**Cofinanziamento **L. 720 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **04/11/98 23/11/98**Fine Lavori **31/07/99 30/10/99***Celleraria benedettina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CORREZZOLA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **01810450286**Indirizzo **VIA GARIBALDI 41****CORREZZOLA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 5807007****Telefax: 049 5807013****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	GRUPPO 5 SRL VIA MONTEGRAPPA 27, ZANE' (VI) 00859860249	L. 199.130.000	L. 165.222.000	17,03
LICITAZIONE PRIVATA	ARIENTI COSTRUZIONI SRL VIA ROMEA 41, PORTOVIRO (RO) 00793220294	L. 1.243.835.269	L. 1.169.510.640	5,98
Totali		L. 1.442.965.269	L. 1.334.732.640	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.400.000.000	L. 1.680.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0 - Lit. -37000000	
DM 13/09/99	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
Automatico	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.363.000.000	L. 1.643.000.000	L. 720.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.405.571.824	L. 1.685.571.824	L. 720.000.000	L. 0 + Lit. 42571824	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/10/01)	
Opere Civili	800.000.000	848.142.055	
Opere Impiantistiche	400.000.000	376.851.930	
Arredi e/o Attrezzature	200.000.000	165.222.000	
Altre Voci	500.000.000	500.000.000	
TOTALE LAVORI	1.900.000.000	1.890.215.985	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	80.000.000	209.797.971	
Altre Spese Tecniche	100.000.000	84.018.916	
Allacciamenti	15.000.000	9.347.960	
Imprevisti	55.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	34.000.000	12.240.000	
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	120.000.000	122.499.398	
IVA al 20%	96.000.000	77.451.994	
SOMME A DISPOSIZIONE	500.000.000	515.356.239	
TOTALE COSTO	2.400.000.000	2.405.572.224	
	Maggiore Spesa	5.572.224	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	1.680.000.000	1.685.572.224	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie	720.000.000	720.000.000	
TOTALE COPERTURE	2.400.000.000	2.405.572.224	

Protocollo d'intervento: **1432****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI*

Comune **PADOVA (PD)**

Finanziamento **L. 2.813 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.811.864.250**

- Tot. Pagato **L. 2.811.864.250**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *11/01/99* *11/01/99*

Fine Lavori *15/09/99* *10/12/99*



Percorso attrezzato fra stazione ferroviaria e Basilica del Santo

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI PADOVA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00644060287**

Indirizzo **VIA DEL MUNICIPIO, 1**

PADOVA (PD)

Recapiti **Telefono: 049 8205111**

Telefax: 049 82052225

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	A.T.I. tra S.I.E. e R.E.T.I.C.E. S.r.l. CONSELVE (PD)	L. 960.000.000	L. 760.945.000	20,73
ASTA PUBBLICA	BEMBO SRL DE ZUANE ANTONIO (PRES.) PIAZZA GIOVANELLI 8, NOVENTA PADOVANA (PD) 0347119288	L. 1.645.000.000	L. 1.514.222.500	7,95
Totali		L. 2.605.000.000	L. 2.275.167.500	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

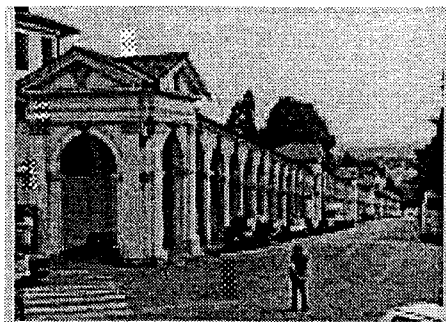
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -143000000
DM 16/11/99	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.857.000.000	L. 2.857.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.812.719.500	L. 2.812.719.500	L. 0	L. 0	- Lit. -44280500

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/10/01)
Opere Civili	1.300.000.000	1.539.619.101
Opere Impiantistiche	1.050.000.000	864.277.901
Arredi e/o Attrezzature	100.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.450.000.000	2.403.897.002
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	170.000.000	41.197.800
Altre Spese Tecniche	40.000.000	102.918.963
Allacciamenti	10.000.000	6.393.300
Imprevisti	20.000.000	16.450.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	14.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	235.000.000	240.389.702
IVA al 20%	61.000.000	25.992.772
SOMME A DISPOSIZIONE	550.000.000	433.342.537
TOTALE COSTO	3.000.000.000	2.837.239.539
	Economie	-162.760.461
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.000.000.000	2.837.239.539
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.000.000.000	2.837.239.539

Protocollo d'intervento: **1728****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 1.976 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.336.762.166**- Tot. Pagato **L. 1.305.631.085**Cofinanziamento **L. 27 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **09/12/98 08/02/99**Fine Lavori **06/08/99 10/02/00***Santuario di Monte Berico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VICENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00516890241**Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A****VICENZA (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 221111****Telefax: 0444 221335****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	SACRAMATI COSTRUZIONI SPA VIA TERRAGLIO 115, BADIA POLESINE (RO) 00796460293	L. 1.932.097.346	L. 1.764.777.716	8,66
Totali		L. 1.932.097.346	L. 1.764.777.716	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

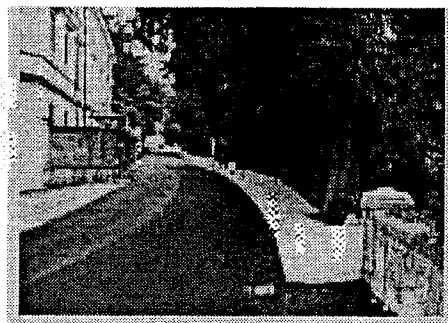
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.772.000.000	L. 2.745.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	- Lit. -183000000
DM 13/09/99	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
Automatico	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.589.000.000	L. 2.562.000.000	L. 0	L. 27.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.003.322.188	L. 1.976.322.188	L. 0	L. 27.000.000	- Lit. -585677812
DM 14/12/00	L. 2.003.322.188	L. 1.976.322.188	L. 0	L. 27.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.003.322.188	L. 1.976.322.188	L. 0	L. 27.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (31/12/99)
Opere Civili	1.219.700.000	1.298.331.738
Opere Impiantistiche	902.200.000	385.454.800
Arredi e/o Attrezzature	88.100.000	80.991.178
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.210.000.000	1.764.777.716
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	123.116.000	
Altre Spese Tecniche	123.875.000	246.990.000
Allacciamenti	7.000.000	7.000.000
Imprevisti	43.000.000	112.490.919
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		4.939.800
IVA al 10%		177.177.771
IVA al 20%	269.527.000	50.385.960
SOMME A DISPOSIZIONE	566.518.000	598.984.450
TOTALE COSTO	2.776.518.000	2.363.762.166
	Economie	-412.755.834
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.745.000.000	2.062.262.166
Risorse proprie	27.000.000	27.000.000
Altre fonti finanziarie		274.500.000
TOTALE COPERTURE	2.772.000.000	2.363.762.166

Protocollo d'intervento: **1729****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DELLE SCALETTE DI MONTE BERICO*Comune **VICENZA (VI)**Finanziamento **L. 321 milioni**- Tot. Impegnato **L. 311.846.055**- Tot. Pagato **L. 283.871.447**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **23/11/98 21/01/99**Fine Lavori **06/08/99 30/09/99***Scalette di Monte Berico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VICENZA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00516890241**Indirizzo **CORSO PALLADIO, 98/A****VICENZA (VI)**Recapiti **Telefono: 0444 221111****Telefax: 0444 221335****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	COSTRUZIONI NICASTRO, DI NICASTRO MARIO E C. SAS CORSO SEMPIONE 157 LEGNANO (MI) 00275340859	L. 239.500.000	L. 227.980.050	4,81
Totali		L. 239.500.000	L. 227.980.050	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

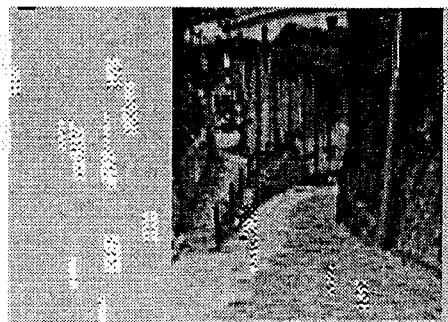
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 321.000.000	L. 321.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (15/06/99)
Opere Civili	34.000.000	32.000.000
Opere Impiantistiche	176.000.000	166.980.050
Arredi e/o Attrezzature	29.500.000	29.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	239.500.000	227.980.050
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	31.409.000	31.410.000
Allacciamenti	19.482.000	19.480.000
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		22.798.005
IVA al 20%	31.055.000	10.178.000
SOMME A DISPOSIZIONE	81.946.000	83.866.005
TOTALE COSTO	321.446.000	311.846.055
	Economie	-9.599.945
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	321.000.000	311.846.055
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	321.000.000	311.846.055

Protocollo d'intervento: **1732****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>SISTEMAZIONE DEL PERCORSO DELLA CHIESA DI SAN GIORGIO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO</i>	
Comune	VICENZA (VI)	
Finanziamento	L. 616 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 611.416.021
	- Tot. Pagato	L. 557.144.418
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	23/11/98	09/12/98
Fine Lavori	06/08/99	21/12/99



Percorso dalla Chiesa di S. Giorgio al Santuario di Monte Berico

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI VICENZA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00516890241	
Indirizzo	CORSO PALLADIO, 98/A	VICENZA (VI)
Recapiti	Telefono: 0444 221111	Telefax: 0444 221335

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	BIESSE COSTRUZIONI VIA 42, n. 1. TRAPANI 01554690816	L. 528.857.110	L. 464.283.657	12,21
Totali		L. 528.857.110	L. 464.283.657	
