

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
Automatico	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 545.000.000	L. 455.000.000	L. 90.000.000	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (19/10/99)
Opere Civili	235.000.000	274.953.139
Opere Impiantistiche	150.000.000	144.790.800
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	40.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	425.000.000	459.743.939
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	66.000.000	30.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	44.000.000	43.974.393
IVA al 20%	10.000.000	10.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000	83.974.393
TOTALE COSTO	545.000.000	543.718.332
	Economie	-1.281.668
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	455.000.000	453.718.332
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	90.000.000	90.000.000
TOTALE COPERTURE	545.000.000	543.718.332

Protocollo d'intervento: **2284**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO RICETTIVO*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.959 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.959.384.700**- Tot. Pagato **L. 2.959.384.700**Cofinanziamento **L. 1.861 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *10/09/98* **21/09/98**Fine Lavori *15/09/99* **30/10/99***Istituto salesiano San Marco*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **82000110278**Indirizzo **VIA DEI SALESIANI, 15****MESTRE (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5498300****Telefax: 041 5498301**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	SADES IMPIANTI SNC VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944 N° 5, BELLUNO 00223130253	L. 375.000.000	L. 373.000.000	0,53
LICITAZIONE PRIVATA	C.I.S.E. SAS CASA BIANCA 11, IMER (TN) 00208540229	L. 3.318.000.000	L. 3.157.077.000	4,85
Totali		L. 3.693.000.000	L. 3.530.077.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.100.000.000	L. 2.870.000.000	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	- Lit. -177215300
DM 01/06/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.922.784.700	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.230.000.000	
Automatico	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	+ Lit. 315707700
DM 21/07/00	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	
DM 01/08/00	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	
DM 14/12/00	L. 4.238.492.400	L. 2.692.784.700	L. 0	L. 1.545.707.700	
DM 14/02/01	L. 4.820.800.100	L. 2.959.384.700	L. 0	L. 1.861.415.400	+ Lit. 582307700

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/05/00)
Opere Civili	2.218.000.000	2.110.427.000
Opere Impiantistiche	1.100.000.000	1.046.650.000
Arredi e/o Attrezzature	375.000.000	373.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	3.693.000.000	3.530.077.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	332.000.000	
IVA al 20%	75.000.000	706.015.400
SOMME A DISPOSIZIONE	407.000.000	706.015.400
TOTALE COSTO	4.100.000.000	4.236.092.400
	Maggiore Spesa	136.092.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.870.000.000	2.959.384.700
Risorse proprie	1.230.000.000	1.230.000.000
Altre fonti finanziarie		46.707.700
TOTALE COPERTURE	4.100.000.000	4.236.092.400

Protocollo d'intervento: **2516****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SANTA CHIARA*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.000 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.903.040.186**- Tot. Pagato **L. 1.712.736.167**Cofinanziamento **L. 2.354 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/08/98** **05/10/98**Fine Lavori **20/10/99** **31/10/99***Complesso monumentale di Santa Chiara***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80013430279**Indirizzo **SAN MARCO, 320/A****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 2702411****Telefax: 041 2702420****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	PITTERI RINALDO E MICHELE SNC GIUDECCA 670/A, VENEZIA 00876610270	L. 1.329.080.200	L. 1.295.454.471	2,53
TRATTATIVA PRIVATA	SACAIM SPA S. MARCO 3831 00184310274	L. 1.954.755.683	L. 1.891.421.599	3,24
Totali		L. 3.283.835.883	L. 3.186.876.070	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
Automatico	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 21/07/00	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 01/08/00	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 14/12/00	L. 4.200.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.200.000.000	
DM 14/02/01	L. 4.353.620.545	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.353.620.545	+ Lit. 153620545

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/11/01)	
Opere Civili	1.891.421.599	2.096.717.363	
Opere Impiantistiche	1.295.454.470	1.453.890.192	
Arredi e/o Attrezzature	120.000.000	208.620.000	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	3.306.876.069	3.759.227.555	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	166.093.804	184.620.000	
Altre Spese Tecniche	30.000.000		
Allacciamenti	35.000.000		
Imprevisti	239.186.466		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	331.787.607	355.060.758	
IVA al 20%	91.056.054	78.648.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	893.123.931	618.328.758	
TOTALE COSTO	4.200.000.000	4.377.556.313	
	Maggiore Spesa	177.556.313	
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.903.040.186	
Risorse proprie	2.200.000.000	2.353.620.545	
Altre fonti finanziarie		120.895.582	
TOTALE COPERTURE	4.200.000.000	4.377.556.313	

Protocollo d'intervento: **2517****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO EDILIZIO ISTITUTO MARIA ASSUNTA*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.365 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.364.578.246**- Tot. Pagato **L. 2.364.578.246**Cofinanziamento **L. 3.728 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/08/98 05/10/98**Fine Lavori **20/10/99 09/10/99***Istituto Maria Assunta***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **DIOC. PATRIARCATO DI VENEZIA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **80013430279**Indirizzo **SAN MARCO, 320/A****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 2702411****Telefax: 041 2702420****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	IMPIANTI ELETTRICI FERRO E MAZZUIA SNC VIA MEUCCI 36, JESOLO (VE) 00437840275	L. 575.450.000	L. 531.432.100	7,65
	IMPIANTI IDRAULICI DENTELLI SNC VIA PASUBIO 55, MOGLIANO V.TO 00645290263	L. 1.063.791.600	L. 1.059.301.483	0,42
	EDILIZIA RIGUTTO SRL VIA TREPORTINA 11/B - CA' SAVIO (VE) 01737620276	L. 1.793.749.200	L. 1.737.784.224	3,12
	Totali	L. 3.432.990.800	L. 3.328.517.807	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 06/08/98	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 20/11/98	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 27/01/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 09/02/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 01/06/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 05/08/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 13/09/99	L. 5.200.000.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 2.700.000.000	
DM 16/11/99	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	+ Lit. 1027885000
Automatico	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 21/07/00	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 01/08/00	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 14/12/00	L. 6.227.885.000	L. 2.500.000.000	L. 0	L. 3.727.885.000	
DM 14/02/01	L. 6.092.463.246	L. 2.364.578.246	L. 0	L. 3.727.885.000	- Lit. -135421754

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (28/10/99)
Opere Civili	3.000.000.000	1.737.784.225
Opere Impiantistiche	700.000.000	3.229.975.183
Arredi e/o Attrezzature	300.000.000	
Altre Voci	200.000.000	
TOTALE LAVORI	4.200.000.000	4.967.759.408
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	210.000.000	260.000.000
Altre Spese Tecniche		90.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	268.000.000	252.516.217
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	400.000.000	496.775.941
IVA al 20%	122.000.000	70.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	1.000.000.000	1.169.292.158
TOTALE COSTO	5.200.000.000	6.137.051.566
	Maggiore Spesa	937.051.566
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.500.000.000	2.409.166.566
Risorse proprie	2.700.000.000	3.727.885.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	5.200.000.000	6.137.051.566

Protocollo d'intervento: **2797****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *STRUTTURE PREFABBRICATE PER IL PERNOTTAMENTO A BASSO COSTO*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 1.981 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.980.999.987**- Tot. Pagato **L. 1.980.999.987**Cofinanziamento **L. 919 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **24/08/99** **15/09/99**Fine Lavori **25/08/99***Strutture per il pernottamento a Tessera e Marghera***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00339370272**Indirizzo **CANNAREGIO, 461 462****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5217011****Telefax: 041 5217873****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A. VIA CARDUCCI, 7 SACILE (PN)	L. 360.000.000	L. 344.480.000	4,31
	PIERO DELLA VALENTINA & C. SPA VIA CARDUCCI, 7 SACILE (PN)	L. 390.000.000	L. 373.815.000	4,15
Totali		L. 750.000.000	L. 718.295.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.801.000.000	L. 1.081.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	+ Lit. 900000000
DM 13/09/99	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
Automatico	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.701.000.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 720.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.900.154.000	L. 1.981.000.000	L. 0	L. 919.154.000	+ Lit. 199154000

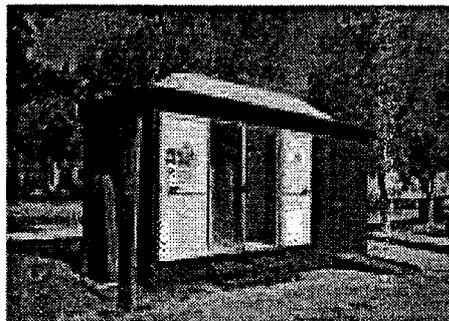
CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/10/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.500.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.500.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	300.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	300.000.000	0
TOTALE COSTO	1.800.000.000	3.192.375.479
	Maggiore Spesa	1.392.375.479
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.081.000.000	1.980.999.987
Risorse proprie	720.000.000	919.154.000
Altre fonti finanziarie		292.221.492
TOTALE COPERTURE	1.801.000.000	3.192.375.479

Protocollo d'intervento: **2802**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento	<i>REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI MOBILI E AREE DI SOSTA PEDONALI E DI RISTORO E DI INFORMAZIONE PER I PELLEGRINI</i>	
Comune	VENEZIA (VE)	
Finanziamento	L. 3.016 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 3.016.000.000
	- Tot. Pagato	L. 3.016.000.000
Cofinanziamento	L. 2.263 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	28/05/99	15/09/99
Fine Lavori	25/08/99	



Campo S. Angelo e Giardini ex Reali

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA	
Categoria	AB Enti pubblici	
C.Fis./P.IVA	00339370272	
Indirizzo	CANNAREGIO, 461 462	VENEZIA (VE)
Recapiti	Telefono: 041 5217011	Telefax: 041 5217873

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	A.R.T.I. DORSODURO 2050 - VENEZIA		L. 72.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	A.R.T.I. SPA DORSODURO 2050 - VENEZIA		L. 70.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	A.R.T.I. SPA DORSODURO 2050 - VENEZIA		L. 372.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	GSA - TEA SRL VIA MONTELLO, 52 - TORRI QUATERSO (VI)		L. 146.329.000	
LICITAZIONE PRIVATA	JOLLY PUBBLICITA' VIA B. CELLINI,66 .- NOVENTA PADOVANA (PD)		L. 336.250.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 16/11/99	L. 4.433.000.000	L. 2.216.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
Automatico	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	+ Lit. 800900000
DM 21/07/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 01/08/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 14/12/00	L. 5.233.000.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.217.000.000	
DM 14/02/01	L. 5.278.740.000	L. 3.016.000.000	L. 0	L. 2.262.740.000	+ Lit. 45740000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/10/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	4.000.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	4.000.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	80.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	280.000.000	
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	72.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	432.000.000	0
TOTALE COSTO	4.432.000.000	5.873.673.162
	Maggiore Spesa	1.441.673.162
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.216.000.000	3.016.000.000
Risorse proprie	2.217.000.000	2.262.740.000
Altre fonti finanziarie		594.933.162
TOTALE COPERTURE	4.433.000.000	5.873.673.162

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: **2802**

LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (T V) 03384010264		L. 960.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264		L. 488.215.000	
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264		L. 780.000.000	
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB S.R.L. VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264	L. 0	L. 192.000.000	0,00
LICITAZIONE PRIVATA	PREFAB SRL VIA F. BARACCA, 177 - CIMADOLMO (TV) 03384010264	L. 29.000.000	L. 24.505.000	15,50
LICITAZIONE PRIVATA	DEPURACQUE IMPIANTI SRL VIA ROMA, 145 - SALZANO (VE)	L. 47.000.000	L. 46.500.000	1,06
LICITAZIONE PRIVATA	COSTRUZIONI ITALIANE AD ALTA TECNOLOGIA S.TA CROCE 1010 - VENEZIA	L. 80.000.000	L. 72.656.000	9,18
LICITAZIONE PRIVATA	GSA - TEA SRL VIA MONTELLO, 52 - TORRI DI QUARTESO (VI)	L. 320.000.000	L. 208.000.000	35,00
Totali		L. 476.000.000	L. 3.768.455.000	


PAGINA BIANCA

Protocollo d'intervento: **2804**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE SERVIZI IGENICI*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 256 milioni**- Tot. Impegnato **L. 256.000.000**- Tot. Pagato **L. 256.000.000**Cofinanziamento **L. 280 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *28/05/99* **06/09/99**Fine Lavori *25/08/99* **31/12/99***Area di Torcello*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00339370272**Indirizzo **CANNAREGIO, 461 462****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5217011****Telefax: 041 5217873**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA DITTA PAOLO FOCCARDI S. POLO 2092 VENEZIA 00767090277	L. 330.000.000	L. 291.720.000	11,60
Totali		L. 330.000.000	L. 291.720.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

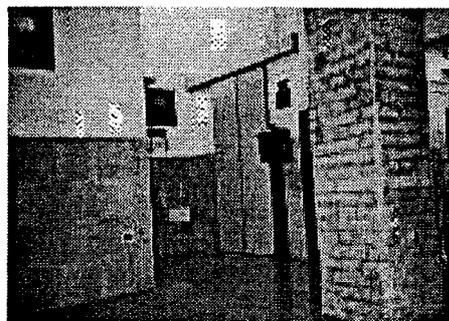
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 06/08/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 20/11/98	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 27/01/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 09/02/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 01/06/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 05/08/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 13/09/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 16/11/99	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
Automatico	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 21/07/00	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 01/08/00	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 14/12/00	L. 512.000.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 256.000.000	
DM 14/02/01	L. 535.704.000	L. 256.000.000	L. 0	L. 279.704.000	+ Lit. 23704000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/10/01)
Opere Civili	230.000.000	404.793.600
Opere Impiantistiche	60.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	350.000.000	404.793.600
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	35.000.000	
Altre Spese Tecniche	15.000.000	77.119.680
Allacciamenti		
Imprevisti	17.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		185.640.000
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	83.500.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	151.000.000	262.759.680
TOTALE COSTO	501.000.000	667.553.280
	Maggiore Spesa	166.553.280
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	256.000.000	256.000.000
Risorse proprie	256.000.000	279.704.000
Altre fonti finanziarie		131.849.280
TOTALE COPERTURE	512.000.000	667.553.280

Protocollo d'intervento: **2805**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *REALIZZAZIONE SERVIZI IGENICI*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 228 milioni**- Tot. Impegnato **L. 228.000.000**- Tot. Pagato **L. 228.000.000**Cofinanziamento **L. 278 milioni**Previsione **Effettiva**Inizio Lavori **28/05/99 29/01/99**Fine Lavori **25/08/99 31/12/99***Campo Santi Apostoli*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **A.M.A.V. AZIENDA MULTIS. AMBIENT. VENEZIANA**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **00339370272**Indirizzo **CANNAREGIO, 461 462****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5217011****Telefax: 041 5217873**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
ASTA PUBBLICA	L'EDILE COSTRUZIONI SNC CORSO DEL POPOLO 229, VE-MESTRE 02762870273	L. 270.000.000	L. 241.947.000	10,39
Totali		L. 270.000.000	L. 241.947.000	
