

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 06/08/98	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 20/11/98	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 27/01/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 09/02/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 01/06/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 05/08/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 13/09/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 16/11/99	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
Automatico	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 21/07/00	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 01/08/00	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 14/12/00	L. 456.000.000	L. 228.000.000	L. 0	L. 228.000.000	
DM 14/02/01	L. 505.616.400	L. 228.000.000	L. 0	L. 277.616.400	Lit. 49616400

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/10/01)
Opere Civili	242.000.000	290.336.400
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	137.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	379.000.000	290.336.400
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		73.620.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		142.680.000
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	77.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	77.000.000	216.300.000
TOTALE COSTO	456.000.000	506.636.400
	Maggiore Spesa	50.636.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	228.000.000	228.000.000
Risorse proprie	228.000.000	277.616.400
Altre fonti finanziarie		1.020.000
TOTALE COPERTURE	456.000.000	506.636.400

Protocollo d'intervento: **2875****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RICETTIVITA' E SERVIZI PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI NELL'AMBITO DELLA STRUTTURA PER ANZIANI CASA DI RIPOSO AI SS. GIOVANNI E PAOLO A VENEZIA*

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 2.865 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.865.277.900**

- Tot. Pagato **L. 2.205.482.850**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Casa di riposo ai SS. Giovanni e Paolo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **I.R.E. ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE**

Categoria **AB Enti pubblici**

C.Fis./P.IVA **00434410270**

Indirizzo **GIUDECCA, 27 - ZITELLE** **VENEZIA (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 5217411** **Telefax: 041 5217419**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	PESSINA COSTRUZIONI SPA VIA MARCELLO NIZZOLI 4, MILANO 00829110154	L. 2.430.000.000	L. 2.071.088.000	14,77
Totali		L. 2.430.000.000	L. 2.071.088.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 3.260.000.000	L. 3.260.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.865.277.900	L. 2.865.277.900	L. 0	L. 0	- Lit. -394722100

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (08/03/01)
Opere Civili	1.690.000.000	1.953.541.919
Opere Impiantistiche	617.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	180.000.000	
Altre Voci	150.000.000	
TOTALE LAVORI	2.637.000.000	1.953.541.919
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	90.000.000
Altre Spese Tecniche	57.000.000	13.700.000
Allacciamenti		
Imprevisti	115.000.000	133.700.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	230.700.000	21.400.000
IVA al 20%	120.400.000	238.194.582
SOMME A DISPOSIZIONE	623.100.000	496.994.582
TOTALE COSTO	3.260.100.000	2.450.536.501
	Economie	-809.563.499
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.260.000.000	2.450.536.501
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.260.000.000	2.450.536.501

Protocollo d'intervento: **2949****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E SISTEMAZIONE DELLE PERTINENZE DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' CULTURALI PER TURISMO D'ARTE E RELIGIOSO CONNESSE CON IL COMPLESSO MONASTICO BENEDETTINO MEDIEVALE DI S. M. ASSUNTA*

Comune **MOGLIANO VENETO (TV)**

Finanziamento **L. 2.166 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.121.030.092**

- Tot. Pagato **L. 2.121.030.092**

Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/03/99* **16/03/99**

Fine Lavori *01/10/99*



Complesso monastico benedettino di S. Maria Assunta

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **COMUNE DI MOGLIANO VENETO**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00565860269**

Indirizzo **PIAZZA CADUTI, 8** **MOGLIANO VENETO (TV)**

Recapiti **Telefono: 041 5902558** **Telefax: 041 5900403**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	SECIS SRL VIA ALTA 186/A, MARCON (VE) 02132260270	L. 1.141.652.728	L. 996.348.518	12,73
Totali		L. 1.141.652.728	L. 996.348.518	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

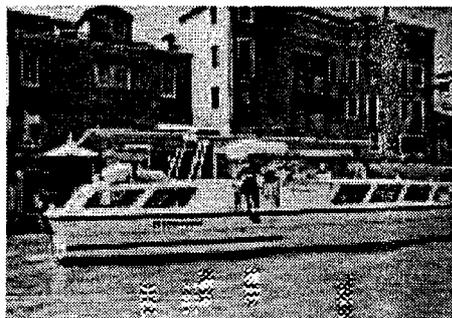
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 2.325.000.000	L. 2.325.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	Lit. -159000000
DM 21/07/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 2.166.000.000	L. 2.166.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/10/01)
Opere Civili	800.000.000	
Opere Impiantistiche	175.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	90.000.000	
Altre Voci	10.000.000	
TOTALE LAVORI	1.075.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	250.000.000	
Altre Spese Tecniche	145.000.000	
Allacciamenti	40.000.000	
Imprevisti	89.000.000	
- Espropri o Acquisizioni	520.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	
IVA al 10%		
IVA al 20%	156.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	1.250.000.000	0
TOTALE COSTO	2.325.000.000	2.121.030.092
	Economie	-203.969.908
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.325.000.000	2.121.030.092
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.325.000.000	2.121.030.092

Protocollo d'intervento: **2977****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COLLEGAMENTO NAVETTA TESSERA VENEZIA VIA ACQUA ACCESSIBILE AI DISABILI*
 Comune **VENEZIA (VE)**
 Finanziamento **L. 273 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 310.000.000**
 - Tot. Pagato **L. 310.000.000**
 Cofinanziamento **L. 1.200 milioni**

*Tessera - Venezia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **80013370277**
 Indirizzo **S. MARCO, 3880** **VENEZIA (VE)**
 Recapiti **Telefono: 041 2722031** **Telefax: 041 5207135**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PROCEDURA NEGOZIATA EUROPEA	STUDIOPLAST DI BERGAMASCHI G. & VINCENZI G. S.N.C. VIA NUOVA TREVIGIANA, 21- CASALE SUL SILE (TV) 00689550275	L. 1.920.000.000	L. 1.820.000.000	5,21
Totali		L. 1.920.000.000	L. 1.820.000.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

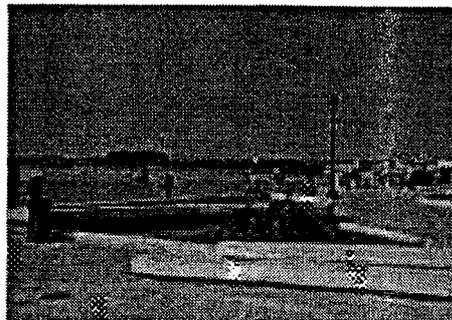
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
Automatico	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.800.000.000	L. 720.000.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.401.120.000	L. 321.120.000	L. 1.080.000.000	L. 0	- Lit. -398880000
DM 14/12/00	L. 1.401.120.000	L. 321.120.000	L. 1.080.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.473.481.319	L. 273.481.319	L. 1.200.000.000	L. 0	+ Lit. 72361319

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (11/06/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.800.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.800.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	1.800.000.000	1.473.481.319
	Economie	-326.518.681
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	720.000.000	273.481.319
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	1.080.000.000	1.200.000.000
TOTALE COPERTURE	1.800.000.000	1.473.481.319

Protocollo d'intervento: **2978****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI FUSINA E ZATTERE*
 Comune **VENEZIA (VE)**
 Finanziamento **L. 299 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 299.066.038**
 - Tot. Pagato **L. 299.066.038**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Approdi di Fusina e Zattere***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **80013370277**
 Indirizzo **S. MARCO, 3880** **VENEZIA (VE)**
 Recapiti **Telefono: 041 2722031** **Telefax: 041 5207135**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Agjudicazione	% Ribasso
Affidamento	STUDIO TECNICO INGG. GOBBETTO, FREZZA, FRULLIN CANNAREGGIO, 584 - VENEZIA (VE)	L. 0	L. 44.474.965	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	PIETRO E IND. ALDO FOCCARDI E FRATELLI SNC CASTELLO 1385, VENEZIA - VE	L. 24.278.000	L. 23.027.683	5,15
Totali		L. 24.278.000	L. 67.502.648	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 299.066.038	L. 299.066.038	L. 0	L. 0	- Lit. -300933962
DM 14/02/01	L. 299.066.038	L. 299.066.038	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/01/01)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	231.025.000	231.025.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	231.025.000	231.025.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	47.474.965	47.474.965
Altre Spese Tecniche	27.633.219	20.566.073
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	75.108.184	68.041.038
TOTALE COSTO	306.133.184	299.066.038
	Economie	-7.067.146
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	306.133.184	299.066.038
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	306.133.184	299.066.038

Protocollo d'intervento: **2979****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI TESSERA E FONDAMENTE NUOVE*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 455 milioni**- Tot. Impegnato **L. 454.842.943**- Tot. Pagato **L. 454.842.943**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *31/03/99* **20/09/99**Fine Lavori *15/07/99* **29/10/99***Approdi di Tessera e Fondamenta Nuove***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **ACTV AZIENDA CONS. TRASPORTI VENEZIANO**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **80013370277**Indirizzo **S. MARCO, 3880****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 2722031****Telefax: 041 5207135****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	PIETRO E ING. ALDO FOCCARI E FRATELLI SNC CASTELLO 1385 - VENEZIA	L. 0	L. 91.734.498	0,00
Totali		L. 0	L. 91.734.498	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 454.842.943	L. 454.842.943	L. 0	L. 0	Lit. -145157057

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (08/08/00)
Opere Civili		
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	454.842.943	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	454.842.943	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbriato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	0	0
TOTALE COSTO	454.842.943	458.331.147
	Maggiore Spesa	3.488.204
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	454.842.943	454.842.943
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		3.488.204
TOTALE COPERTURE	454.842.943	458.331.147

Protocollo d'intervento: **2996****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE AL FINE DI ACCOGLIENZE A BASSO COSTO E ASSISTENZA*

Comune **MOGLIANO VENETO (TV)**

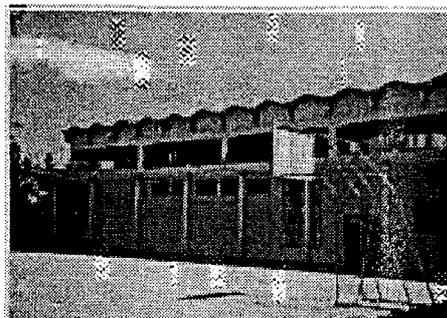
Finanziamento **L. 444 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 441.511.105**

- Tot. Pagato **L. 441.511.105**

Cofinanziamento **L. 90 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	31/05/99	07/04/99
Fine Lavori	30/07/99	30/09/00

*Collegio Astori***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CASA REL. COLLEGIO SALESIANO ASTORI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **00501850267**

Indirizzo **VIA MARCONI, 22** **MOGLIANO VENETO (TV)**

Recapiti **Telefono: 041 5987111** **Telefax: 041 5903042**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	S.I.R.CO. SNC VIA NAVARRINO 2/A, LIDO DI VENEZIA 01586790279	L. 475.001.226	L. 474.101.005	0,19
Totale		L. 475.001.226	L. 474.101.005	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 06/08/98	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 20/11/98	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 27/01/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 09/02/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 01/06/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 05/08/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 13/09/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 16/11/99	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
Automatico	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 21/07/00	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 01/08/00	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 14/12/00	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	
DM 14/02/01	L. 534.000.000	L. 444.000.000	L. 0	L. 90.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/02/01)
Opere Civili	395.801.005	
Opere Impiantistiche	78.300.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	474.101.005	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	47.410.100	
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	57.410.100	0
TOTALE COSTO	531.511.105	532.805.156
	Maggiore Spesa	1.294.051
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	441.511.105	441.511.105
Risorse proprie	90.000.000	91.294.051
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	531.511.105	532.805.156

Protocollo d'intervento: **3008****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO DELLA CRIPTA CINQUECENTESCA DELLA BASILICA DI S. GIUSTINA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 1.046 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.045.782.139**- Tot. Pagato **L. 1.045.782.139**Cofinanziamento **L. 6 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/04/99** **20/04/99**Fine Lavori **01/10/99** **18/02/00***Basilica di S. Giustina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **MONASTERO SANTA GIUSTINA**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00679900285**Indirizzo **VIA G. FERRARI, 2/A****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8756435** **Telefax: 049 666002****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	ARTE E RESTAURO SRL VIA N. SAURO 16, PADOVA 02147560284	L. 538.411.777	L. 519.836.570	3,45
Totali		L. 538.411.777	L. 519.836.570	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 06/08/98	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 20/11/98	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 27/01/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 09/02/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 01/06/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 05/08/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 13/09/99	L. 806.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 16/11/99	L. 784.000.000	L. 778.000.000	L. 0	L. 6.000.000	- Lit. -22000000
Automatico	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	+ Lit. 278080000
DM 21/07/00	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.062.080.000	L. 1.056.080.000	L. 0	L. 6.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.051.782.139	L. 1.045.782.139	L. 0	L. 6.000.000	- Lit. -10297861

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/10/00)
Opere Civili	450.000.000	821.701.841
Opere Impiantistiche	90.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	50.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	590.000.000	821.701.841
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	50.843.000	120.841.596
Altre Spese Tecniche	40.200.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	29.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	6.697.000	
- Opere Impiantistiche	1.674.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		2.416.832
IVA al 10%	56.704.000	82.170.841
IVA al 20%	30.382.000	24.651.686
SOMME A DISPOSIZIONE	216.000.000	230.080.955
TOTALE COSTO	806.000.000	1.051.782.796
	Maggiore Spesa	245.782.796
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	1.045.782.139
Risorse proprie	6.000.000	6.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	806.000.000	1.051.782.139

Protocollo d'intervento: **3030****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO PASTORALE MONS. CARRARO*Comune **VERONA (VR)**Finanziamento **L. 2.616 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.615.610.000**- Tot. Pagato **L. 2.615.610.000**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/11/98* **16/11/98**Fine Lavori *16/09/99* **09/09/99***Centro pastorale Monsignor Carraro***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DI S.PIETRO APOSTOLO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA

Indirizzo **P.ZZA CANONICA 11****MANTOVA (MN)**Recapiti **Telefono: 0376 320220****Telefax:****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
AFFIDAMENTO FIDUCIARIO	MANTOVANI LEONARDO E FIGLIO VIA PRATO SANTO 4/A VERONA 0022412038	L. 1.860.000.000	L. 1.841.400.000	1,00
Totali		L. 1.860.000.000	L. 1.841.400.000	
