

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.938.000.000	L. 2.638.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	- Lit. -21190000
DM 01/06/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.916.810.000	L. 2.616.810.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.915.610.000	L. 2.615.610.000	L. 0	L. 300.000.000	- Lit. -1200000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/07/00)
Opere Civili	1.660.000.000	1.643.400.000
Opere Impiantistiche	200.000.000	198.000.000
Arredi e/o Attrezzature	455.000.000	455.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.315.000.000	2.296.400.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	146.000.000	146.000.000
Altre Spese Tecniche	57.000.000	37.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	93.000.000	92.063.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		20.000.000
IVA al 10%	195.000.000	193.347.000
IVA al 20%	132.000.000	132.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	623.000.000	620.410.000
TOTALE COSTO	2.938.000.000	2.916.810.000
	Economie	-21.190.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.616.810.000	2.161.810.000
Risorse proprie	300.000.000	300.000.000
Altre fonti finanziarie		455.000.000
TOTALE COPERTURE	2.916.810.000	2.916.810.000

Protocollo d'intervento: **3339****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DEI PROSPETTI LAPIDEI DELLA CHIESA E DEL CAMPANILE
CONSOLIDAMENTO PULITURA E RESTAURO DEGLI AFFRESCHI NELL'AREA PRESBITERIALE*

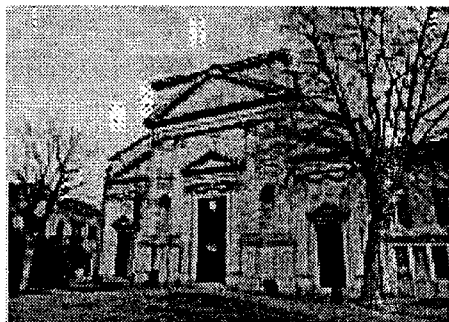
Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 2.353 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.352.250.410**

- Tot. Pagato **L. 2.352.250.410**

Cofinanziamento **L. 400 milioni**

*Chiesa di S. Pietro Apostolo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **94011120279**

Indirizzo **CASTELLO, 72** **VENEZIA (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 5238950** **Telefax: 041 5285189**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	DAL CARLO COMM. MARIO & C. SRL DORSODURO 3624, VENEZIA 01845870276	L. 1.670.776.000	L. 1.653.611.773	1,03
Totali		L. 1.670.776.000	L. 1.653.611.773	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.422.000.000	L. 2.022.000.000	L. 350.000.000	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	- Lit. -204571439
DM 01/06/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 13/09/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.217.428.561	L. 1.817.428.561	L. 0	L. 400.000.000	
Automatico	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	+ Lit. 535072852
DM 21/07/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.752.501.413	L. 2.352.501.413	L. 0	L. 400.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/01/01)
Opere Civili	1.670.000.000	1.866.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.670.000.000	1.866.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	100.000.000	125.000.000
Altre Spese Tecniche	115.000.000	140.000.000
Allacciamenti		
Imprevisti	167.000.000	207.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	367.000.000	414.000.000
SOMME A DISPOSIZIONE	749.000.000	886.000.000
TOTALE COSTO	2.419.000.000	2.752.000.000
	Maggiore Spesa	333.000.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.022.000.000	2.352.250.410
Risorse proprie	50.000.000	400.000.000
Altre fonti finanziarie	350.000.000	
TOTALE COPERTURE	2.422.000.000	2.752.250.410

Protocollo d'intervento: **3592****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA CANONICA DELLA PARROCCHIA S. STEFANO*Comune **CAORLE (VE)**Finanziamento **L. 200 milioni**- Tot. Impegnato **L. 179.015.991**- Tot. Pagato **L. 179.015.991**Cofinanziamento **L. 451 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/11/98* **16/11/98**Fine Lavori *15/09/99* **27/10/99***Casa canonica della Parrocchia di S. Stefano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **92006280272**Indirizzo **PIAZZA VESCOVADO, 3****CAORLE (VE)**Recapiti **Telefono: 0421 81028****Telefax: 0421 81028****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	COSTRUZIONI VIGANI S. e G. VIGANI s.n.c. VIA STRADA NUOVA 69, CAORLE (VE) 00604770271	L. 400.764.117	L. 381.687.745	4,76
Totali		L. 400.764.117	L. 381.687.745	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

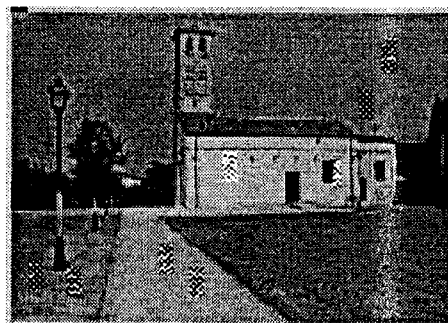
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 400.000.000	L. 200.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 650.840.528	L. 200.000.000	L. 0	L. 450.840.528 + Lit. 250840528	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/11/00)
Opere Civili	220.000.000	321.115.105
Opere Impiantistiche	50.000.000	60.572.640
Arredi e/o Attrezzature	40.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	310.000.000	381.687.745
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		10.000.000
Altre Spese Tecniche	13.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		38.169.150
IVA al 20%	67.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	90.000.000	48.169.150
TOTALE COSTO	400.000.000	429.856.895
	Maggiore Spesa	29.856.895
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	200.000.000	179.015.911
Risorse proprie	200.000.000	250.840.608
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	400.000.000	429.856.519

Protocollo d'intervento: **3595****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO RIUTILIZZO FUNZIONALE CHIESA DI LUGO*Comune **CAMPAGNA LUPIA (VE)**Finanziamento **L. 712 milioni**- Tot. Impegnato **L. 639.609.574**- Tot. Pagato **L. 575.648.620**Cofinanziamento **L. 444 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *05/11/98* *23/11/98*Fine Lavori *15/08/99* *31/08/99**Chiesa di Lugo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00617710272**Indirizzo **VIA REPUBBLICA, 34 36****CAMPAGNA LUPIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 460222****Telefax: 041 460017****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL VIA TORINO 65/A, VE-MESTRE 00731950275	L. 136.830.668	L. 114.226.242	16,52
PUBBLICO INCANTO	MARK COLOR SPA VIA ANGARAN 26, CASTELMINIO DI RESANA (TV) 03161030261	L. 450.241.675	L. 393.184.466	12,67
Totali		L. 587.072.343	L. 507.410.708	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.244.000.000	L. 800.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	- Lit. -88000000
DM 13/09/99	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
Automatico	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.156.000.000	L. 712.000.000	L. 224.000.000	L. 220.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (17/01/01)
Opere Civili	665.472.000	573.058.459
Opere Impiantistiche	160.000.000	132.993.875
Arredi e/o Attrezzature	60.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	885.472.000	706.052.334
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	55.200.000	138.000.000
Altre Spese Tecniche	72.000.000	
Allacciamenti	13.000.000	13.000.000
Imprevisti	39.483.000	57.597.705
- Espropri o Acquisizioni	47.880.000	47.880.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		72.282.000
- Altre voci		27.995.393
IVA al 10%	82.547.000	50.741.071
IVA al 20%	47.936.000	42.343.070
SOMME A DISPOSIZIONE	358.046.000	449.839.239
TOTALE COSTO	1.243.518.000	1.155.891.573
	Economie	-87.626.427
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	800.000.000	711.891.574
Risorse proprie	220.000.000	220.000.000
Altre fonti finanziarie	224.000.000	224.000.000
TOTALE COPERTURE	1.244.000.000	1.155.891.574

Protocollo d'intervento: **3673****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DOMUS CAVANIS*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 1.398 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.367.989.000**- Tot. Pagato **L. 1.367.989.000**Cofinanziamento **L. 300 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *14/11/98* **23/10/98**Fine Lavori *07/08/99* **01/11/99***Domus Cavanis***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **CONGR. S. DI CARITA' IST. CAVANIS**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **00208450170**Indirizzo **DORSODURO, 898****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 5222826****Telefax: 041 5239233****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	MARETTO MARFLEX S.P.A. VIA BOSCO 12, RIVALE DI PIANIGA VE 00166980276	L. 50.397.660	L. 50.397.660	0,00
TRATTATIVA FIDUCIARIA	IMP. EDILE DUILIO GAZZETTA S. POLO 2329, VENEZIA 000694580273	L. 1.155.000.000	L. 1.125.000.000	2,60
Totali		L. 1.205.397.660	L. 1.175.397.660	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

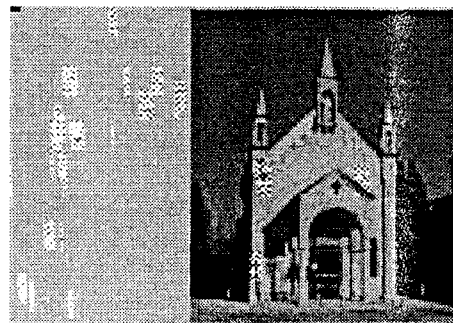
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
Automatico	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.698.000.000	L. 1.398.000.000	L. 0	L. 300.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (19/02/01)
Opere Civili	700.000.000	785.478.450
Opere Impiantistiche	360.000.000	437.733.505
Arredi e/o Attrezzature	45.000.000	50.397.660
Altre Voci	20.000.000	
TOTALE LAVORI	1.125.000.000	1.273.609.615
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	120.000.000	125.953.588
Altre Spese Tecniche	60.000.000	74.570.924
Allacciamenti		
Imprevisti	100.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche	10.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		36.582.526
IVA al 10%		122.321.196
IVA al 20%	283.000.000	50.792.317
SOMME A DISPOSIZIONE	573.000.000	410.220.551
TOTALE COSTO	1.698.000.000	1.683.830.166
	Economie	-14.169.834
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.398.000.000	1.367.989.000
Risorse proprie	300.000.000	315.841.166
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.698.000.000	1.683.830.166

Protocollo d'intervento: **3697****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *RECUPERO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO AL NOCE*Comune **CAMPOSAMPIERO (PD)**Finanziamento **L. 410 milioni**- Tot. Impegnato **L. 410.000.000**- Tot. Pagato **L. 410.000.000**Cofinanziamento **L. 170 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/03/99* **04/05/99**Fine Lavori *20/09/99* **29/12/99***Santuario al Noce***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COLLEGIO ANTONIANO DELLE MISSIONI ESTERE DEI FRATI**Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**C.Fis./P.IVA **8009090285**Indirizzo **VIA S. ANTONIO 2****CAMPOSAMPIERO (PD)**Recapiti **Telefono: 049 5790061****Telefax: 049 57990038****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
OFFERTA PREZZI	ARTE E RESTAURO SRL VIA N. SAURO 15, PADOVA 01652840792	L. 460.000.000	L. 420.991.900	8,48
Totali		L. 460.000.000	L. 420.991.900	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

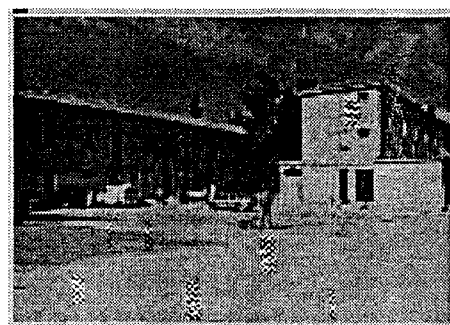
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 527.000.000	L. 357.000.000	L. 170.000.000	L. 0	- Lit. -53000000
Automatico	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	+ Lit. 53209720
DM 21/07/00	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 580.209.720	L. 410.209.720	L. 170.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 580.000.000	L. 410.000.000	L. 170.000.000	L. 0	- Lit. -209720

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (06/09/00)
Opere Civili	461.800.000	456.769.900
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	461.800.000	456.769.900
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche	18.000.000	47.642.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		19.145.000
IVA al 10%		45.016.990
IVA al 20%	100.200.000	14.677.400
SOMME A DISPOSIZIONE	118.200.000	126.481.390
TOTALE COSTO	580.000.000	583.251.290
	Maggiore Spesa	3.251.290
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	410.000.000	410.000.000
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	170.000.000	173.251.290
TOTALE COPERTURE	580.000.000	583.251.290

Protocollo d'intervento: **3700****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PARCHEGGIO AUTO E BUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZI PERCORSO DI ACCESSIBILITA' ALLA CELLA DEL SANTO CON ADEGUAMENTO DELLA ZONA PRESBITERIALE</i>	
Comune	PADOVA (PD)	
Finanziamento	L. 1.209 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.206.988.027
	- Tot. Pagato	L. 1.205.056.054
Cofinanziamento	L. 0 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>10/10/98</i>	08/02/99
Fine Lavori	<i>03/02/99</i>	30/10/99

*Cella del Santo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	PARROCCHIA REG. S. ANTONIO D' ARCELLA	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00680690286	
Indirizzo	VIA L. BRESSAN, 1	PADOVA (PD)
Recapiti	Telefono: 049 605517	Telefax: 049 605915

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	OMETTO COSTRUZIONI	L. 920.000.000	L. 826.160.000	10,20
	VIA TIZIANO ASPETTI 78, PADOVA 02008010288			
Totali		L. 920.000.000	L. 826.160.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 1.100.000.000	L. 1.100.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 1.209.460.000	L. 1.209.460.000	L. 0	L. 0	+ Lit. 109460000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili	821.000.000	900.681.764
Opere Impiantistiche		156.985.936
Arredi e/o Attrezzature		5.167.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	821.000.000	1.062.834.700
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	95.000.000	102.253.770
Altre Spese Tecniche	26.000.000	55.059.722
Allacciamenti		
Imprevisti	47.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	3.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	83.000.000	114.076.501
IVA al 20%	25.000.000	25.669.668
SOMME A DISPOSIZIONE	279.000.000	297.059.661
TOTALE COSTO	1.100.000.000	1.359.894.361
	Maggiore Spesa	259.894.361
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.100.000.000	1.206.988.027
Risorse proprie		152.906.334
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.100.000.000	1.359.894.361

Protocollo d'intervento: **3714****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *OSTELLO DELLA GIOVENTU' NELL'EX CONVENTO DI SANTA CHIARA*Comune **VERONA (VR)**Finanziamento **L. 4.104 milioni**- Tot. Impegnato **L. 4.018.207.393**- Tot. Pagato **L. 4.018.207.393**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **08/10/98 03/12/98**Fine Lavori **18/10/99 30/03/00***Ex Convento di S. Chiara***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI VERONA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00215150236**Indirizzo **PIAZZA BRA, 1****VERONA (VR)**Recapiti Telefono: **045 8077111**Telefax: **045 8066483****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
PUBBLICO INCANTO	IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SPA V.LE INDUSTRIA 42,VICENZA 02526350240	L. 3.499.722.000	L. 3.021.659.975	13,66
Totali		L. 3.499.722.000	L. 3.021.659.975	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 4.629.000.000	L. 4.629.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -525000000
DM 05/08/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 4.104.000.000	L. 4.104.000.000	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (12/06/01)
Opere Civili	2.182.000.000	3.115.696.240
Opere Impiantistiche	917.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	400.000.000	
Altre Voci	17.000.000	
TOTALE LAVORI	3.516.000.000	3.115.696.240
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	255.000.000	
Altre Spese Tecniche	174.000.000	466.317.606
Allacciamenti	10.000.000	23.447.700
Imprevisti	176.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	2.000.000	
- Opere Impiantistiche	2.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		3.381.800
IVA al 10%	332.000.000	312.404.624
IVA al 20%	162.000.000	96.959.422
SOMME A DISPOSIZIONE	1.113.000.000	902.511.152
TOTALE COSTO	4.629.000.000	4.018.207.392
	Economie	-610.792.608
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.629.000.000	2.045.830.790
Risorse proprie		1.972.376.603
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.629.000.000	4.018.207.393

Protocollo d'intervento: **3719****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE DEL CONVENTO AD USO RICETTIVITA'*Comune **CAMPOSAMPIERO (PD)**Finanziamento **L. 1.796 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.796.497.600**- Tot. Pagato **L. 1.796.497.600**Cofinanziamento **L. 2.100 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/97 28/11/97**Fine Lavori **30/06/99 28/06/99***Collegio Antoniano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COLL. ANTONIANO MISSIONI ESTERE FRATI**Categoria **AD Soggetti religiosi - (art.27 del Concordato tra la S.Sede e l'Italia reso esecutivo ai sensi della legge 27 maggio 1929, n.810);**C.Fis./P.IVA **@CAMPOSAMPIERO**Indirizzo **VIA S. ANTONIO, 2****CAMPOSAMPIERO (PD)**Recapiti **Telefono: 049/5790061****Telefax: 049/57990038****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
OFFERTA PREZZI	MASON GIUSEPPE & CECCHIN ALESSANDRO s.n.c. VIA PIO X, 72 CORREGGIO (PD) 00063030282	L. 210.000.000	L. 203.700.000	3,00
OFFERTA PREZZI	INDUSTRIA MOBILI F.LL CORAZZIN S.P.A. VIA ALDO MORO, 10 MOSNIGO DE MORIAGO (TR) 00203020268	L. 434.000.000	L. 403.928.000	6,93
OFFERTA PREZZI	CTP F.LLI PEROZZO SNC VIA CA' MORO 53, PADOVA PRZGFR52H08C743E	L. 508.000.000	L. 457.200.000	10,00
OFFERTA PREZZI	TIEMME COSTRUZIONI VIA VIVALDI 1, CAMPOSANPIERO (PD) 01103320287	L. 1.358.000.000	L. 1.262.940.000	7,00
Totali		L. 2.510.000.000	L. 2.327.768.000	
