

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.750.000.000	L. 2.000.000.000	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
Automatico	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	+ Lit. 197240032
DM 21/07/00	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.947.240.032	L. 2.197.240.032	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.662.325.212	L. 1.912.325.212	L. 750.000.000	L. 1.000.000.000	- Lit. -284914820

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (04/08/00)
Opere Civili	2.272.000.000	2.159.993.477
Opere Impiantistiche	485.000.000	592.544.030
Arredi e/o Attrezzature	105.000.000	145.547.660
Altre Voci	83.000.000	83.000.000
TOTALE LAVORI	2.945.000.000	2.981.085.167
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	308.000.000	333.000.000
Altre Spese Tecniche	17.000.000	17.000.000
Allacciamenti		15.461.500
Imprevisti	100.000.000	100.000.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		100.000
IVA al 10%	294.000.000	296.240.550
IVA al 20%	86.000.000	96.828.232
SOMME A DISPOSIZIONE	805.000.000	858.630.282
TOTALE COSTO	3.750.000.000	3.839.715.449
	Maggiore Spesa	89.715.449
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.912.325.212
Risorse proprie	1.000.000.000	1.177.390.237
Altre fonti finanziarie	750.000.000	750.000.000
TOTALE COPERTURE	3.750.000.000	3.839.715.449

Protocollo d'intervento: **5598****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DI PORZIONE DI SPAZI DISMESSI DEL MONASTERO DA DESTINARE A OSPITALITA' E ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA SUGLI IMPIANTI DELLA PARTE GIA' FUNZIONANTE*

Comune **VENEZIA (VE)**

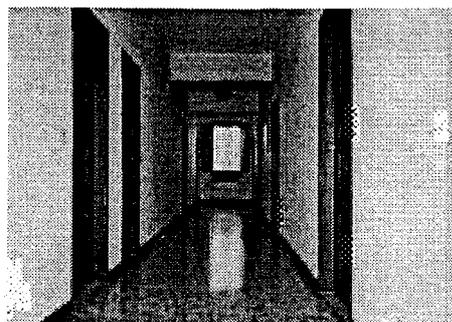
Finanziamento **L. 1.772 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 1.772.403.800**

- Tot. Pagato **L. 1.772.403.800**

Cofinanziamento **L. 202 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	25/09/98	24/07/98
Fine Lavori	25/09/99	

*Abbazia di S. Giorgio Maggiore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNITA' PADRI BENEDETTINI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **94001010274**

Indirizzo **ISOLA DI SAN GIORGIO MAGGIORE** **VENEZIA (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 5227827** **Telefax: 041 520679**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	ATI S.I.S.E.T. SAS & SABATINO VIA ROMA, 31 CASTILENTI (TE) 00740350673	L. 1.409.000.000	L. 1.355.458.000	3,80
Totali		L. 1.409.000.000	L. 1.355.458.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.027.000.000	L. 1.827.000.000	L. 100.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	Lit. -54596200
DM 01/06/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.972.403.800	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.974.619.986	L. 1.772.403.800	L. 0	L. 202.216.186	+ Lit. 2216186

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (31/10/01)
Opere Civili	635.000.000	1.456.163.221
Opere Impiantistiche	774.000.000	131.490.000
Arredi e/o Attrezzature	135.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.544.000.000	1.587.653.221
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	52.000.000	436.843.819
Altre Spese Tecniche	54.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	70.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	22.000.000	
- Opere Impiantistiche	24.000.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	700.000
IVA al 10%	153.000.000	145.616.322
IVA al 20%	58.000.000	112.724.364
SOMME A DISPOSIZIONE	483.000.000	695.884.505
TOTALE COSTO	2.027.000.000	2.283.537.726
	Maggiore Spesa	256.537.726
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.827.000.000	1.772.403.800
Risorse proprie	200.000.000	202.216.186
Altre fonti finanziarie		308.917.800
TOTALE COPERTURE	2.027.000.000	2.283.537.786

Protocollo d'intervento: **5643**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *PARCHEGGIO VERDE RISTRUTTURAZIONE TOTALE E AMPLIAMENTO DELL'ANNESSO RUSTICO IN DISUSO PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI DEL SANTUARIO DI MONTE BERICO*

Comune **VICENZA (VI)**

Finanziamento **L. 2.327 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.223.718.720**

- Tot. Pagato **L. 2.223.718.720**

Cofinanziamento **L. 1.213 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/09/98	14/09/98
Fine Lavori	30/09/99	



Santuario di Monte Berico

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **PROV. VENETA DEI SERVI DI MARIA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **80008510242**

Indirizzo **VIALE X GIUGNO, 87** **VICENZA (VI)**

Recapiti **Telefono: 0444 320999** **Telefax: 0444 326464**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA - MAGGIORE RIBASSO	DELTA ARREDAMENTI S. VITO DI LEGUZZANO (VI)	L. 240.000.000	L. 180.000.000	25,00
LICITAZIONE PRIVATA	GIUSEPPE MALTAURO SPA VIA GAZZOLE 6, VICENZA 02526350240	L. 2.616.000.000	L. 2.307.835.200	11,78
Totali		L. 2.856.000.000	L. 2.487.835.200	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.637.000.000	L. 2.424.000.000	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	- Lit. -308164800
DM 01/06/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
Automatico	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.328.835.200	L. 2.115.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.539.835.200	L. 2.326.835.200	L. 0	L. 1.213.000.000	+ Lit. 211000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (05/06/01)
Opere Civili	2.300.000.000	
Opere Impiantistiche	316.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	240.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.856.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	223.000.000	
Altre Spese Tecniche	20.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	161.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	276.000.000	
IVA al 20%	102.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	782.000.000	0
TOTALE COSTO	3.638.000.000	3.539.835.200
	Economie	-98.164.800
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.115.836.000	2.326.835.200
Risorse proprie	1.213.000.000	1.213.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.328.836.000	3.539.835.200

Protocollo d'intervento: **5646****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *NUOVO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DELLE CAMPANE DEL CAMPANILE DELLA BASILICA DI MONTE BERICO OPERE DI RESTAURO INTERNO AL CAMPANILE E RESTAURO DELLA CUPOLA IN RAME CON CONSOLIDAMENTO DELLA STRUTTURA LIGNEA*

Comune **VICENZA (VI)**

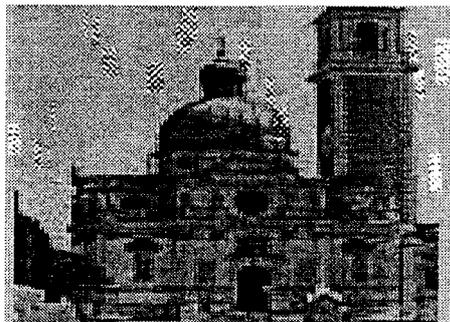
Finanziamento **L. 410 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 344.133.000**

- Tot. Pagato **L. 344.133.000**

Cofinanziamento **L. 204 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	01/02/99	01/03/99
Fine Lavori	30/09/99	30/07/99

*Santuario di Monte Berico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione PROV. VENETA DEI SERVI DI MARIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 80008510242

Indirizzo VIALE X GIUGNO, 87 VICENZA (VI)

Recapiti Telefono: 0444 320999 Telefax: 0444 326464

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	NOVA RES SRL VIA XX SETTEMBRE 33, BASSANO DEL GRAPPA (VI) 02665060246	L. 506.000.000	L. 480.700.000	5,00
Totali		L. 506.000.000	L. 480.700.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 06/08/98	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 20/11/98	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 27/01/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 09/02/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 01/06/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 05/08/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 13/09/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 16/11/99	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
Automatico	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 21/07/00	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 01/08/00	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 14/12/00	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	
DM 14/02/01	L. 614.000.000	L. 410.000.000	L. 0	L. 204.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/10/01)	
Opere Civili	414.000.000	345.000.000	
Opere Impiantistiche	47.000.000	96.564.922	
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	461.000.000		441.564.922
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	48.000.000	48.000.000	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	45.000.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	50.000.000	44.417.013	
IVA al 20%	10.000.000	10.152.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	153.000.000		102.569.013
TOTALE COSTO	614.000.000		544.133.935
	Economie		-69.866.065
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	410.000.000		340.133.935
Risorse proprie	204.000.000		204.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	614.000.000		544.133.935

Protocollo d'intervento: **5718****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI PARI VOLUME COMPRENDENTE RILOCAZIONE FUNZIONALE ED AMPLIAMENTO DI MENSA CUCINA DISPENSA E LOCALI LAVAGGIO CREAZIONE SERVIZI PER ASSISTENZA IGIENICA E SANITARIA ADEGUAMENTO SALE DI INCONTRO ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT.*

Comune **VENEZIA (VE)**

Finanziamento **L. 597 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 597.270.900**

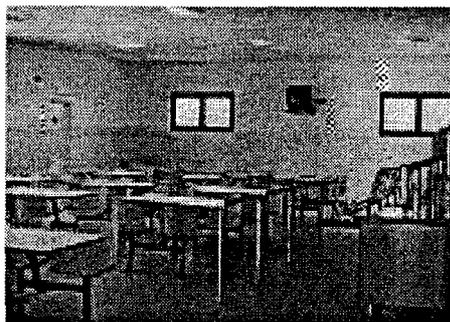
- Tot. Pagato **L. 597.269.248**

Cofinanziamento **L. 500 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/01/99* **30/11/98**

Fine Lavori *31/08/99* **29/06/99**

*Convento dei padri cappuccini in Mestre***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. VENETA FRATI MINORI CAPPUCINI**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **00587460270**

Indirizzo **PIAZZETTA SAN CARLO, 2** **MESTRE (VE)**

Recapiti **Telefono: 041 951725** **Telefax: 041 989655**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	CESARATO - FURLAN COSTRUZIONI DORSODURO 2267, VENEZIA 02211010265	L. 954.480.000	L. 827.000.000	13,36
Totali		L. 954.480.000	L. 827.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

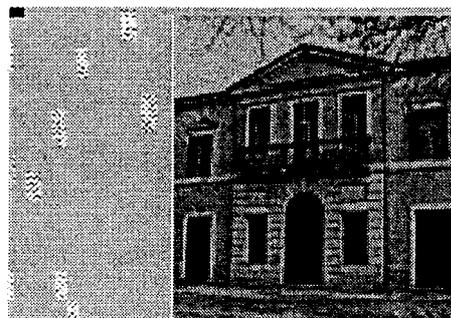
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
Automatico	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.100.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 500.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.097.270.900	L. 597.270.900	L. 0	L. 500.000.000	- Lit. -2729100

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (15/02/00)	
Opere Civili	507.000.000	505.479.000	
Opere Impiantistiche	135.000.000	134.595.000	
Arredi e/o Attrezzature	150.000.000	149.550.000	
Altre Voci	35.000.000	34.895.000	
TOTALE LAVORI	827.000.000		824.519.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	57.500.000	57.500.000	
Altre Spese Tecniche	35.500.000	35.500.000	
Allacciamenti	7.000.000	7.000.000	
Imprevisti	41.000.000	41.000.000	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili	20.300.000	20.300.000	
- Opere Impiantistiche	1.400.000	1.400.000	
- Arredi e/o attrezzature	1.500.000	1.500.000	
- Altre voci	350.000	350.000	
IVA al 10%	89.900.000	89.651.900	
IVA al 20%	18.550.000	18.550.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	273.000.000		272.751.900
TOTALE COSTO	1.100.000.000		1.097.270.900
	Economie		-2.729.100
COPERTURA FINANZIARIA			
	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	600.000.000		597.270.900
Risorse proprie	500.000.000		500.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	1.100.000.000		1.097.270.900

Protocollo d'intervento: **5768****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento *OSTELLO S. GIACOMO*
 Comune **MONSELICE (PD)**
 Finanziamento **L. 260 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 260.174.530**
 - Tot. Pagato **L. 260.174.530**
 Cofinanziamento **L. 30 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **17/11/98 16/10/98**
 Fine Lavori **17/06/99 02/08/99**

*Complesso conventuale di S. Giacomo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **80007380274**
 Indirizzo **ISOLA S. MICHELE VENEZIA (VE)**
 Recapiti **Telefono: 041 5238463 Telefax: 041 5228323**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA MANIFATTURA ITALIANA FLEXPOL VIA NAZIONALE 7 SOLESINO (PD) 0257730281	L. 8.000.000	L. 8.000.000	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	MAG. COSTRUZIONI SRL VIA LIVELLO 48/50 PADOVA 00223970286	L. 2.066.770.000	L. 1.815.896.413	12,14
Totali		L. 2.074.770.000	L. 1.823.896.413	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

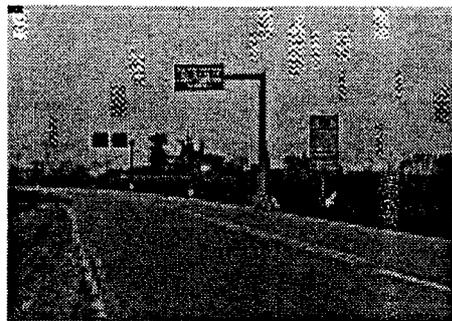
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 06/08/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 20/11/98	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 27/01/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 09/02/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/06/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 05/08/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 13/09/99	L. 280.000.000	L. 250.000.000	L. 0	L. 30.000.000	
DM 16/11/99	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	+ Lit. 27869690
Automatico	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 21/07/00	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 01/08/00	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/12/00	L. 307.869.690	L. 277.869.690	L. 0	L. 30.000.000	
DM 14/02/01	L. 290.174.530	L. 260.174.530	L. 0	L. 30.000.000	- Lit. -17695160

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/08/01)
Opere Civili	156.600.000	230.029.021
Opere Impiantistiche	22.300.000	
Arredi e/o Attrezzature	8.000.000	8.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	186.900.000	238.029.021
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	5.000.000	2.537.637
Altre Spese Tecniche	2.500.000	10.028.000
Allacciamenti	3.000.000	
Imprevisti	17.890.000	
- Espropri o Acquisizioni	6.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	4.000.000	
- Opere Impiantistiche	1.040.000	
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		10.530.034
IVA al 10%	17.890.000	23.002.903
IVA al 20%	35.780.000	6.046.935
SOMME A DISPOSIZIONE	93.100.000	52.145.509
TOTALE COSTO	280.000.000	290.174.530
	Maggiore Spesa	10.174.530
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	250.000.000	260.174.530
Risorse proprie	30.000.000	30.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	280.000.000	290.174.530

Protocollo d'intervento: **5885****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *SISTEMA A CARTELLI A MESSAGGIO VARIABILE*Comune **IESOLO (VE)**Finanziamento **L. 139 milioni**- Tot. Impegnato **L. 141.842.944**- Tot. Pagato **L. 137.720.779**Cofinanziamento **L. 50 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori **30/11/98 12/11/98**Fine Lavori **31/05/99 21/04/99***Sistema di cartelli a messaggio variabile***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI JESOLO**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00608720272**Indirizzo **VIA S. ANTONIO, 14****JESOLO (VE)**Recapiti **Telefono: 0421 359105****Telefax: 0421 359134****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA	S.I.E.C.I. SAS VIA MARSARA 4/A, VILLA DEL CONTE (PD) 00917830283	L. 162.000.000	L. 135.069.120	16,62
Totali		L. 162.000.000	L. 135.069.120	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

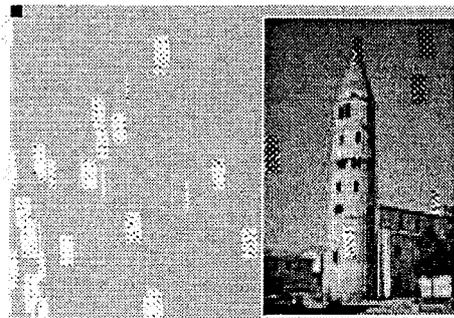
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 06/08/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 20/11/98	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 27/01/99	L. 220.000.000	L. 170.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 09/02/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -26930000
DM 01/06/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 05/08/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 13/09/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 193.070.000	L. 143.070.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 188.947.834	L. 138.947.834	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -4122166

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/02/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche	160.000.000	139.408.545	
Arredi e/o Attrezzature		700.546	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	160.000.000		140.109.091
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	16.000.000	15.419.891	
Altre Spese Tecniche		905.000	
Allacciamenti			
Imprevisti	8.800.000		
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	36.960.000	31.286.796	
SOMME A DISPOSIZIONE	61.760.000		47.611.687
TOTALE COSTO	221.760.000		187.720.778
	Economie		-34.039.222
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	143.070.000		137.720.778
Risorse proprie	50.000.000		50.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	193.070.000		187.720.778

Protocollo d'intervento: **6201****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	SISTEMAZIONE URBANISTICA ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA DELLA PIAZZA VESCOVADO	
Comune	CAORLE (VE)	
Finanziamento	L. 1.738 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.701.677.000
	- Tot. Pagato	L. 1.701.677.000
Cofinanziamento	L. 2.000 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	15/01/99	16/12/98
Fine Lavori	16/10/99	29/10/99



Piazza Vescovado

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	COMUNE DI CAORLE	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	00321280273	
Indirizzo	VIA DEL PASSARIN, 15	CAORLE (VE)
Recapiti	Telefono: 0421 219111	Telefax: 0421 81160

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	CULATTI ZILLI s.n.c VIA DELLE ORTENSIE 2/B, MARGHERA (VE) 02045280274	L. 2.900.000.000	L. 2.576.070.000	11,17
Totali		L. 2.900.000.000	L. 2.576.070.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.900.000.000	L. 1.900.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	- Lit. -320000000
DM 13/09/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
Automatico	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.580.000.000	L. 1.580.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.738.000.000	L. 1.738.000.000	L. 0	L. 2.000.000.000	+ Lit. 158000000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/04/01)
Opere Civili	2.400.000.000	2.820.756.499
Opere Impiantistiche	500.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.900.000.000	2.820.756.499
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	194.000.000	205.836.981
Altre Spese Tecniche	206.000.000	189.290.252
Allacciamenti	110.000.000	138.474.114
Imprevisti	86.000.000	61.800.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	299.000.000	
IVA al 20%	105.000.000	392.532.279
SOMME A DISPOSIZIONE	1.000.000.000	987.933.626
TOTALE COSTO	3.900.000.000	3.808.690.125
	Economie	-91.309.875
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.900.000.000	1.701.677.000
Risorse proprie	2.000.000.000	2.107.013.125
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.900.000.000	3.808.690.125

Protocollo d'intervento: **6229**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *MUSEO DI ARTE SACRA PALAZZO VESCOVILE CHIOGGIA*Comune **CHIOGGIA (VE)**Finanziamento **L. 3.109 milioni**- Tot. Impegnato **L. 3.085.926.400**- Tot. Pagato **L. 3.085.926.400**Cofinanziamento **L. 391 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/09/98* **11/01/99**Fine Lavori *16/10/99* **30/12/99***Palazzo vescovile*

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione ENTE DIOCESI DI CHIOGGIA

Categoria AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);

C.Fis./P.IVA 91004810270

Indirizzo RIONE DUOMO, 1006

CHIOGGIA (VE)

Recapiti Telefono: 041 400513

Telefax: 041 401321

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
ASTA PUBBLICA - LICITAZIONE PRIVATA	POUCHAIN s. r. l. VIA DELLA GIUSTINIANA, 1012 ROMA 00441210580	L. 2.520.000.000	L. 2.499.024.000	0,83
Totali		L. 2.520.000.000	L. 2.499.024.000	
