


nell'anno successivo, assumendo così il connotato di un «**inventario**» delle opere in corso di progettazione ovvero di esecuzione, piuttosto che di «**programma**» di operatività.

La ripartizione della spesa impegnata ed erogata, suddivisa tra il Nord, il Centro ed il Meridione d'Italia, espone le seguenti consistenze finanziarie.

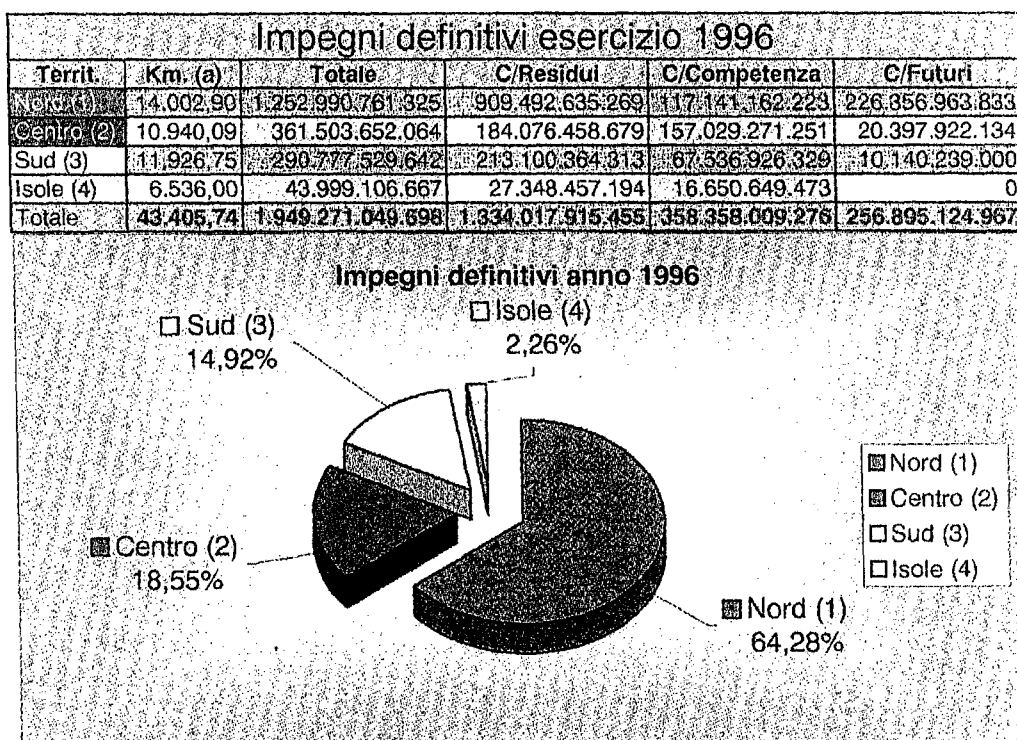


(a) Fonte D.L.vo 29.10.1999 n°461 e D.P.C.M 21.02.2000.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.

(4) Sardegna, Sicilia.

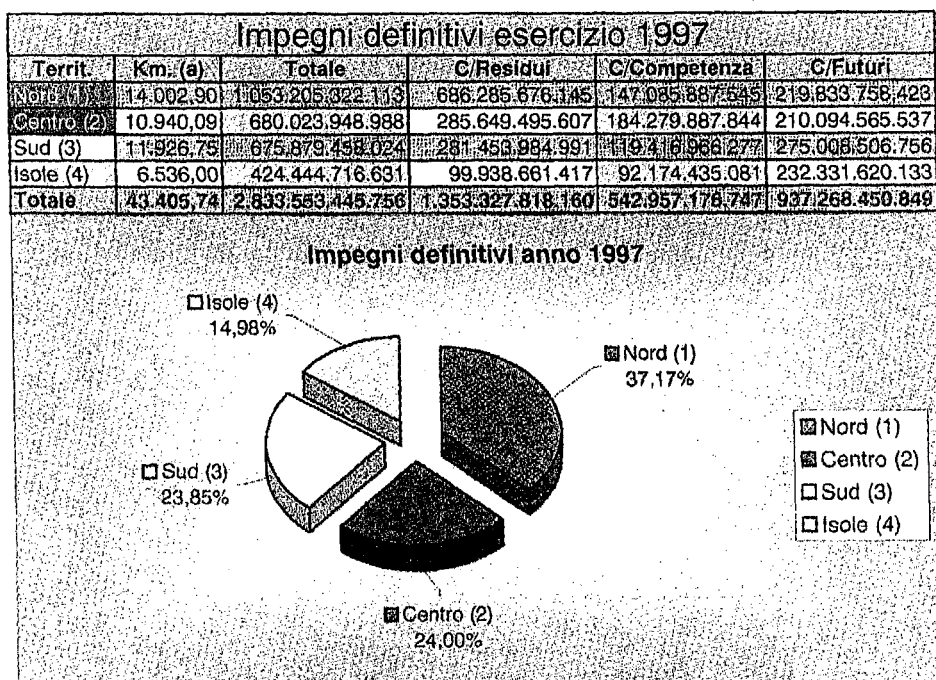


(a) Fonte D.L.vo 29.10.1999 n°461 e D.P.C.M 21.02.2000.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.

(4) Sardegna, Sicilia.

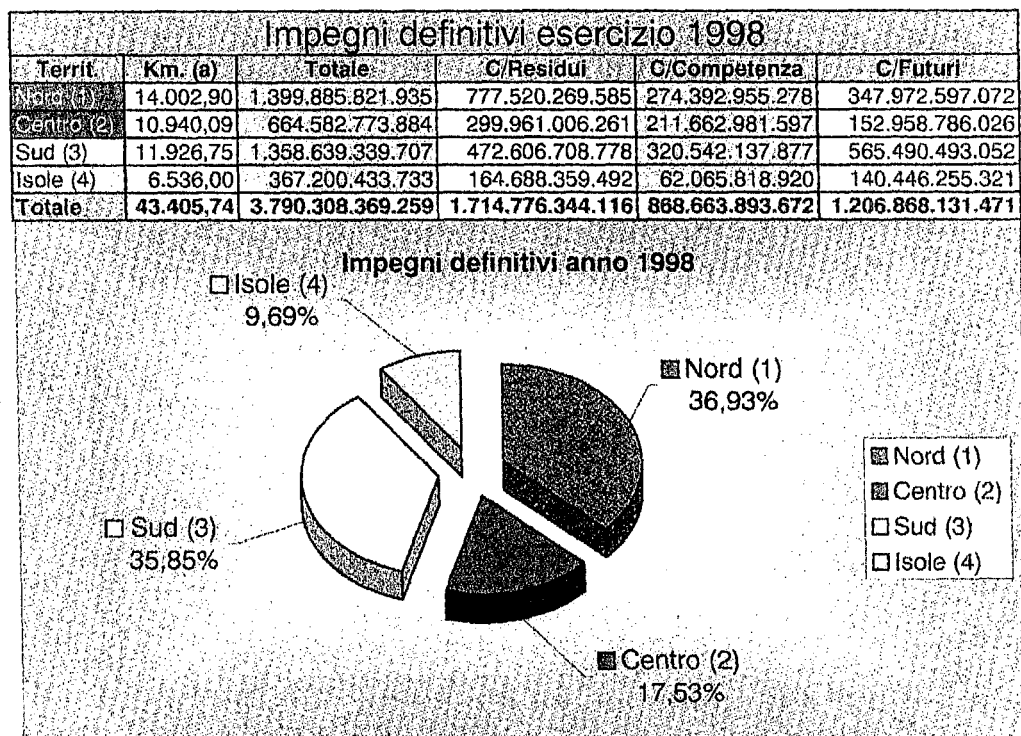


(a) Fonte D.L.vo 29.10.1999 n°461 e D.P.C.M 21.02.2000.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.

(4) Sardegna, Sicilia.

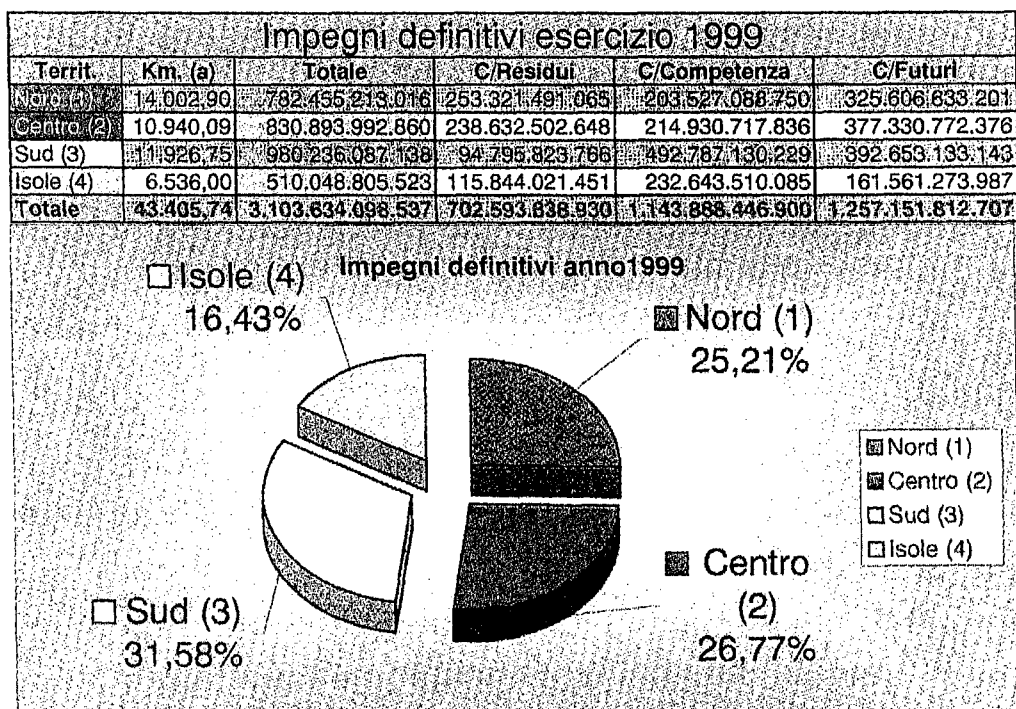


(a) Fonte D.L.vo 29.10.1999 n°461 e D.P.C.M 21.02.2000.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.

(4) Sardegna, Sicilia.

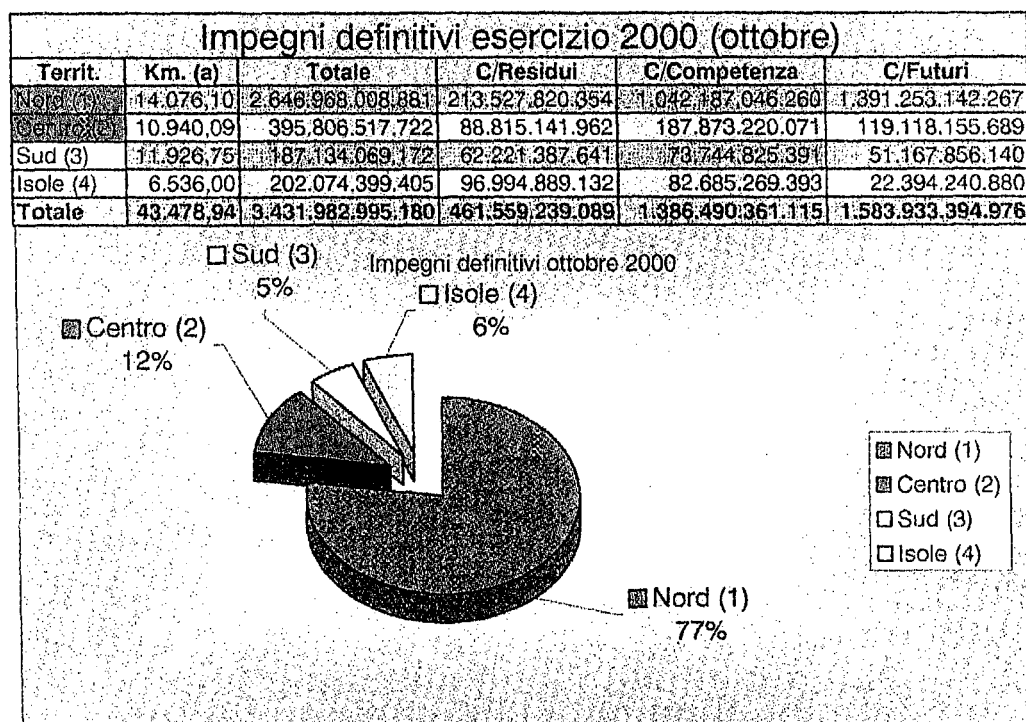

(a) Fonte D.L.vo 29.10.1999 n°461 e D.P.C.M 21.02.2000.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.

(4) Sardegna, Sicilia.

Nelle pagine che seguono sono evidenziati, con l'ausilio dei relativi grafici realizzati sulla base dei dati ottenuti dalle interrogazioni effettuate presso il Sistema Informativo Lavori (SIL) il totale degli importi impegnati, sul bilancio dell'ANAS, a seguito di progetti-perizie approvate, per la esecuzione di opere pubbliche nel periodo gennaio 1996-ottobre 2000 e ammontanti a L. 15.108.749.958.430.

Tale costo complessivo è stato oggetto di raffronto con:


- territorialità di esecuzione dei lavori;
- distesa chilometrica di appartenenza territoriale;
- anno finanziario di appartenenza dei fondi.

L'evidente aumento della spesa, sostenuta negli anni 1998 e 1999 nei confronti dei Compartimenti del Sud Italia è da individuare nelle disposizioni legislative – ivi comprese quelle di


carattere comunitario - con le quali sono stati autorizzati i finanziamenti per la esecuzione dei lavori che, in modo particolare, hanno interessato l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, il cui costo complessivo è attualmente valutato intorno a L. 16.000 mld.

Nel Nord e nel Centro Italia, l'ANAS si avvale dell'istituto delle concessioni con la conseguenza di spostare il volume finanziario degli investimenti in capo ad altri soggetti, finanziari con denaro pubblico.

Tabella riepilogativa degli impegni assunti dal 1.1.1996 al 31.10.2000				
Anni	C/Residui	C/Competenza	C/Futuri	Totale
1996	1.334.017.915.455	358.358.009.276	256.895.124.967	1.949.271.049.698
1997	1.353.327.818.160	542.957.176.747	937.268.450.849	2.833.553.446.756
1998	1.714.776.344.116	868.663.893.672	1.206.868.131.471	3.790.308.369.259
1999	702.593.838.930	1.143.888.446.900	1.257.151.812.707	3.103.634.098.537
2000	461.559.239.089	1.386.490.361.115	1.583.933.394.976	3.431.982.995.180
Totale	5.566.275.155.750	4.300.357.887.710	5.242.116.914.970	15.108.749.958.430

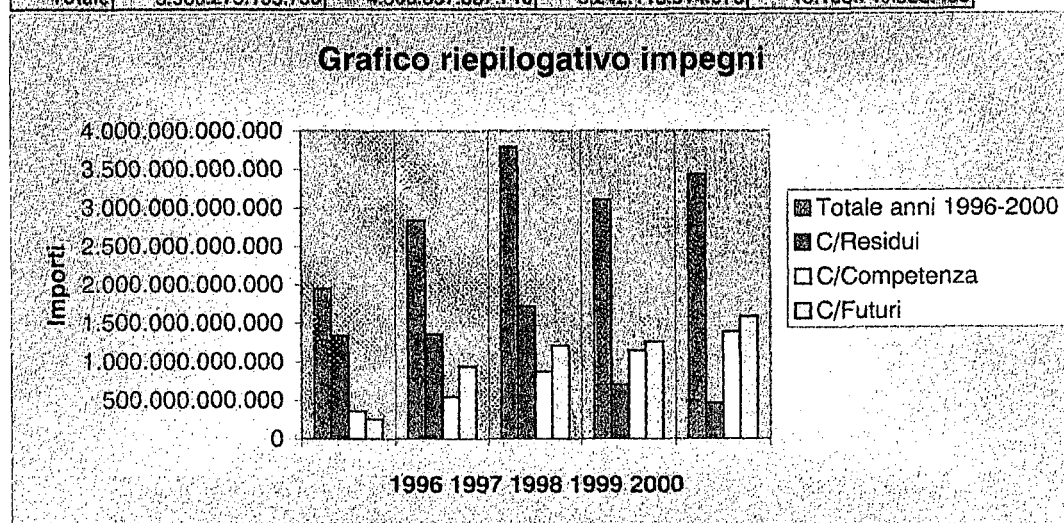

I valori della distesa chilometrica e dei lavori riferiti all'anno 2000 sono comprensivi anche delle previsioni della costruenda A/S Asti-Cuneo

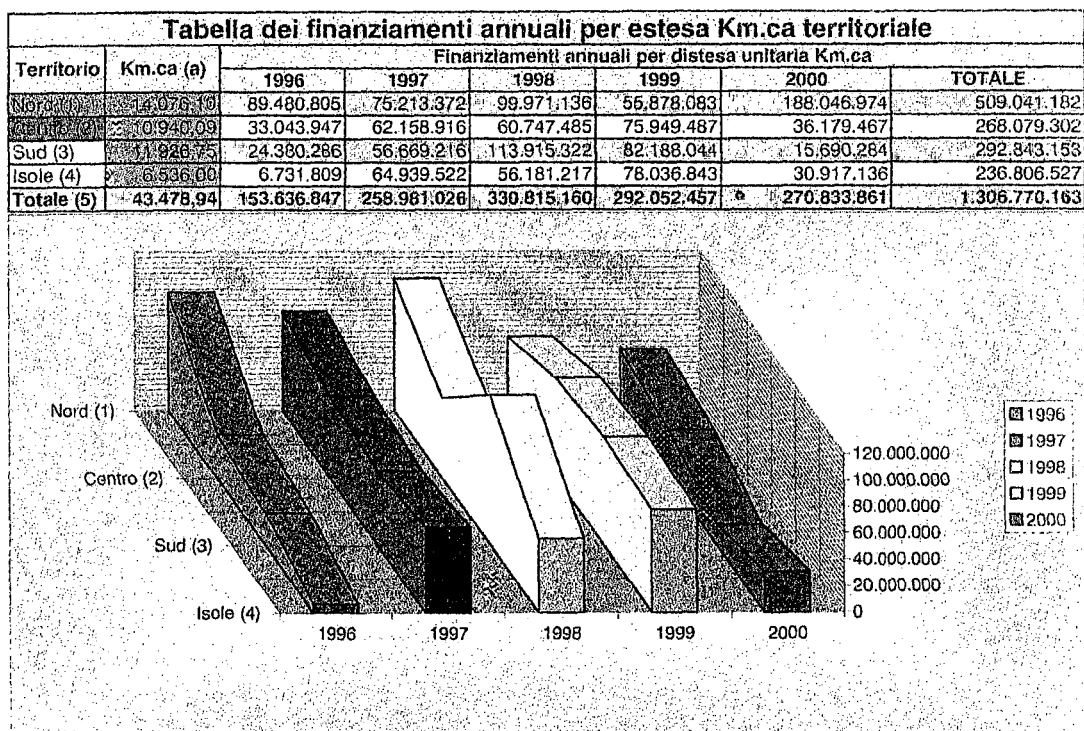

(a) Fonte D.L.vo 29.10.1999 n°461 e D.P.C.M 21.02.2000.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.


(4) Sardegna, Sicilia.

(5) I valori della distesa chilometrica e dei lavori riferiti all'anno 2000 sono comprensivi anche delle previsioni della costruenda A/S Asti-Cuneo


7.5. Sempre con l'apporto dei dati informatici forniti dal SIL e sulla

Tabella degli impegni stanziati da 1.1.1996 al 31.10.2000 in rapporto alla distesa Km.ca territoriale										
Territorio	Km.ca (a)		Anni Finanziari					Totale	Finanz. X Km	Finanz. % terr.
	1996	2000	1996	1997	1998	1999	2000			
Nord (1)	14.002,98	14.076,10	1.252.990.761.325	1.053.205.322.113	1.399.885.821.935	782.455.213.016	2.646.968.008.881	7.135.505.127.270	509.041.182	47,23%
Centro (2)	10.940,09	10.940,09	361.503.652.064	680.023.948.988	664.582.773.884	830.893.992.860	395.806.517.722	2.932.810.885.518	268.079.302	19,41%
Sud (3)	11.926,75	11.926,75	290.777.529.642	675.879.458.024	1.358.639.339.707	980.236.087.138	187.134.069.172	3.492.666.483.683	292.843.153	23,12%
Isole (4)	6.536,00	6.536,00	43.999.106.667	424.444.716.631	367.200.433.733	510.048.805.523	202.074.399.405	1.547.767.461.959	236.806.527	10,24%
Totale (5)	43.405,74	43.478,94	1.949.271.049.698,00	2.833.553.445.756,00	3.790.308.369.259,00	3.103.634.098.537,00	3.431.982.995.180,00	15.108.749.958.430		

Media percentuale impegni totali per territorio



Media dei finanziamenti in rapporto alla distesa Km.ca



(a) Fonte D.Lvo 29.10.1999 n°461 e D.P.C.M 21.02.2000.

(1) Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna.

(2) Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo.

(3) Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria.

(4) Sardegna, Sicilia.

(5) I valori della distesa chilometrica e dei lavori riferiti all'anno 2000 sono comprensivi anche delle previsioni della costruenda A/S Asti-Cuneo

scorta dei documenti programmatici sottoscritti dall'ANAS per l'attuazione delle opere previste nel Piano Triennale 1998-2000, la Corte ha provveduto - alla data del gennaio 2001- a una verifica sullo stato dei lavori in argomento.

Gli importi, che vengono indicati in prosieguo non sono completi, in quanto non sempre vi è corrispondenza tra i dati rilevati dal SIL e quelli - tra l'altro incompleti - che hanno formato oggetto della esposizione del piano a seguito dei ritardi riscontrati nel comunicare al SIL i relativi dati.

7.6. Dall'esame dei dati del 1996, si rileva che sono stati oggetto di programmazione n. 114 lavori stradali per un importo complessivo di L. 3.026,5 mld, così territorialmente suddivisi:

- 32 nel Nord Italia per un importo di L. 1.133,4 mld;
- 40 al Centro per un importo di L. 873,6 mld;
- 27 nel Sud per un importo di L. 483,3 mld;
- 15 nelle Isole per un importo di L. 536,2 mld.

Lo stato attuale, dei predetti 114 interventi programmati, risulta essere il seguente:

- lavori già consegnati e/o aggiudicati n. 45 per complessive L. 1.571,5 mld di cui:
 - 13 al Nord per L. 435,3 mld,
 - 18 al Centro per L. 556,5 mld,
 - 7 al Sud per L. 294,9 mld,
 - 7 alle Isole per L. 284,8 mld;
- lavori per i quali è stata indetta la gara di appalto n. 15 per complessive L. 418,7 mld di cui:
 - 7 gare per lavori al Nord per L. 338,1 mld,
 - 5 gare al Centro per L. 22,3 mld,
 - 2 gare al Sud per L. 54,9 mld,
 - 1 gara alle Isole per L. 3,4 mld;

- lavori la cui fase progettuale - per vari motivi - è ancora da de-finire n. 54 per un importo complessivo di L. 1.036,3 mld di cui:

- 12 progetti di lavori al Nord per L. 360,1 mld,
- 17 progetti al Centro per L. 193,9 miliardi,
- 18 progetti al Sud per L. 344,9 mld,
- 7 progetti alle Isole per L. 181,4 mld.

Di queste 54 opere, 8 di esse, sono state stralciate e programmate nell'accordo dell'anno 2000 per complessive L. 135,3 mld dei quali 5 al Nord per L. 119,7 mld, 2 al Centro per L. 9,1 mld ed 1 alle Isole per L. 50,5 mld.

7.7. La consegna delle 45 opere, già in corso di esecuzione, è avvenuta distribuita in un arco di tempo di 4 anni ed esattamente:

- n. 1 lavoro nell'anno 1997 di L. 93,4 mld nel Centro Italia (già ultimato);
- n. 17 lavori nell'anno 1998 per complessive L. 573,6 mld, dei quali:
 - n. 8 al Nord per un importo di L. 178,7 mld,
 - n. 6 al Centro per L. 294,1 mld,
 - n. 1 al Sud per L. 14 mld,
 - 2 alle Isole per L. 86,8 mld.

Soltanto tre lavori risultano ultimati nel Centro Italia, per L. 73,5 mld;

- n. 12 lavori nell'anno 1999 per complessive L. 506,6 mld, dei quali:
 - n. 3 al Nord per un importo di L. 185,7 mld,
 - n. 5 al Centro per un importo di L. 79,1 mld,
 - n. 1 al Sud per L. 24 mld,
 - n. 3 alle Isole per L. 217,8 mld.

Due lavori risultano ultimati nel Centro Italia per L. 16,5;

- n. 15 lavori nell'anno 2000 per complessive L. 717,4 mld, dei quali:
 - n. 2 al Nord per L. 105 mld;
 - n. 6 al Centro per L. 316,3 mld;
 - n. 5 al Sud per L. 238,4 mld;
 - n. 2 alle Isole per L. 57,7 mld.

Due lavori risultano ultimati nel Centro Italia per L. 25,5.

7.8. Nessuno dei lavori ultimati risulta collaudato; situazione questa che comporta l'incertezza nella validità e correttezza dei lavori eseguiti e sul loro costo finale, precisato dalla determinazione del saldo finale.

La ragione di tale situazione sembra che vada ricercata nella preposizione dei collaudi – al presente eseguiti gratuitamente dal personale ANAS, perché attività istituzionale – ad un'epoca successiva all'approvazione di un «regolamento» dell'Ente che ne dovrebbe prevedere la remunerazione, come avviene per i collaudi delle opere autostradali.

7.9. Proseguendo nell'analisi degli interventi previsti nel Programma triennale 1998-2000, e sempre con il supporto dei dati informatici del SIL, è emerso che il piano programmatico, di attuazione del Piano Triennale 1997-1999, prevede n. 194 progetti, per un importo complessivo di L. 8.808,8 mld, per la realizzazione di opere pubbliche così suddivise:

- 72 al Nord per L. 3.427,1 mld;
- 41 al Centro per L. 1.839,1 mld;
- 38 al Sud per L. 1.646,6 mld;
- 43 alle Isole per L. 1.896 mld.

Lo stato di dette opere risulta il seguente:

- lavori già consegnati e/o aggiudicati n. 64, per un importo complessivo di L. 3.602.1, dei quali:
 - 17 lavori al Nord per L. 1.222.7 mld,
 - 14 al Centro per L. 709.4 mld,
 - 16 al Sud per L. 810.2 mld,
 - 17 alle Isole per L. 859.8 mld;
- lavori per i quali è stata indetta la gara d'appalto n. 14, per complessive L. 586, dei quali:
 - 8 al Nord per L. 280 mld,
 - 3 al Centro per L. 79 mld,
 - 2 al Sud per L. 60 mld,
 - 1 alle Isole per L. 167 mld;
- lavori la cui fase progettuale, per vari motivi (conferenza di servizi, rilascio pareri, accordi con le Regioni etc.) è ancora da definire, n. 96, per complessive L. 3.390.6 mld, dei quali:
 - 37 al Nord per L. 1.304,4 mld,
 - 19 al Centro per L. 610,7 mld,
 - 18 al Sud per L. 711,4 mld,
 - 22 alle Isole per L. 764,1 mld.

Dai predetti 194 lavori, previsti nel Piano Triennale 1997-1999, sono state stralciate n. 20 opere - per complessive L. 1.230,1 mld - che andranno a far parte del programma dell'anno 2000 che risultano così suddivise:

- 10 opere al Nord per L. 620 mld;
- 5 al Centro per L. 440 mld;
- 2 al Sud per L. 65 mld;
- 3 alle Isole per L. 105,1 mld.

I 64 lavori in corso risultano consegnati e/o aggiudicati in un arco di tempo di 4 anni e precisamente:

- n. 13 lavori nell'anno 1997, per complessive L. 944,2 mld, dei quali:

- 1 al Nord per L. 144,1 mld,
- 2 al Centro per L. 155,5 mld,
- 3 al Sud per L. 206,6 mld,
- 8 alle Isole per L. 438 mld.

Due lavori risultano ultimati, nel Centro Italia, per L. 155,5 mld;

- n. 18 lavori nell'anno 1998, per complessive L. 869,3 mld, dei quali:
 - 1 al Nord per L. 83,6 mld,
 - 6 al Centro per L. 299 mld,
 - 7 al Sud per L. 371,5 mld,
 - 4 alle Isole per L. 115,2 mld.

Quattro lavori risultano ultimati, nel Centro Italia per L. 286,8 mld;

- n. 18 lavori nell'anno 1999, per complessive L. 1.203 mld, dei quali:
 - 8 al Nord per L. 602 mld,
 - 4 al Centro per L. 378,3 mld,
 - 3 al Sud per L. 95,3 mld,
 - 3 alle Isole per L. 127,4 mld.

Nessun lavori risulta ultimato;

- n. 15 lavori nell'anno 2000, per complessive L. 717,4 mld, dei quali:
 - 2 al Nord per L. 105 mld,
 - 6 al Centro per L. 316,3 mld,
 - 5 al Sud per L. 238,4 mld,
 - 2 alle Isole per L. 57,7 mld.

Nessun lavoro risulta ultimato.

7.10. Nessuno dei lavori ultimati risulta collaudato.

Dall'elenco, infine, dei n. 58 interventi previsti nell'anno 2000,

ed appartenenti al Piano Triennale 1998-2000, per un importo complessivo di L. 2.477,6 mld, si rileva che le opere sono così ripartite:

- 25 interventi nel Nord Italia per una spesa di L. 1.090,6 mld;
- 23 interventi nel Centro per una spesa di L. 1.043,7 mld,
- 4 interventi al Sud per una spesa di L. 126,7 mld;
- 6 interventi alle Isole per una spesa di L. 216,6 mld.

Riepilogo lavori piano stralcio 1996

(in miliardi di lire)

Programmati		Territorio	Consegnati		In gara		Da definire	
n.	Importo		n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
32	1.133,4	Nord	13	435,3	7	338,1	12	360,1
40	873,6	Centro	18	556,5	5	22,3	17	193,9
27	483,3	Sud	7	294,9	2	54,9	18	344,9
15	536,2	Isole	7	284,8	1	3,4	7	181,4
114	3.026,5	Totali	45	1.571,5	15	418,7	54	1080,3

di cui n. 8 lavori nel

Programma 2000

Programmati		Territorio
n.	Importo	
5	119,7	Nord
2	9,1	Centro
	0	Sud
1	50,5	Isole
8	179,3	Totali

**Piano Stralcio 1996 - Situazione dei lavori consegnati
Anno 1997**

Territorio	Consegnati		Ultimati	
	n.	Importo	n.	Importo
Nord				
Centro	1	93,4	1	93,4
Sud				
Isole				
Totali	1	93,4	1	93,4

**Piano Stralcio 1996 - Situazione dei lavori consegnati
Anno 1998**

Territorio	Consegnati		Ultimati	
	n.	Importo	n.	Importo
Nord	8	178,7		
Centro	6	294,1	3	73,5
Sud	1	14		
Isole	2	86,8		
Totali	17	573,6	3	73,5

**Piano Stralcio 1996 - Situazione dei lavori consegnati
Anno 1999**

Territorio	Consegnati		Ultimati	
	n.	Importo	n.	Importo
Nord	3	185,7		
Centro	5	79,1	2	16,5
Sud	1	24		
Isole	3	217,8		
Totali	12	506,6	2	16,5

**Piano Stralcio 1996 - Situazione dei lavori consegnati
Anno 2000**

Territorio	Consegnati		Ultimati	
	n.	Importo	n.	Importo
Nord	2	105		
Centro	6	316,3	2	25,5
Sud	5	238,4		
Isole	2	57,7		
Totali	15	717,4	2	25,5

Riepilogo lavori Piano Triennale 1997-1999

Programmati		Territorio	Consegnati		In gara		Da definire	
n.	Importo		n.	Importo	n.	Importo	n.	Importo
72	3.427,1	Nord	17	1.222,7	8	280	37	1.304,4
41	1.839,1	Centro	14	709,4	3	79	19	610,7
38	1.646,6	Sud	16	810,2	2	60	18	711,4
43	1.896	Isole	17	859,8	1	167	22	764,1
194	8.808,8	Totale	64	3.602,1	14	586	96	3.390,6



di cui $\Rightarrow$ n. 20 lavori nel

Programma 2000

Programmati		Territorio
n.	Importo	
10	620	Nord
5	440	Centro
2	65	Sud
3	105,1	Isole
20	1.230,1	Totali
