

## FRIULI VENEZIA GIULIA

Protocollo d'intervento: **474****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD ACQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N 352*

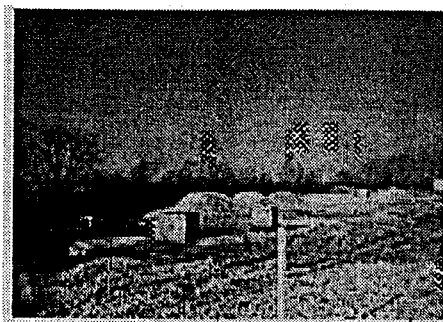
Comune **AQUILEIA (UD)**

Finanziamento **L. 290 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 280.325.219**

- Tot. Pagato **L. 280.325.219**

Cofinanziamento **L. 10 milioni**

*Accessibilità alla basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI AQUILEA**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **00549850303**

Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 7** **AQUILEA (UD)**

Recapiti **Telefono: 0431 91033** **Telefax: 0431 91044**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	MARIO DE CANDIDO S.p.A VIA DELLA STELLA 14 B - PRECENICCO UDINE 01787900305	L. 241.632.017	L. 232.921.400	3,60
<b>Totali</b>		<b>L. 241.632.017</b>	<b>L. 232.921.400</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 300.000.000	L. 290.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (24/01/01)	
Opere Civili	115.000.000	161.131.074	
Opere Impiantistiche	77.000.000	79.292.783	
Arredi e/o Attrezzature	5.560.000		
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>197.560.000</b>		<b>240.423.857</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	8.900.000	19.229.957	
Altre Spese Tecniche	11.200.000		
Allacciamenti	3.000.000		
Imprevisti	9.600.000	410.000	
- Espropri o Acquisizioni	45.000.000		
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	19.750.000	24.042.387	
IVA al 20%	4.620.000	4.890.043	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>102.070.000</b>		<b>48.572.387</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>299.630.000</b>		<b>288.996.244</b>
	<b>Economie</b>		<b>-10.633.756</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>		<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	290.000.000		280.325.219
Risorse proprie	10.000.000		10.000.000
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>300.000.000</b>		<b>290.325.219</b>

Protocollo d'intervento: **475****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *SISTEMA DI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI E PARCHEGGIO DI DISSUAZIONE LUNGO LA STATALE N. 352 A SUD DELL'ABITATO*  
**Comune** **AQUILEIA (UD)**  
**Finanziamento** **L. 450 milioni**  
- Tot. Impegnato **L. 438.034.274**  
- Tot. Pagato **L. 438.034.274**  
**Cofinanziamento** **L. 10 milioni**  
Previsione **Effettiva**  
**Inizio Lavori** *30/09/99* **08/09/99**  
**Fine Lavori** *13/10/99* **29/10/99**

*Accessibilità alla basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** COMUNE DI AQUILEIA  
**Categoria** AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)  
**C.Fis./P.IVA** 00549850303  
**Indirizzo** PIAZZA GARIBALDI, 7 **AQUILEIA (UD)**  
**Recapiti** Telefono: 0431 91033 Telefax: 0431 91044

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
GARA DI LICITAZIONE	ADRIACOS VIA VENDRAMIN 194 LATISANA (UD) BRLLA46A431040D	L. 350.448.000	L. 345.576.948	1,39
<b>Totali</b>		<b>L. 350.448.000</b>	<b>L. 345.576.948</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 460.000.000	L. 450.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (17/01/01)
Opere Civili	200.000.000	460.000.000
Opere Impiantistiche	57.050.000	
Arredi e/o Attrezzature	90.000.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>347.050.000</b>	<b>460.000.000</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	43.008.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	10.600.000	
- Espropri o Acquisizioni	2.000.000	
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	2.000.000	
IVA al 10%	25.705.000	
IVA al 20%	26.601.600	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>114.914.600</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>461.964.600</b>	<b>460.000.000</b>
	Economie	-1.964.600
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	450.000.000	450.000.000
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>460.000.000</b>	<b>460.000.000</b>

Protocollo d'intervento: **478****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A. GRANDI*

Comune **AQUILEIA (UD)**

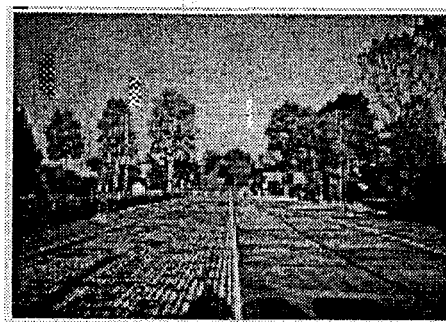
Finanziamento **L. 270 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 266.893.665**

- Tot. Pagato **L. 266.893.665**

Cofinanziamento **L. 10 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	05/08/99	25/06/99
Fine Lavori	02/09/99	31/12/99

*Accessibilità alla basilica***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI AQUILEIA**

Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**

C.Fis./P.IVA **00549850303**

Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 7** **AQUILEIA (UD)**

Recapiti **Telefono: 0431 91033** **Telefax: 0431 91044**

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	MARIO DE CANDIDO S.p.A. VIA DELLA STELLA 14/B, PRECENICCO (UD) 0178790035	L. 219.179.150	L. 218.946.753	0,11
<b>Totali</b>		<b>L. 219.179.150</b>	<b>L. 218.946.753</b>	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 16/11/99	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
Automatico	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 280.000.000	L. 270.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (25/01/01)
Opere Civili	106.000.000	218.946.753
Opere Impiantistiche	70.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	42.600.000	
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>218.600.000</b>	<b>218.946.753</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	8.100.000	8.100.000
Altre Spese Tecniche	11.100.000	7.500.000
Allacciamenti	6.000.000	4.000.000
Imprevisti	8.800.000	11.362.995
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	21.860.000	21.894.675
IVA al 20%	5.040.000	3.840.000
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>60.900.000</b>	<b>56.697.670</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>279.500.000</b>	<b>275.644.423</b>
	<b>Economie</b>	<b>-3.855.577</b>
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	270.000.000	266.893.665
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>280.000.000</b>	<b>276.893.665</b>

Protocollo d'intervento: **484****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL*Comune **AQUILEIA (UD)**Finanziamento **L. 1.649 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.633.889.340**- Tot. Pagato **L. 1.633.889.380**Cofinanziamento **L. 10 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *13/03/99* **30/03/99**Fine Lavori *05/09/99* **07/02/00***Ex fondazione Sissul***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **COMUNE DI AQUILEIA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00549850303**Indirizzo **PIAZZA GARIBALDI, 7****AQUILEIA (UD)**Recapiti **Telefono: 0431 91033****Telefax: 0431 91044****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	EUROCOS VIA DUCA D'AOSTA 10, MONFALCONE (GO) 00520130311	L. 1.341.685.537	L. 1.205.412.875	10,16
Totali		L. 1.341.685.537	L. 1.205.412.875	



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/06/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.700.000.000	L. 1.690.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.564.000.000	L. 1.554.000.000	L. 0	L. 10.000.000	- Lit. -136000000
DM 16/11/99	L. 1.659.000.000	L. 1.554.000.000	L. 0	L. 105.000.000	+ Lit. 95000000
Automatico	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.659.000.000	L. 1.649.000.000	L. 0	L. 10.000.000	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/02/01)
Opere Civili	1.341.685.537	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.341.685.537</b>	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	106.845.717	
Altre Spese Tecniche	63.454.283	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	13.785.909	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	135.168.554	
IVA al 20%	34.060.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>358.314.463</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.643.889.340</b>
	Economie	-56.110.660
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.690.000.000	1.633.889.340
Risorse proprie	10.000.000	10.000.000
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.643.889.340</b>

Protocollo d'intervento: **1221****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA*Comune **AQUILEIA (UD)**Finanziamento **L. 18 milioni**- Tot. Impegnato **L. 18.400.938**- Tot. Pagato **L. 18.400.938**Cofinanziamento **L. 0 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/05/99* **06/05/99**Fine Lavori *27/05/99* **15/06/99***Agenzia Postale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **POSTE ITALIANE E. P.E. SEDE FRIULI V. G.**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **97103880585**Indirizzo **VIA S. ANASTASIO, 12****TRIESTE (TS)**Recapiti Telefono: **040 4195100** Telefax: **040 425018****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	ELLEMME SERRAMENTI S.r.l. VIA FRAUSIN 9, MUGGIA (TS) 00896510328	L. 20.612.574	L. 17.932.939	13,00
Totali		L. 20.612.574	L. 17.932.939	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

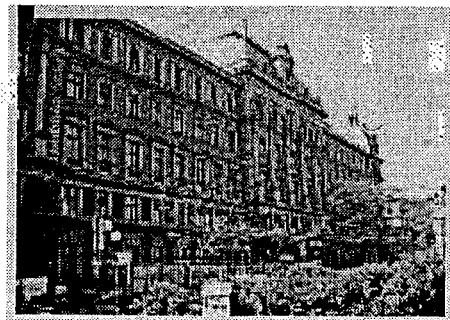
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 18.400.938	L. 18.400.938	L. 0	L. 0	- Lit. -11599062

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (01/06/00)	
Opere Civili	23.000.000	16.064.388	
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature			
Altre Voci			
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>23.000.000</b>	<b>16.064.388</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
Progettazione	3.900.000	1.411.646	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%	2.300.000		
IVA al 20%	800.000	924.904	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.336.550</b>	
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>30.000.000</b>	<b>18.400.938</b>	
	<b>Economie</b>	<b>-11.599.062</b>	
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>	
Finanziamento ex 270/97	30.000.000	18.400.938	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>30.000.000</b>	<b>18.400.938</b>	

Protocollo d'intervento: **1224****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA DIREZIONE DI FILIALE DI PIAZZA VITTORIO VENETO 1*  
**Comune** **TRIESTE (TS)**  
**Finanziamento** **L. 118 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 118.357.851**  
 - Tot. Pagato **L. 118.357.851**  
**Cofinanziamento** **L. 0 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
**Inizio Lavori**                      05/03/99                      30/04/99  
**Fine Lavori**                         03/07/99                      15/11/99

*Filiale delle Poste di piazza V. Veneto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** POSTE ITALIANE E.P.E. SEDE FRIULI V. G.  
**Categoria** AB Enti pubblici  
**C.Fis./P.IVA** 97103880585  
**Indirizzo** VIA S. ANASTASIO, 12 TRIESTE (TS)  
**Recapiti** Telefono: 040 4195100 Telefax: 040 425018

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	PIZZEGHELLA STEVAN  C.SO MILANO 195, VERONA 01834930230	L. 109.905.500	L. 104.080.508	5,30
<b>Totali</b>		L. 109.905.500	L. 104.080.508	

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 06/08/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 20/11/98	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 27/01/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 09/02/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 132.000.000	L. 132.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 118.357.851	L. 118.357.851	L. 0	L. 0	- Lit. -13642149

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/10/00)
Opere Civili	45.000.000	107.478.521
Opere Impiantistiche	65.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>110.000.000</b>	<b>107.478.521</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	9.000.000	10.879.330
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	11.000.000	
IVA al 20%	2.000.000	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>22.000.000</b>	<b>10.879.330</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>132.000.000</b>	<b>118.357.851</b>
	Economie	-13.642.149
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	132.000.000	118.357.851
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>132.000.000</b>	<b>118.357.851</b>

Protocollo d'intervento: **1504****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO CREAZIONE NUOVI SERVIZI IGIENICI VICINI ALL'AREA PARCHEGGIO ESISTENTE</i>	
Comune	<b>SESTO AL REGHENA (PN)</b>	
Finanziamento	L. 420 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 418.530.157
	- Tot. Pagato	L. 418.530.157
Cofinanziamento	L. 110 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	28/02/99	25/01/99
Fine Lavori	30/06/99	14/09/99

*Centro storico***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	COMUNE DI SESTO AL REGHENA	
Categoria	AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	
C.Fis./P.IVA	80003970938	
Indirizzo	PIAZZA CASTELLO, 1	SESTO AL REGHENA (PN)
Recapiti	Telefono: 0434 699101	Telefax: 0434 699500

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
PUBBLICO INCANTO	BERTOLO GIACOMO VIA S. FRANCESCO 61, FIUME VENETO (PN) BRTGMC46L22A357D	L. 430.000.000	L. 410.779.000	4,47
Totali		L. 430.000.000	L. 410.779.000	

## RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

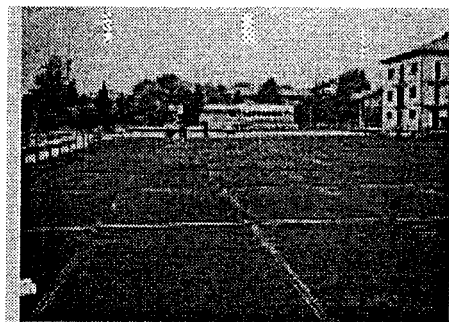
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 509.000.000	L. 399.000.000	L. 110.000.000	L. 0	- Lit. -21000000
Automatico	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	+ Lit. 21000000
DM 21/07/00	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 530.000.000	L. 420.000.000	L. 110.000.000	L. 0	

## CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/02/01)
Opere Civili	430.000.000	
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>430.000.000</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Progettazione	53.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	4.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	43.000.000	
IVA al 20%		
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE COSTO</b>	<b>530.000.000</b>	<b>528.530.157</b>
	Economie	-1.469.843
<b>COPERTURA FINANZIARIA</b>	<b>di progetto (Lire)</b>	<b>finale (Lire)</b>
Finanziamento ex 270/97	420.000.000	418.530.157
Risorse proprie	110.000.000	110.000.000
Altre fonti finanziarie		110.000.000
<b>TOTALE COPERTURE</b>	<b>530.000.000</b>	<b>638.530.157</b>

Protocollo d'intervento: **1676****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

**Titolo Intervento** *PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF. SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCELLO E RELATIVI SERVIZI*  
**Comune** **UDINE (UD)**  
**Finanziamento** **L. 1.235 milioni**  
 - Tot. Impegnato **L. 1.235.233.400**  
 - Tot. Pagato **L. 617.616.700**  
**Cofinanziamento** **L. 600 milioni**  
     Previsione                      Effettiva  
**Inizio Lavori**                      15/09/98                      19/05/99  
**Fine Lavori**                         31/07/99                      12/11/99

*Parcheggi pubblici***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

**Denominazione** COMUNE DI UDINE  
**Categoria** AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)  
**C.Fis./P.IVA** 00168650307  
**Indirizzo** VIA LIONELLO, 1 UDINE (UD)  
**Recapiti** Telefono: 0432 2711                      Telefax: 0432 271539

**DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
	CITY DESIGN SRL VIA POSTIOMA, 4 - RONCADELLE DI ORMELE (TV)		L. 52.687.500	
	DI GIUSTO STRADE SAS VIA JULIA, 45 - MAGNANO IN RIVIERA (UD)	L. 0	L. 123.777.900	0,00
	FAST PARK S.R.L. VIA DEI COLLI PORTIENSI, 545 - ROMA 00902240589	L. 0	L. 1.003.195.000	0,00
	METALCO S.P.A. VIA MARGHERA, 3 - CASTELFRANCO VENETO (TV)	L. 0	L. 86.775.000	0,00
<b>Totali</b>		<b>L. 0</b>	<b>L. 1.266.435.400</b>	
