

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/06/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
Automatico	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.000.000.000	L. 1.400.000.000	L. 0	L. 600.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.835.233.400	L. 1.235.233.400	L. 0	L. 600.000.000	- Lit. -164766600


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/02/00)
Opere Civili	1.600.000.000	1.361.972.900
Opere Impiantistiche	52.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.652.000.000	1.361.972.900
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	16.000.000	20.447.925
Altre Spese Tecniche		52.173.000
Allacciamenti		9.085.417
Imprevisti		45.704.975
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		156.300.210
IVA al 10%		112.697.290
IVA al 20%	332.000.000	76.851.683
SOMME A DISPOSIZIONE	348.000.000	473.260.500
TOTALE COSTO	2.000.000.000	1.835.233.400
	Economie	-164.766.600
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.400.000.000	1.235.233.400
Risorse proprie	600.000.000	600.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.000.000.000	1.835.233.400

Protocollo d'intervento: **1677**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO PER REALIZZAZIONE CENTRO ACCOGLIENZA PER LA GIOVENTU' UDINESE	
Comune	UDINE (UD)	
Finanziamento	L. 680 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 674.594.727
	- Tot. Pagato	L. 607.135.255
Cofinanziamento	L. 247 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	26/05/99	19/05/99
Fine Lavori	15/10/99	16/09/99



Immobile denominato Ex Cappella

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA S. PIO X	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	8005830304	
Indirizzo	VIA MISTRUZZI 1	UDINE (UD)
Recapiti	Telefono: 602620	Telefax: 602620

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ITEL VIA LIGNANO 16, ZUGLIANO/POZZUOLO (UD) 01698170303	L. 52.564.045	L. 51.644.175	1,75
TRATTATIVA PRIVATA	CORI & C. SRL VIA CORMOR BASSO 128, UDINE 01745680304	L. 64.245.000	L. 63.441.940	1,25
TRATTATIVA PRIVATA	I. C. ZANUTTINI VIA PALMARINA 4, S. GIOVANNI AL NATISONE (UD) 00163240302	L. 638.190.955	L. 635.000.000	0,50
Totali		L. 755.000.000	L. 750.086.115	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

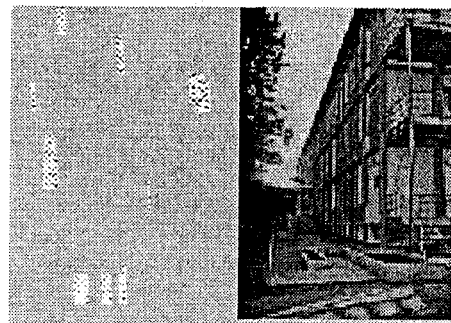
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 01/06/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 05/08/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 13/09/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 16/11/99	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
Automatico	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 21/07/00	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 01/08/00	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/12/00	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	
DM 14/02/01	L. 927.000.000	L. 680.000.000	L. 0	L. 247.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (12/04/00)
Opere Civili	638.190.955	635.000.000
Opere Impiantistiche	116.809.045	115.086.115
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	755.000.000	750.086.115
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	38.000.000	38.000.000
Altre Spese Tecniche	37.000.000	37.000.000
Allacciamenti	5.000.000	5.000.000
Imprevisti	500.000	500.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	91.500.000	91.008.612
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	172.000.000	171.508.612
TOTALE COSTO	927.000.000	921.594.727
	Economie	-5.405.273
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	680.000.000	674.594.727
Risorse proprie	247.000.000	247.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	927.000.000	921.594.727

Protocollo d'intervento: **1683****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL FABBRICATO A DELLA SEDE DELL'I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA*
Comune **UDINE (UD)**
Finanziamento **L. 1.341 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 1.341.214.400**
 - Tot. Pagato **L. 1.341.214.400**
Cofinanziamento **L. 380 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori 30/09/98 30/09/98
Fine Lavori 30/09/99 31/08/99

*Casa dell'Immacolata***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione I.P.A.B. CASA DELL'IMMACOLATA
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 80002170308
Indirizzo VIA CHISIMAIO, 40 UDINE (UD)
Recapiti Telefono: 0432 400389 Telefax: 0432 541659

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
LICITAZIONE PRIVATA	CLOCCHIATTI S.p.A. VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD) 00655390300	L. 1.580.000	L. 1.435.904	9,12
Totali		L. 1.580.000	L. 1.435.904	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

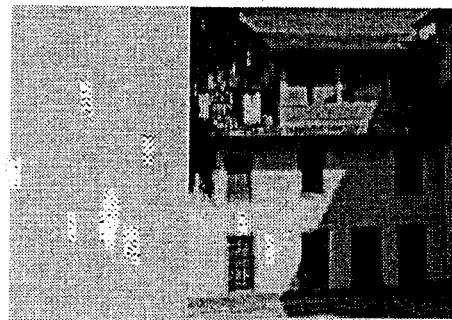
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.880.000.000	L. 1.500.000.000	L. 0	L. 380.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	- Lit. -158785600
DM 01/06/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
Automatico	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.721.214.400	L. 1.341.214.400	L. 0	L. 380.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (18/07/01)
Opere Civili	1.210.000.000	1.201.686.000
Opere Impiantistiche	370.000.000	388.714.000
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.580.000.000	1.590.400.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	79.800.000	97.700.000
Altre Spese Tecniche	38.300.000	77.300.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	158.000.000	159.040.000
IVA al 20%	23.900.000	34.944.419
SOMME A DISPOSIZIONE	300.000.000	368.984.419
TOTALE COSTO	1.880.000.000	1.959.384.419
	Maggiore Spesa	79.384.419
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.341.210.000	1.341.214.400
Risorse proprie	380.000.000	380.000.000
Altre fonti finanziarie		238.170.019
TOTALE COPERTURE	1.721.210.000	1.959.384.419

Protocollo d'intervento: **1684****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ATTA ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO</i>	
Comune	UDINE (UD)	
Finanziamento	L. 380 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 379.678.102
	- Tot. Pagato	L. 379.678.102
Cofinanziamento	L. 200 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>31/01/99</i>	23/12/98
Fine Lavori	<i>15/09/99</i>	27/09/99

*Collegio Suore Dimesse***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	CONGREGAZIONE SUORE COLLEGIO DIMESSE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	00474540309	
Indirizzo	VIA TREPPO, 11	UDINE (UD)
Recapiti	Telefono: 0432 501383	Telefax: 0432 501383

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	COSTRUZIONI DEL BIANCO SRL V.LO DEL PARADISO 5, UDINE 01336940307	L. 445.629.734	L. 429.507.064	3,62
Totali		L. 445.629.734	L. 429.507.064	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

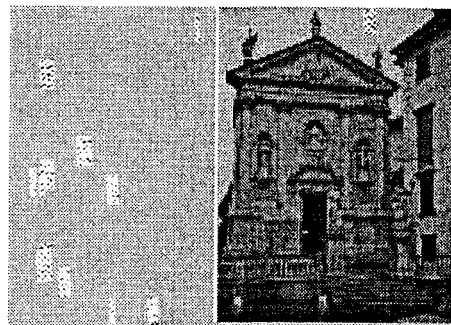
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/06/99	L. 571.000.000	L. 371.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 05/08/99	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	+ Lit. 8680000
DM 13/09/99	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 16/11/99	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
Automatico	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 21/07/00	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 01/08/00	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/12/00	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 14/02/01	L. 579.680.000	L. 379.680.000	L. 0	L. 200.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (02/02/01)
Opere Civili	300.000.000	450.791.002
Opere Impiantistiche	100.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	25.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	425.000.000	450.791.002
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	27.000.000	
Altre Spese Tecniche	24.000.000	59.160.000
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		10.680.000
- Altre voci		
IVA al 10%		45.079.100
IVA al 20%	85.000.000	13.968.000
SOMME A DISPOSIZIONE	146.000.000	128.887.100
TOTALE COSTO	571.000.000	579.678.102
	Maggiore Spesa	8.678.102
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	371.000.000	379.678.102
Risorse proprie	200.000.000	200.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	571.000.000	579.678.102

Protocollo d'intervento: **1685****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>RESTAURO DEL SOFFITTO E DELLE PARETI DELLO SCALONE DEL PALAZZO PATRIARCALE ORA MUSEO DIOCESANO E DELLA FACCIATA E BALAUSTRATA CON STATUE CHE CHIUDE IL SAGRATO DELL'ANNESSA CHIESA DI S. ANTONIO AB.</i>	
Comune	UDINE (UD)	
Finanziamento	L. 210 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 209.500.000
	- Tot. Pagato	L. 209.500.000
Cofinanziamento	L. 38 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	<i>01/03/99</i>	01/03/99
Fine Lavori	<i>31/07/99</i>	28/07/99

*Palazzo patriarcale e Chiesa di S. Antonio Abate***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	ARCIDIOCESI DI UDINE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	01541850309	
Indirizzo	PIAZZA DEL PATRIARCATO, 1	UDINE (UD)
Recapiti	Telefono: 0432 504314	Telefax: 0432 511838

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	A.T.I. ARTERESTAURI SAS - EU.CO.RE. Sas VIA ROMA 18, POCENIA (UD) 01760930303	L. 230.000.000	L. 225.000.000	2,17
Totali		L. 230.000.000	L. 225.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 06/08/98	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 20/11/98	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 27/01/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 09/02/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 01/06/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 05/08/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 13/09/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 16/11/99	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
Automatico	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 21/07/00	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 01/08/00	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 14/12/00	L. 253.000.000	L. 215.000.000	L. 0	L. 38.000.000	
DM 14/02/01	L. 247.500.000	L. 209.500.000	L. 0	L. 38.000.000	- Lit. -5500000

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (03/02/00)
Opere Civili		225.000.000
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci	230.000.000	
TOTALE LAVORI	230.000.000	225.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione		
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	23.000.000	22.500.000
IVA al 20%		
SOMME A DISPOSIZIONE	23.000.000	22.500.000
TOTALE COSTO	253.000.000	247.500.000
	Economie	-5.500.000
COPERTURA FINANZIARIA		
	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	215.000.000	209.500.000
Risorse proprie	38.000.000	38.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	253.000.000	247.500.000

Protocollo d'intervento: **1692****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA ED ANTINCENDIO DI PALAZZO ELTI PER MOSTRE ESPOSIZIONI PINACOTECA BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO*
Comune **GEMONA DEL FRIULI (UD)**
Finanziamento **L. 248 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 223.200.000**
 - Tot. Pagato **L. 223.200.000**
Cofinanziamento **L. 232 milioni**
 Previsione Effettiva
Inizio Lavori *01/02/99* **27/01/99**
Fine Lavori *05/07/99* **04/10/99**



Palazzo Elti

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Categoria AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)
C.Fis./P.IVA 00311520308
Indirizzo P.ZZA MUNICIPIO, 2 GEMONA DEL FRIULI (UD)
Recapiti Telefono: 0432 973211 Telefax: 0432 971090

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
ASTA PUBBLICA	BASALDELLA SNC VIA S. MARTINO 5, MAIANO (UD) 00677050304	L. 317.000.000	L. 275.029.200	13,24
Totali		L. 317.000.000	L. 275.029.200	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 06/08/98	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 20/11/98	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 27/01/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 09/02/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 01/06/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 05/08/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 13/09/99	L. 310.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 62.000.000	
DM 16/11/99	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000 + Lit. 170000000	
Automatico	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 21/07/00	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 01/08/00	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 14/12/00	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	
DM 14/02/01	L. 480.000.000	L. 248.000.000	L. 0	L. 232.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (04/09/01)
Opere Civili	80.000.000	317.308.563
Opere Impiantistiche	110.000.000	
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	190.000.000	317.308.563
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	37.000.000	
Altre Spese Tecniche	26.000.000	109.944.450
Allacciamenti		
Imprevisti	6.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		4.653.680
IVA al 10%		
IVA al 20%	51.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	120.000.000	114.598.130
TOTALE COSTO	310.000.000	431.906.693
	Maggiore Spesa	121.906.693
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	248.000.000	199.906.693
Risorse proprie	62.000.000	232.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	310.000.000	431.906.693

Protocollo d'intervento: **1709****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE*

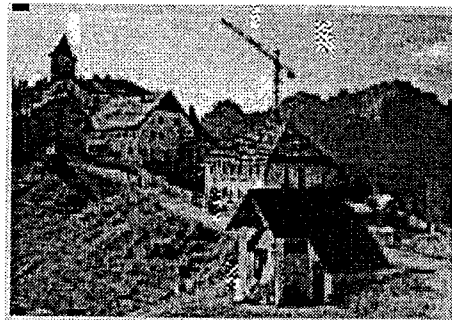
Comune **TARVISIO (UD)**

Finanziamento **L. 2.208 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 2.187.407.602**

- Tot. Pagato **L. 1.968.666.842**

Cofinanziamento **L. 360 milioni**

*Fabbricati della Parrocchia di S. Egidio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI S. EGIDIO**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **84001150303**

Indirizzo **VIA VALCANALE, 79** **CAMPOROSSO DI TARVISIO (UD)**

Recapiti **Telefono: 0428 63006** **Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI CORSO AMEDEO DI SAVOIA 210, NAPOLI 03579980636	L. 2.420.000.000	L. 2.223.980.000	8,10
Totali		L. 2.420.000.000	L. 2.223.980.000	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/06/99	L. 3.600.000.000	L. 3.240.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	Lit. -215000000
DM 13/09/99	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
Automatico	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.385.000.000	L. 3.025.000.000	L. 0	L. 360.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.568.434.602	L. 2.208.434.602	L. 0	L. 360.000.000	Lit. -816565398

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (14/09/01)
Opere Civili	1.600.000.000	1.672.580.000
Opere Impiantistiche	780.000.000	551.400.000
Arredi e/o Attrezzature	260.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	2.640.000.000	2.223.980.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	300.000.000	201.000.000
Altre Spese Tecniche	80.000.000	189.000.000
Allacciamenti	40.000.000	23.000.000
Imprevisti	100.000.000	31.600.000
- Espropri o Acquisizioni		87.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	50.000.000	232.477.500
IVA al 10%	252.000.000	222.398.000
IVA al 20%	138.000.000	152.815.500
SOMME A DISPOSIZIONE	960.000.000	1.139.291.000
TOTALE COSTO	3.600.000.000	3.363.271.000
	Economie	-236.729.000
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	3.240.000.000	2.547.407.602
Risorse proprie	360.000.000	815.863.398
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	3.600.000.000	3.363.271.000

Protocollo d'intervento: 1720

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento	REALIZZAZIONE DI POSTI LETTO A BASSO COSTO CON ANNESSI SERVIZI GENERALI RISTORO E SOSTA	
Comune	PALMANOVA (UD)	
Finanziamento	L. 1.116 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 1.088.518.117
	- Tot. Pagato	L. 1.088.518.117
Cofinanziamento	L. 250 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	20/10/98	19/10/98
Fine Lavori	30/09/99	



immobile sito piazza Grande

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione	PARROCCHIA SS. REDENTORE	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA	81000110304	
Indirizzo	PIAZZA GRANDE, 17	PALMANOVA (UD)
Recapiti	Telefono: 0432 928337	Telefax: 0432 928337

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA (GARA UFFICIOSA)	MICOL PICCOLI ARREDARE ITALIA VIA UMBERTO I 68, FAGAGNA (UD) 01960490306	L. 105.000.000	L. 101.041.500	3,77
TRATTATIVA PRIVATA	CLOCCHIATI SPA VIA ADIGE 3, POVOLETTO (UD) 00109210328	L. 1.035.304.195	L. 958.588.154	7,41
Totali		L. 1.140.304.195	L. 1.059.629.654	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 06/08/98	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 20/11/98	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 27/01/99	L. 1.450.000.000	L. 1.200.000.000	L. 0	L. 250.000.000	
DM 09/02/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	- Lit. -84387645
DM 01/06/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 05/08/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 13/09/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 16/11/99	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
Automatico	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 21/07/00	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 01/08/00	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/12/00	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	
DM 14/02/01	L. 1.365.612.355	L. 1.115.612.355	L. 0	L. 250.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/01/01)
Opere Civili	634.523.154	656.853.385
Opere Impiantistiche	324.065.000	326.433.448
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	958.588.154	983.286.833
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	111.000.000	110.044.000
Altre Spese Tecniche	8.000.000	
Allacciamenti	5.000.000	
Imprevisti	30.241.260	
- Espropri o Acquisizioni		3.000.000
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		101.041.500
- Altre voci	108.000.000	
IVA al 10%	99.382.941	98.328.684
IVA al 20%	45.400.000	42.817.100
SOMME A DISPOSIZIONE	407.024.201	355.231.284
TOTALE COSTO	1.365.612.355	1.338.518.117
	Economie	-27.094.238
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.115.612.000	1.078.413.962
Risorse proprie	250.000.000	260.104.155
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	1.365.612.000	1.338.518.117

Protocollo d'intervento: **2358****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *OSTELLO PER LA GIOVENTU'*
 Comune **UDINE (UD)**
 Finanziamento **L. 200 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 199.557.159**
 - Tot. Pagato **L. 199.557.159**
 Cofinanziamento **L. 296 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **01/03/99 15/04/99**
 Fine Lavori **31/08/99 14/12/99**

*Ostello della gioventù***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE SPOSO B.V.M.**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **800022470302**
 Indirizzo **VIALE VENEZIA, 285 UDINE (UD)**
 Recapiti **Telefono: 0432 232294 Telefax:**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo	Importo	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	a base di Gara	Aggiudicazione	Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	BOTTO GUIDO E F. IMPRESA DI COSTRUZIONE VIA CATANIA 26, UDINE 00181480302	L. 320.847.825	L. 316.419.419	1,38
Totali		L. 320.847.825	L. 316.419.419	
