

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 50.000.000	L. 50.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 37.795.001	L. 37.795.001	L. 0	L. 0	Lit. -12204999


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (22/03/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	41.667.000	31.495.834	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	41.667.000		31.495.834
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	8.333.000	6.299.167	
SOMME A DISPOSIZIONE	8.333.000		6.299.167
TOTALE COSTO	50.000.000		37.795.001
		Economic	-12.204.999
<i>COPERTURA FINANZIARIA</i>	di progetto (Lire)	finale (Lire)	
Finanziamento ex 270/97	50.000.000	37.795.001	
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	50.000.000	37.795.001	

Protocollo d'intervento: **6405**

DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO

Titolo Intervento *COPERTURA IN TENSOSTRUTTURE PER AREE DI SOSTA VEICOLI LEGGERI IN ATTESA DI IMBARCO*
 Comune **ANCONA (AN)**
 Finanziamento **L. 466 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 466.198.958**
 - Tot. Pagato **L. 464.926.739**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **20/07/99**
 Fine Lavori **22/08/99** **10/08/99**

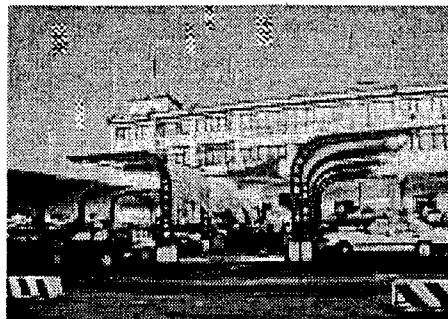

Porto

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**
 Categoria **AB** Enti pubblici
 C.Fis./P.IVA **00093910420**
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA** **ANCONA (AN)**
 Recapiti **Telefono: 071 207891** **Telefax: 071 2078940**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	TENSO COVER ENGINEERING VIA GIOLITTI, 67 - SICOLO (AN)	L. 320.081.479	L. 320.081.479	0,00

Totali L. 320.081.479 L. 320.081.479

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 09/02/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/06/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 800.000.000	L. 800.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 554.888.559	L. 554.888.559	L. 0	L. 0	Lit. -245111441
Automatico	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	Lit. -73000000
DM 21/07/00	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 481.888.559	L. 481.888.559	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 466.198.958	L. 466.198.958	L. 0	L. 0	Lit. -15689601


CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (30/05/00)
Opere Civili	47.752.680	39.154.671
Opere Impiantistiche	41.615.800	34.183.798
Arredi e/o Attrezzature	304.621.000	246.743.010
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	393.989.480	320.081.479
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	68.417.653	59.884.304
Altre Spese Tecniche		7.526.000
Allacciamenti		
Imprevisti		
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	92.481.426	77.434.956
SOMME A DISPOSIZIONE	160.899.079	144.845.260
TOTALE COSTO	554.888.559	464.926.739
	Economie	-89.961.820
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	554.888.559	464.926.739
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	554.888.559	464.926.739

Protocollo d'intervento: **6407**

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO

Titolo Intervento *PERCORSI PEDONALI PROTETTI*
 Comune **ANCONA (AN)**
 Finanziamento **L. 567 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 566.293.375**
 - Tot. Pagato **L. 396.371.552**
 Cofinanziamento **L. 209 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *12/07/99* **12/07/99**
 Fine Lavori *29/10/99* **31/01/00**

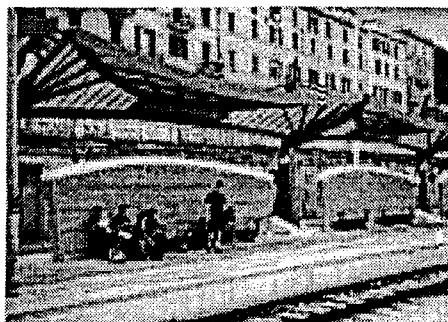

Porto

DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **00093910420**
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA** **ANCONA (AN)**
 Recapiti **Telefono: 071 207891 Telefax: 071 2078940**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
GARA A TRATTATIVA PRIVATA	CONSEDIL VIA FIUMESINO, 65/B FALCONARA MARITTIMA (AN)	L. 0	L. 676.446.722	0,00
Totali		L. 0	L. 676.446.722	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 600.000.000	L. 600.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 775.000.000	L. 600.000.000	L. 175.000.000	L. 0	+ Lit. 175000000
Automatico	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	- Lit. -33000000
DM 21/07/00	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 742.000.000	L. 567.000.000	L. 175.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 775.706.625	L. 567.000.000	L. 208.706.625	L. 0	+ Lit. 33706625

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 90 % (08/06/00)	
Opere Civili	548.272.798	600.977.395	
Opere Impiantistiche	6.366.202	6.366.202	
Arredi e/o Attrezzature	73.709.841	52.271.280	
Altre Voci	14.391.256	14.392.206	
TOTALE LAVORI		642.740.097	674.007.083
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	80.790.000	82.510.533	
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti	1.688.078	1.980.253	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	16.075.200	16.502.111	
SOMME A DISPOSIZIONE		98.553.278	100.992.897
TOTALE COSTO		741.293.375	774.999.980
		Maggiore Spesa	33.706.605
COPERTURA FINANZIARIA		di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97		600.000.000	566.293.375
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			208.706.625
TOTALE COPERTURE		600.000.000	775.000.000

Protocollo d'intervento: **6408****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *SISTEMA INFORMAZIONE PASSEGGERI*
 Comune **ANCONA (AN)**
 Finanziamento **L. 52 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 52.192.001**
 - Tot. Pagato **L. 52.191.600**
 Cofinanziamento **L. 0 milioni**
 Previsione **Effettiva**
 Inizio Lavori **20/09/99 28/09/99**
 Fine Lavori **20/10/99**

*Porto***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA**
 Categoria **AB Enti pubblici**
 C.Fis./P.IVA **00093910420**
 Indirizzo **MOLO S. MARIA STAZIONE MARITTIMA ANCONA (AN)**
 Recapiti **Telefono: 071 207891 Telefax: 071 2078940**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	TRANSTEL ASSISTENZA S.R.L. Via Castellini, 17 - Ponte S.Giovanni PG	L. 66.666.667	L. 437.493.334	-556,24
Totali		L. 66.666.667	L. 437.493.334	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 01/06/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 05/08/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/12/00	L. 80.000.000	L. 80.000.000	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 52.192.001	L. 52.192.001	L. 0	L. 0	L.R. -27807999

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/06/00)	
Opere Civili			
Opere Impiantistiche			
Arredi e/o Attrezzature	66.666.666	43.493.334	
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	66.666.666	43.493.334	
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione			
Altre Spese Tecniche			
Allacciamenti			
Imprevisti			
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci			
IVA al 10%			
IVA al 20%	13.333.333	8.698.667	
SOMME A DISPOSIZIONE	13.333.333	8.698.667	
TOTALE COSTO	79.999.999	52.192.001	
	Economie		-27.807.998
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	80.000.000		52.192.001
Risorse proprie			
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	80.000.000		52.192.001

Protocollo d'intervento: **6413****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE*
 Comune **ASCOLI PICENO (AP)**
 Finanziamento **L. 2.300 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 2.262.325.033**
 - Tot. Pagato **L. 2.036.092.529**
 Cofinanziamento **L. 2.666 milioni**

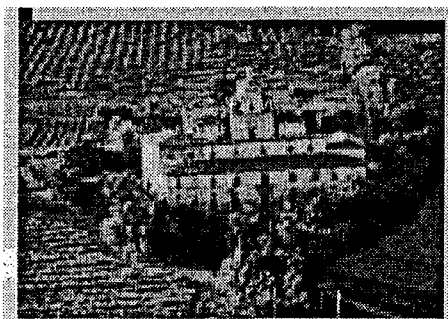*Complesso di Villa Sgariglia***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **COMUNE DI ASCOLI PICENO**
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA **00229010442**
 Indirizzo **PIAZZA ARRINGO** **ASCOLI PICENO (AP)**
 Recapiti **Telefono: 0736 298234** **Telefax: 0736 298234**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	COORAL Soc. P. Coop. a r.l. via Candido Augusto Vecchi 7, Ascoli Piceno 01134570447	L. 0	L. 21.800.000	0,00
ASTA PUBBLICA	Spinosa costruz. generali srl via Idrio 36/a Isemia 00302090949	L. 0	L. 384.963.298	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	ECO SERVICES di Traini per. agr. Giuseppe via Ancaranese, Villa S. Antonio (AP) 011840904445	L. 0	L. 9.500.000	0,00
ASTA PUBBLICA	Spinosa costruz. generali srl via Idrio 36/a Isemia 00302090949	L. 2.487.276.901	L. 2.078.488.214	16,44
Totali		L. 2.487.276.901	L. 2.494.751.512	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 3.000.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 06/08/98	L. 3.000.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 20/11/98	L. 3.000.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 27/01/99	L. 3.000.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 200.000.000	
DM 09/02/99	L. 3.820.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	+ Lit. 820000000
DM 01/06/99	L. 3.820.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 05/08/99	L. 3.820.000.000	L. 2.800.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
DM 13/09/99	L. 3.320.000.000	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	- Lit. -500000000
DM 16/11/99	L. 3.320.000.000	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 1.020.000.000	
Automatico	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	+ Lit. 1646238432
DM 21/07/00	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	
DM 01/08/00	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	
DM 14/12/00	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	
DM 14/02/01	L. 4.966.238.432	L. 2.300.000.000	L. 0	L. 2.666.238.432	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (07/10/99)	
Opere Civili	1.800.000.000	1.687.371.733	
Opere Impiantistiche	312.000.000	631.100.000	
Arredi e/o Attrezzature	288.000.000	156.051.000	
Altre Voci		34.500.000	
TOTALE LAVORI	2.400.000.000		2.509.022.733
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	138.040.000	134.769.502	
Altre Spese Tecniche	31.533.000	98.622.295	
Allacciamenti	50.000.000	13.636.364	
Imprevisti	82.000.000	208.098.876	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci	10.000.000		
IVA al 10%	254.200.000	273.075.799	
IVA al 20%	33.910.000	45.099.463	
SOMME A DISPOSIZIONE	599.683.000		773.302.299
TOTALE COSTO	2.999.683.000		3.282.325.032
	Maggiore Spesa		282.642.032
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.800.000.000		2.262.325.032
Risorse proprie	1.020.000.000		1.020.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	3.820.000.000		3.282.325.032

Protocollo d'intervento: **6424****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *CENTRO DI ACCOGLIENZA PER PELLEGRINI GIUBILARI E ASSISTENZA RELIGIOSA CON RISTORAZIONE E RICETTIVITA' NOTTURNA CENTRO STUDI RICCIANO*

Comune **MACERATA (MC)**

Finanziamento **L. 12.230 milioni**

- Tot. Impegnato **L. 12.229.762.441**

- Tot. Pagato **L. 12.229.762.440**

Cofinanziamento **L. 4.806 milioni**

	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	10/07/98	31/07/98
Fine Lavori	10/10/99	

*Centro studi Ricciano***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **SEM. MISS. DIOC. REDEMPTORIS MATER**

Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**

C.Fis./P.IVA **93017070439**

Indirizzo **VIA CINCINELLI, 4** **MACERATA (MC)**

Recapiti **Telefono: 0733.261719** **Telefax: 0733 261719**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
TRATTATIVA PRIVATA	ELECTA snc via Addolorata 102, Recanati (MC) 00133890434	L. 19.400.000	L. 19.206.000	1,00
TRATTATIVA PRIVATA	STUDIO 3 P.zza Cesare Battisti 1, Macerata 01152910434	L. 27.150.000	L. 23.077.500	15,00
TRATTATIVA PRIVATA	CAPITA' snc via E. Mattei, Recanati (MC) 00098560436	L. 40.044.500	L. 30.573.263	23,65
TRATTATIVA PRIVATA	LUCIANO CANAL via Fondamenta Santi 34/a, Murano (VE) 02131690279	L. 60.680.000	L. 60.073.200	1,00
TRATTATIVA PRIVATA	ITCAM srl P.le Mercurio 5/7, Macerata 01066420439	L. 78.505.700	L. 64.374.674	18,00

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 06/08/98	L. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 20/11/98	L. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 27/01/99	L. 22.026.000.000	L. 15.420.000.000	L. 0	L. 6.606.000.000	
DM 09/02/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	- Lit. -4491000000
DM 01/06/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 05/08/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 13/09/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 16/11/99	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
Automatico	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 21/07/00	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 01/08/00	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 14/12/00	L. 17.535.000.000	L. 12.729.000.000	L. 0	L. 4.806.000.000	
DM 14/02/01	L. 17.035.762.441	L. 12.229.762.441	L. 0	L. 4.806.000.000	- Lit. -499237559

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (14/11/00)
Opere Civili	14.255.860.000	13.409.848.907
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature	1.410.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	15.665.860.000	13.409.848.907
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	640.000.000	645.600.000
Altre Spese Tecniche	884.900.000	1.001.149.672
Allacciamenti	210.000.000	231.598.920
Imprevisti	712.790.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato	1.800.000.000	
- Opere Civili	100.000.000	
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		171.452.027
IVA al 10%	1.425.590.000	
IVA al 20%	586.860.000	1.719.145.338
SOMME A DISPOSIZIONE	6.360.140.000	3.768.945.957
TOTALE COSTO	22.026.000.000	17.178.794.864
	Economie	-4.847.205.136
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	15.420.000.000	12.229.638.396
Risorse proprie	6.606.000.000	4.949.156.468
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	22.026.000.000	17.178.794.864

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento:		6424		
TRATTATIVA PRIVATA	SAITEX TENDAGGI snc di Zoppi & C. via Giovanni XXIII 7, Camerano (AN)	L. 99.000.000	L. 79.695.000	19,50
TRATTATIVA PRIVATA	KAM srl via Piave 66, Latina 01395850595	L. 99.500.000	L. 95.520.000	4,00
TRATTATIVA PRIVATA	CENTRO LITURGICO CAAL srl via U. Balzani 29, Roma 04354071005	L. 103.612.000	L. 101.539.760	2,00
TRATTATIVA PRIVATA	TROBBIANI E BETTUCCI via Giovanni XXIII 5, Sforzacosta (MC) 00082460437	L. 106.700.000	L. 93.960.000	11,94
TRATTATIVA PRIVATA	G. MANZONI srl via del Consorzio 33, Falconara (AN) 00072220932	L. 148.472.000	L. 136.980.000	7,74
TRATTATIVA PRIVATA	L'ARCA via Casilina 1198, Roma 03696531007	L. 164.000.000	L. 155.800.000	5,00
TRATTATIVA PRIVATA	ELECTA snc via Addolorata 102, Recanati (MC) 00133890434	L. 182.300.000	L. 178.654.000	2,00
TRATTATIVA PRIVATA	MOBILCASA ROSSI srl ss. 78 km 31, Sarnano (MC) 01192530432	L. 190.900.000	L. 179.446.000	6,00
LICITAZIONE PRIVATA	FRA. SA. srl impresa costruz. v. S.Pietro e Paolo 24 Roma 000481580587	L. 14.255.858.088	L. 11.564.352.081	18,88
Totali		L. 15.576.122.288	L. 12.783.251.478	

PAGINA BIANCA

Protocollo d'intervento: **6446****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **SISTEMAZIONE FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO E DEL PIAZZALE ANTISTANTE**
 Comune **PIORACO (MC)**
 Finanziamento **L. 350 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 322.645.244**
 - Tot. Pagato **L. 322.645.244**
 Cofinanziamento **L. 225 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori **21/09/98 07/09/98**
 Fine Lavori **18/07/99 21/10/99**

*Chiesa di S. Francesco***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione
 Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**
 C.Fis./P.IVA
 Indirizzo
 Recapiti Telefono: Telefax:

0

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Ditta O.E.S. srl via Colli Alti 133, Signa (FI)	L. 27.693.000	L. 27.693.000	0,00
LICITAZIONE PRIVATA	Principi e Montesi Impr. Cost. v. corvi 12 Senigallia (AN) 00080160427	L. 365.034.885	L. 341.307.618	6,50
Totali		L. 392.727.885	L. 369.000.618	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 06/08/98	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 20/11/98	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 27/01/99	L. 455.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 105.000.000	
DM 09/02/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	+ Lit. 120000000
DM 01/06/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 05/08/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 13/09/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 16/11/99	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
Automatico	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 21/07/00	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 01/08/00	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 14/12/00	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	
DM 14/02/01	L. 575.000.000	L. 350.000.000	L. 0	L. 225.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (27/07/01)	
Opere Civili	216.000.000	341.307.596	
Opere Impiantistiche	16.000.000		
Arredi e/o Attrezzature	70.000.000		
Altre Voci			
TOTALE LAVORI	302.000.000		341.307.596
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Progettazione	17.800.000	63.324.314	
Altre Spese Tecniche	21.800.000		
Allacciamenti			
Imprevisti	37.600.000	17.065.370	
- Espropri o Acquisizioni			
- Area o Fabbricato			
- Opere Civili			
- Opere Impiantistiche			
- Arredi e/o attrezzature			
- Altre voci		77.632.559	
IVA al 10%		34.130.760	
IVA al 20%	75.800.000	14.184.646	
SOMME A DISPOSIZIONE	153.000.000		206.337.649
TOTALE COSTO	455.000.000		547.645.245
	Maggiore Spesa		92.645.245
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)		finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	350.000.000		322.645.244
Risorse proprie	105.000.000		225.000.000
Altre fonti finanziarie			
TOTALE COPERTURE	455.000.000		547.645.244

Protocollo d'intervento: **6480****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento *COMPLETAMENTO DEL RESTAURO GENERALE DELLA CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO*
 Comune **ASCOLI PICENO (AP)**
 Finanziamento **L. 800 milioni**
 - Tot. Impegnato **L. 799.803.000**
 - Tot. Pagato **L. 799.803.000**
 Cofinanziamento **L. 459 milioni**
 Previsione Effettiva
 Inizio Lavori *04/05/99* *16/11/98*
 Fine Lavori *30/07/99* *26/07/99*

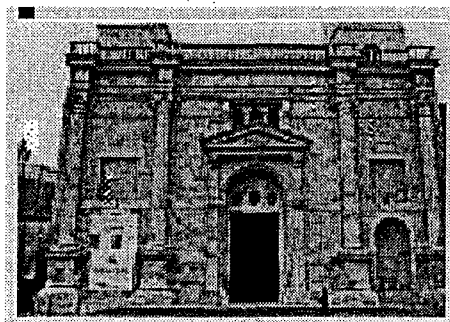*Cattedrale di S. Emidio***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **CHIESA CATTEDRALE DI S. EMIDIO**
 Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
 C.Fis./P.IVA **92004850449**
 Indirizzo **PIAZZA ARRINGO, 10/C** **ASCOLI PICENO (AP)**
 Recapiti **Telefono: 0736 259901** **Telefax: 0736 259901**

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	Impresa Luigi Travaglini v. 260ma 48 Ascoli Piceno 01433840442	L. 340.000.000	L. 288.388.000	15,18
LICITAZIONE PRIVATA	Impresa Luigi Travaglini v. 260ma 48 Ascoli Piceno 01433840442	L. 590.000.000	L. 571.415.000	3,15
Totali		L. 930.000.000	L. 859.803.000	
