

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

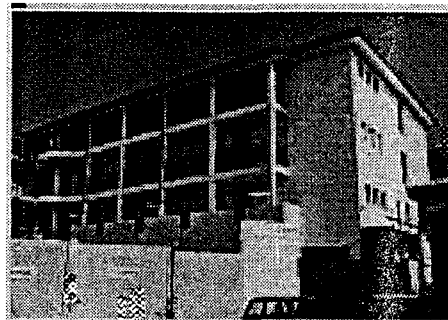
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 06/08/98	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 20/11/98	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 27/01/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 09/02/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 01/06/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 05/08/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 13/09/99	L. 4.100.000.000	L. 2.000.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 16/11/99	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	Lit. -203000000
Automatico	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 21/07/00	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 01/08/00	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 14/12/00	L. 3.897.000.000	L. 1.797.000.000	L. 0	L. 2.100.000.000	
DM 14/02/01	L. 3.896.497.600	L. 1.796.497.600	L. 0	L. 2.100.000.000	Lit. -502400

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/06/99)
Opere Civili	1.358.000.000	1.262.940.000
Opere Impiantistiche	718.000.000	660.900.000
Arredi e/o Attrezzature	434.000.000	403.928.000
Altre Voci	576.000.000	576.000.000
TOTALE LAVORI	3.086.000.000	2.903.768.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	164.000.000	164.000.000
Altre Spese Tecniche	25.000.000	25.000.000
Allacciamenti	15.000.000	15.000.000
Imprevisti	329.600.000	329.600.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	240.600.000	225.344.000
IVA al 20%	239.800.000	233.785.600
SOMME A DISPOSIZIONE	1.014.000.000	992.729.600
TOTALE COSTO	4.100.000.000	3.896.497.600
	Economie	-203.502.400
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	2.000.000.000	1.796.497.600
Risorse proprie	2.100.000.000	2.100.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	4.100.000.000	3.896.497.600

Protocollo d'intervento: **3997****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 1.121 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.120.702.002**- Tot. Pagato **L. 1.120.702.002**Cofinanziamento **L. 6.000 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *07/05/98* **26/02/98**Fine Lavori *10/08/99* **26/11/99***Casa Breda***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PIA FONDAZIONE V. S. BREDA**Categoria **AA Amministrazioni pubbliche - (art. 1 D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)**C.Fis./P.IVA **00679500280**Indirizzo **VIA IPPODROMO, 2****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8290611****Telefax: 049 8290859****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
	DITTA EDOM ESCENSORI VIA DEL COMMERCIO, 20 SPINEA - VENEZIA		L. 134.738.762	
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA ECOM ASCENSORI VIA DEL COOMERCIO, 20 SPINEA (VE)	L. 0	L. 134.738.762	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	RUBINI SRL VIA VIGONOVESE, 34/A - OADOVA 02055440289	L. 16.380.463	L. 16.380.463	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA TURCATO ORLANDO VIA BAROZZI 9, PADOVA 002544270283	L. 96.854.546	L. 96.854.546	0,00
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA SIMEONATO SERRAMENTI SRL VIA M. VISENTIN 42, CAMPOSAMPIERO (PD) 00104020284	L. 113.298.413	L. 89.902.291	20,65

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 06/08/98	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 20/11/98	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 27/01/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 09/02/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 01/06/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 05/08/99	L. 10.000.000.000	L. 4.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 13/09/99	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	- Lit. -1000000000
DM 16/11/99	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
Automatico	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 21/07/00	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 01/08/00	L. 9.000.000.000	L. 3.000.000.000	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	
DM 14/12/00	L. 8.441.882.333	L. 2.441.882.333	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	- Lit. -558117667
DM 14/02/01	L. 7.120.702.002	L. 1.120.702.002	L. 3.600.000.000	L. 2.400.000.000	- Lit. -1321180331

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (20/09/01)
Opere Civili	4.650.000.000	3.391.894.674
Opere Impiantistiche	2.400.000.000	2.039.981.394
Arredi e/o Attrezzature	500.000.000	450.569.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	7.550.000.000	5.882.445.068
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	400.000.000	786.360.000
Altre Spese Tecniche	485.000.000	218.759.067
Allacciamenti	50.000.000	76.638.000
Imprevisti	423.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	705.000.000	
IVA al 20%	387.000.000	965.429.176
SOMME A DISPOSIZIONE	2.450.000.000	2.047.186.243
TOTALE COSTO	10.000.000.000	7.929.631.311
	Economie	-2.070.368.689
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	4.000.000.000	1.120.702.002
Risorse proprie	6.000.000.000	6.000.000.000
Altre fonti finanziarie		808.929.309
TOTALE COPERTURE	10.000.000.000	7.929.631.311

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Protocollo d'intervento: **3997**

TRATTATIVA PRIVATA	DITTA TURCATO ORLANDO VIA BAROZZI 9, PADOVA 00254270283	L. 152.768.520	L. 131.726.849	13,77
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA MATTIOLI SPA VIA CRIMEA 94, PADOVA 01269440283	L. 213.186.438	L. 185.791.980	12,85
TRATTATIVA PRIVATA	DITTA PIOVANELLO SNC VIA G. PASCOLI 33, ALBIGNASEGO (PD) 01297110288	L. 231.325.514	L. 200.096.569	13,50
TRATTATIVA PRIVATA	PIOVANELLO SNC VIA G. PASCOLI 33, ALBIGNASEGO (PD) 01297110288	L. 313.588.265	L. 279.093.555	11,00
ASTA PUBBLICA	COGEFAC SRL VIALE AUGUSTO 148, NAPOLI 06782080631	L. 385.000.000	L. 343.612.500	10,75
	FARAM SPA VIA SCHIAVONESSA, 71 - GIOVERA DEL MONTELLO	L. 490.000.000	L. 413.778.000	15,56
	MATTIOLI SPA VIA CRIMEA 94, PADOVA	L. 777.740.446	L. 716.687.820	7,85
ASTA PUBBLICA	FROZZI CAV. ADOLFO VIA VOLTAPALETTO 32, FERRARA 00454530387	L. 2.000.554.120	L. 1.735.480.700	13,25
Totali		L. 4.790.696.725	L. 4.478.882.797	

PAGINA BIANCA

Protocollo d'intervento: **3998****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	
Comune	SANTA GIUSTINA (BL)	
Finanziamento	L. 180 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 179.870.645
	- Tot. Pagato	L. 179.870.645
Cofinanziamento	L. 150 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/07/99	30/07/99
Fine Lavori	16/10/99	28/10/99

*Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	
Categoria	AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA SARTENA ALTA 1	S. GIUSTINA (BL)
Recapiti	Telefono: 0437/858324	Telefax: 0437/8584324

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
MASSIMO RIBASSO	VAROTTO FABIO VIA E. FERMI 3, SEDICO (BL) 005657300256	L. 7.000.000	L. 6.986.000	0,20
MASSIMO RIBASSO	PANATTONI SRL VIA TAGLIAPIETRA 23, BELLUNO	L. 28.695.400	L. 11.668.320	59,34
MASSIMO RIBASSO	PIAIA DENIS VIA ROREI 127, SOSPIROLO (BL) 00825820251	L. 59.000.000	L. 11.500.000	80,51
MASSIMO RIBASSO	EDILSIFRA E C SAS VIA TRIESTE 3, PEDAVENA (BL) 00817150253	L. 161.000.000	L. 93.803.200	41,74
Totali		L. 255.695.400	L. 123.957.520	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 16/11/99	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
Automatico	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 21/07/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 01/08/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/12/00	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	
DM 14/02/01	L. 330.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 150.000.000	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (22/03/01)
Opere Civili	140.500.000	146.467.439
Opere Impiantistiche	75.000.000	74.088.083
Arredi e/o Attrezzature		40.293.654
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	215.500.000	260.849.176
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	9.000.000	25.000.000
Altre Spese Tecniche	13.000.000	
Allacciamenti		
Imprevisti	15.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci	43.000.000	440.000
IVA al 10%	34.500.000	11.228.920
IVA al 20%		32.352.549
SOMME A DISPOSIZIONE	114.500.000	69.021.469
TOTALE COSTO	330.000.000	329.870.645
	Economie	-129.355
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	180.000.000	179.870.645
Risorse proprie	150.000.000	150.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	330.000.000	329.870.645

Protocollo d'intervento: **4275****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *RESTAURO CONSERVATIVO DELL'INTERNO DELLA CHIESA DEL SS. REDENTORE*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 2.135 milioni**- Tot. Impegnato **L. 2.135.063.209**- Tot. Pagato **L. 2.135.063.209**Cofinanziamento **L. 450 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *20/07/98* **20/07/98**Fine Lavori *20/10/99* **09/11/99***Chiesa del SS. Redentore***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA DEL SS. REDENTORE**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **94011810275**Indirizzo **GIUDECCA, 195****VENEZIA (VE)**Recapiti Telefono: **041 5231415** Telefax: **041 5212773****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	ATI ERRICO - CATTELLAN - SALMISTRARI S.POLO 3005, VENEZIA 02043620273	L. 1.863.700.000	L. 1.745.249.498	6,36
Totali		L. 1.863.700.000	L. 1.745.249.498	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 06/08/98	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 20/11/98	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 27/01/99	L. 2.697.000.000	L. 2.247.000.000	L. 350.000.000	L. 100.000.000	
DM 09/02/99	L. 2.283.758.099	L. 1.833.758.099	L. 0	L. 450.000.000	- Lit. -413241901
DM 01/06/99	L. 2.283.758.099	L. 1.833.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 05/08/99	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	+ Lit. 303000000
DM 13/09/99	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 16/11/99	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
Automatico	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 21/07/00	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 01/08/00	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 14/12/00	L. 2.586.758.099	L. 2.136.758.099	L. 0	L. 450.000.000	
DM 14/02/01	L. 2.585.063.209	L. 2.135.063.209	L. 0	L. 450.000.000	- Lit. -1694890

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (28/06/00)
Opere Civili	1.863.000.000	1.932.369.341
Opere Impiantistiche		
Arredi e/o Attrezzature		
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	1.863.000.000	1.932.369.341
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	110.000.000	
Altre Spese Tecniche	127.000.000	266.220.000
Allacciamenti		
Imprevisti	187.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%		
IVA al 20%	410.000.000	386.473.868
SOMME A DISPOSIZIONE	834.000.000	652.693.868
TOTALE COSTO	2.697.000.000	2.585.063.209
	Economie	-111.936.791
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	1.833.759.000	2.135.063.209
Risorse proprie	450.000.000	450.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	2.283.759.000	2.585.063.209

Protocollo d'intervento: **4334****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**

Titolo Intervento	<i>ADEGUAMENTO DELLE DUE SALE CONFERENZE ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI</i>	
Comune	SANTA GIUSTINA (BL)	
Finanziamento	L. 180 milioni	
	- Tot. Impegnato	L. 179.935.160
	- Tot. Pagato	L. 179.935.160
Cofinanziamento	L. 50 milioni	
	Previsione	Effettiva
Inizio Lavori	30/07/99	30/07/99
Fine Lavori	16/10/99	28/10/99

*Centro di spiritualità e cultura Papa Luciani***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	
Categoria	AE Società ad intero o prevalente capitale pubblico;	
C.Fis./P.IVA		
Indirizzo	VIA SARTENA ALTA 1	S. GIUSTINA (BL)
Recapiti	Telefono: 0437/858324	Telefax: 0437/8584324

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	%
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			Ribasso
MASSIMO RIBASSO	DEOLA SILVANO VIA TISOI 118, BELLUNO DLESVN53D17A757S	L. 38.000.000	L. 37.800.000	0,53
MASSIMO RIBASSO	PIAIA DENIS VIA ROREI 127, SOSPIROLO (BL) 00825820251	L. 59.000.000	L. 47.500.000	19,49
MASSIMO RIBASSO	EDIL SI.FRA E C. S.A.S. VIA TRIESTE 3, PEDAVENA (BL) 00817150253	L. 161.000.000	L. 82.196.800	48,95
Totali		L. 258.000.000	L. 167.496.800	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO


D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 13/09/99	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 16/11/99	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
Automatico	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 21/07/00	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 01/08/00	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/12/00	L. 230.000.000	L. 180.000.000	L. 0	L. 50.000.000	
DM 14/02/01	L. 229.935.160	L. 179.935.160	L. 0	L. 50.000.000	- Lit. -64840

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 50 % (29/11/99)
Opere Civili	82.196.800	82.196.800
Opere Impiantistiche	85.300.000	85.300.000
Arredi e/o Attrezzature	16.707.900	16.707.900
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	184.204.700	184.204.700
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	20.808.000	18.300.000
Altre Spese Tecniche	4.896.000	
Allacciamenti		2.700.000
Imprevisti		366.000
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	16.749.680	16.749.680
IVA al 20%	3.341.620	7.614.780
SOMME A DISPOSIZIONE	45.795.300	45.730.460
TOTALE COSTO	230.000.000	229.935.160
	Economie	-64.840
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	180.000.000	179.935.160
Risorse proprie	50.000.000	50.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	230.000.000	229.935.160

Protocollo d'intervento: **4530****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**

Titolo Intervento **RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI**
Comune **PADOVA (PD)**
Finanziamento **L. 48 milioni**
- Tot. Impegnato **L. 59.000.000**
- Tot. Pagato **L. 59.000.000**
Cofinanziamento **L. 0 milioni**

*Cripta medioevale***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**

Denominazione **MONASTERO SANTA GIUSTINA**
Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**
C.Fis./P.IVA **00679900285**
Indirizzo **VIA G. FERRARI, 2/A** **PADOVA (PD)**
Recapiti **Telefono: 049 8756435** **Telefax: 049 666002**

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

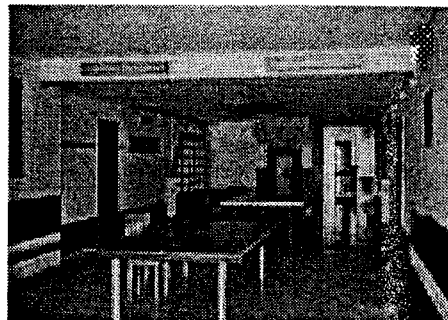
D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 06/08/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 20/11/98	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 27/01/99	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 09/02/99	L. 623.000.000	L. 620.000.000	L. 0	L. 3.000.000	
DM 01/06/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	- Lit. -564000000
DM 05/08/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 13/09/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 16/11/99	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
Automatico	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 21/07/00	L. 59.000.000	L. 59.000.000	L. 0	L. 0	
DM 01/08/00	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	- Lit. -11239520
DM 14/12/00	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	
DM 14/02/01	L. 47.760.480	L. 47.760.480	L. 0	L. 0	

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione del 10 % (21/09/98)
Opere Civili	325.000.000	325.000.000
Opere Impiantistiche	100.000.000	100.000.000
Arredi e/o Attrezzature	25.000.000	25.000.000
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	450.000.000	450.000.000
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	45.148.000	45.150.000
Altre Spese Tecniche	37.490.880	37.490.000
Allacciamenti		22.500.000
Imprevisti	22.500.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili	1.308.960	
- Opere Impiantistiche	329.809	
- Arredi e/o attrezzature	14.000	
- Altre voci		1.650.000
IVA al 10%	44.100.000	44.100.000
IVA al 20%	22.108.309	22.110.000
SOMME A DISPOSIZIONE	172.999.958	173.000.000
TOTALE COSTO	622.999.958	623.000.000
	Maggiore Spesa	42
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	620.000.000	620.000.000
Risorse proprie	3.000.000	3.000.000
Altre fonti finanziarie		
TOTALE COPERTURE	623.000.000	623.000.000

Protocollo d'intervento: **4949****DATI IDENTIFICATIVI DELL' INTERVENTO**Titolo Intervento *ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI*Comune **VENEZIA (VE)**Finanziamento **L. 206 milioni**- Tot. Impegnato **L. 205.988.850**- Tot. Pagato **L. 205.988.490**Cofinanziamento **L. 30 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *16/06/99* **15/06/99**Fine Lavori *25/10/99* **15/12/99***Parrocchia di S. Cristoforo***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **PARROCCHIA S. CRISTOFORO**Categoria **AC Enti religiosi - (art.1 l, legge 20 maggio 1985, n.222);**C.Fis./P.IVA **940109402271**Indirizzo **CANNAREGIO, 3512****VENEZIA (VE)**Recapiti **Telefono: 041 719933****Telefax: 041 719933****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
TRATTATIVA PRIVATA	CANATO GIOVANNI S. MARCO 3890, VENEZIA	L. 178.000.000	L. 178.000.000	0,00
Totali		L. 178.000.000	L. 178.000.000	

RIEPILOGO VARIAZIONI DI COSTO E DI FINANZIAMENTO

D.M.	Costo Stimato	Finan. Attribuito	Altre Risorse	Risorse Proprie	Note
DM 21/04/98	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 06/08/98	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 20/11/98	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 27/01/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 09/02/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 01/06/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 05/08/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 13/09/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 16/11/99	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
Automatico	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 21/07/00	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 01/08/00	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 14/12/00	L. 236.000.000	L. 206.000.000	L. 30.000.000	L. 0	
DM 14/02/01	L. 235.988.850	L. 205.988.850	L. 30.000.000	L. 0	Lit. -11150

CONFRONTO TRA Q.T.E. DI PROGETTO E Q.T.E. FINALE

A) LAVORI	Importo di Progetto (Lire)	QTE per liquidazione della rata di saldo (12/09/00)
Opere Civili	48.000.000	
Opere Impiantistiche	115.000.000	
Arredi e/o Attrezzature	15.000.000	
Altre Voci		
TOTALE LAVORI	178.000.000	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Progettazione	24.000.000	
Altre Spese Tecniche		
Allacciamenti		
Imprevisti	10.000.000	
- Espropri o Acquisizioni		
- Area o Fabbricato		
- Opere Civili		
- Opere Impiantistiche		
- Arredi e/o attrezzature		
- Altre voci		
IVA al 10%	19.000.000	
IVA al 20%	5.000.000	
SOMME A DISPOSIZIONE	58.000.000	0
TOTALE COSTO	236.000.000	235.988.490
	Economie	-11.510
COPERTURA FINANZIARIA	di progetto (Lire)	finale (Lire)
Finanziamento ex 270/97	206.000.000	205.988.490
Risorse proprie		
Altre fonti finanziarie	30.000.000	30.000.000
TOTALE COPERTURE	236.000.000	235.988.490

Protocollo d'intervento: **5497****DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERVENTO**Titolo Intervento *RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO DI S. CATERINA*Comune **PADOVA (PD)**Finanziamento **L. 1.912 milioni**- Tot. Impegnato **L. 1.912.325.212**- Tot. Pagato **L. 1.721.092.691**Cofinanziamento **L. 1.750 milioni**

Previsione Effettiva

Inizio Lavori *01/10/98* **01/10/98**Fine Lavori *30/09/99**Ex convento di S. Caterina***DATI RELATIVI AL TITOLARE DELL'INTERVENTO**Denominazione **IRPEA IST.RIUN. PADOVANI DI EDUCAZIONE**Categoria **AB Enti pubblici**C.Fis./P.IVA **01993240280**Indirizzo **VIA BEATO PELLEGRINO, 155****PADOVA (PD)**Recapiti **Telefono: 049 8720070****Telefax: 049 8724035****DATI RELATIVI ALL'APPALTO**

Procedura	Denominazione Ditta Aggiudicatrice	Importo a base di Gara	Importo Aggiudicazione	% Ribasso
Affidamento	Indirizzo Cod. Fisc./P.IVA			
LICITAZIONE PRIVATA	IMPRESA EDILE SVEC SPA VIA CERATO 14, PADOVA 00205950280	L. 2.788.675.000	L. 2.497.986.527	10,42
Totali		L. 2.788.675.000	L. 2.497.986.527	
