



ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI

ANNO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Trasferimenti dallo Stato	1.715.700.000	1.242.600.000	2.000.000.000	2.796.208.474	2.828.719.546	2.963.581.000	2.650.000.000
Trasferimenti dalla Regione	0	0	0	0	0	0	0
Trasferimenti da altri Enti	0	0	0	0	0	0	0
Totale Trasferimenti	1.715.700.000	1.242.600.000	2.000.000.000	2.796.208.474	2.828.719.546	2.963.581.000	2.650.000.000

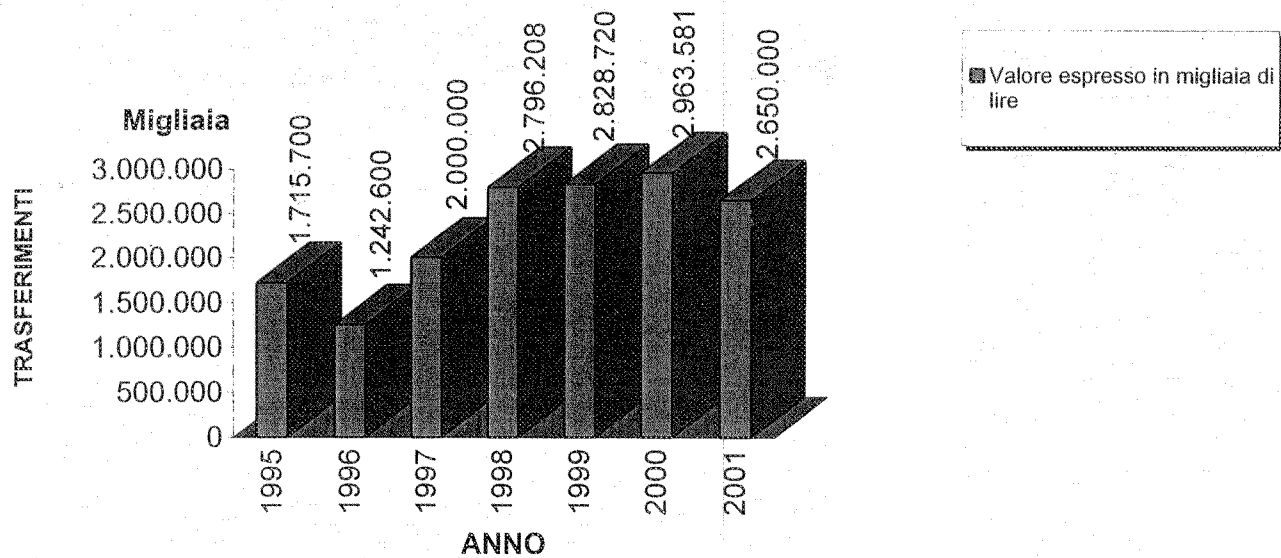


ANDAMENTO DEI TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE

ANNO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
TRASFERIMENTI DALLO STATO PTAP-CIPE Fossili-free- P.S.T.A - L. 388/2001	0	2.185.300.000	2.076.035.000	5.854.000.000	0	2.123.713.446	2.712.000.000
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE Recupero fornaci val Canzoi- Piano riordino forestale Punto informazioni Seravella - Chiesetta di Agre	0	0	0	100.000.000	100.000.000	78.995.000	0
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI contributo acquisto veicolo elettrico	0	0	0	0	608.800.000	80.000.000	23.872.500
TOTALE TRASFERIMENTI	0	2.185.300.000	2.076.035.000	5.954.000.000	708.800.000	2.282.708.446	2.735.872.500

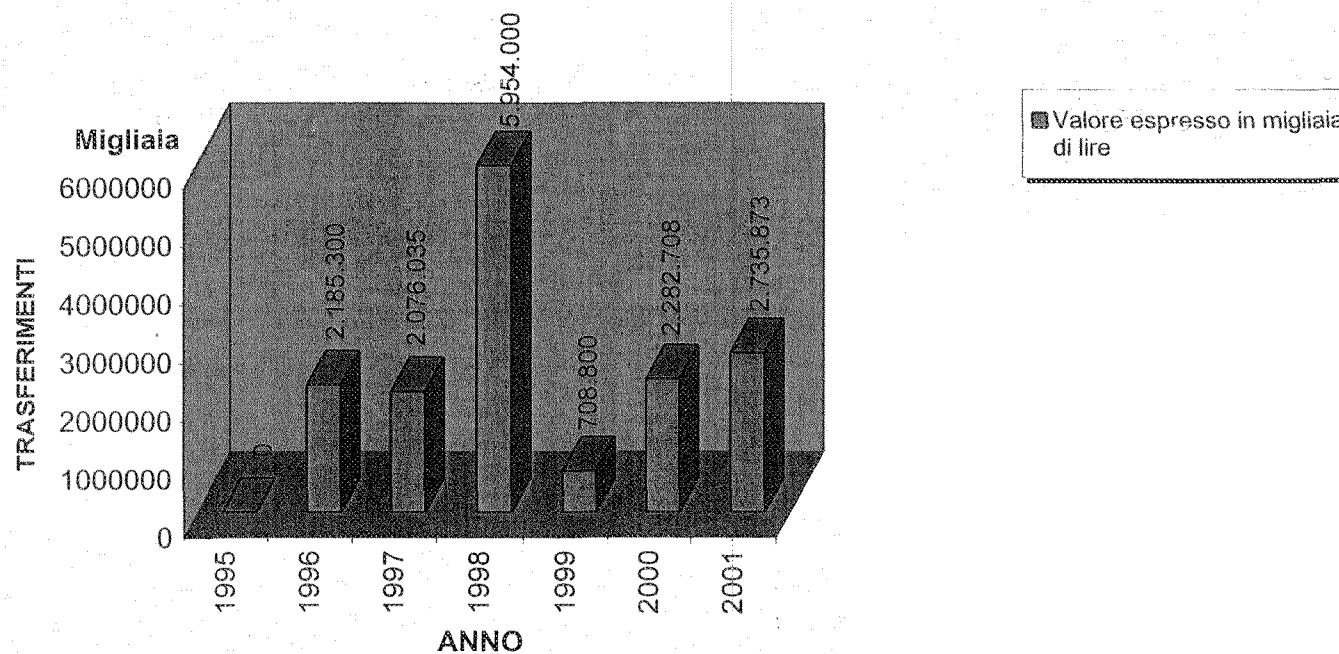


SPESA CORRENTE- Capacità di Impegno

ANNO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Previsioni Definitive di Bilancio (c)	2.483.700.000	2.505.000.000	2.274.400.000	2.746.208.474	2.400.000.000	2.800.000.000	3.014.491.894
Somme Impegnate	760.036.036	1.927.087.335	1.654.113.474	2.279.123.277	2.018.158.992	2.579.847.816	2.946.860.369
Pagamenti Complessivi (c+r)	584.058.667	1.310.083.184	1.632.042.474	2.239.317.209	2.136.815.148	2.039.563.706	2.258.349.881
Capacità di Impegno somme impegnate previsioni definitive di bilancio	30,61%	76,93%	72,73%	83,00%	84,09%	92,14%	97,75%

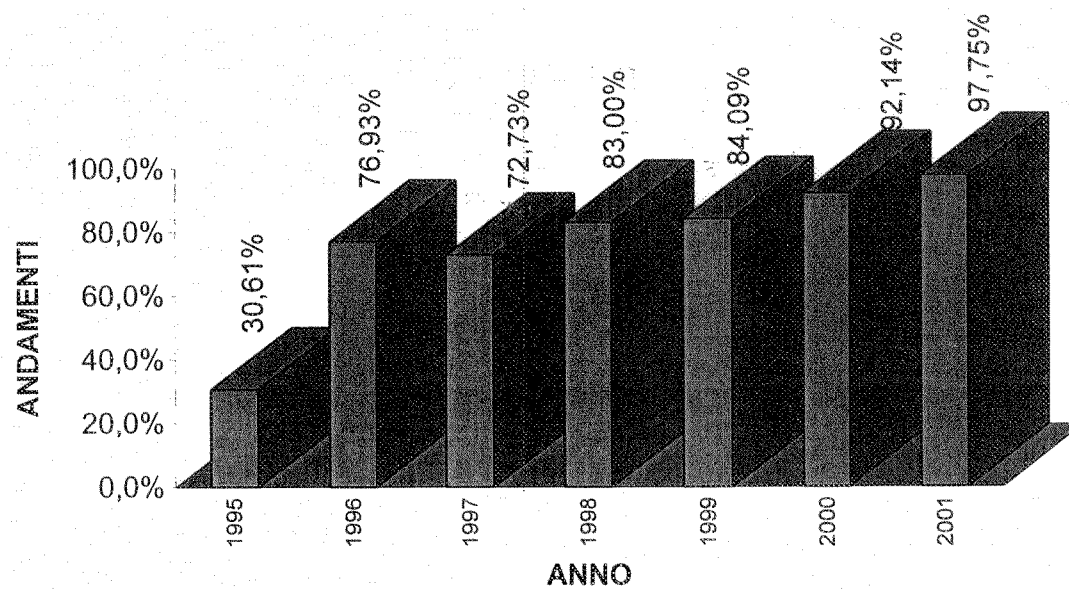


SPESA IN C/CAPITALE- Pagamenti

ANNO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Previsioni Definitive di Bilancio (c)	5.796.000.000	8.936.200.000	9.002.679.000	8.310.000.000	3.642.307.000	4.467.256.862	3.167.752.700
Somme Impegnate	486.820.910	4.303.601.998	3.458.609.154	8.113.764.757	2.432.412.480	4.277.149.302	3.161.748.070
Pagamenti Complessivi (c+r)	128.822.109	698.638.967	1.302.877.602	1.429.250.821	4.699.498.704	3.774.707.070	4.563.949.847
Capacità di impegno somme impegnate previsioni definitive di bilancio	8,40%	48,16%	38,42%	97,64%	66,79%	95,75%	99,81%

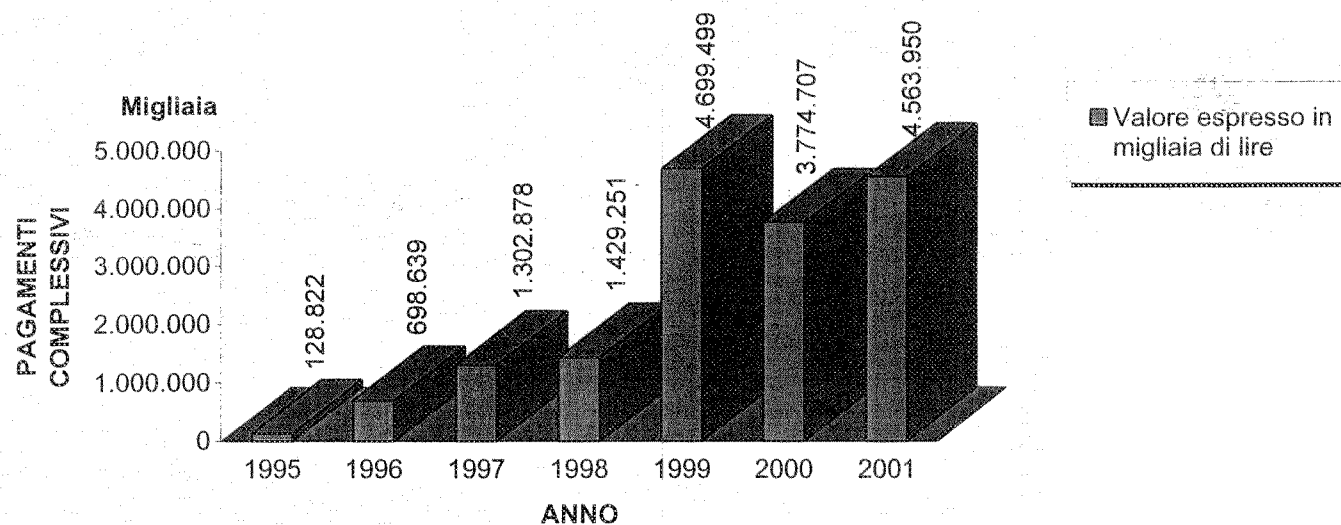


ANDAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	7.920.000.000	5.150.000.000	2.256.000.000	2.434.787.454	1.948.962.416	701.369.394	1.008.953.486

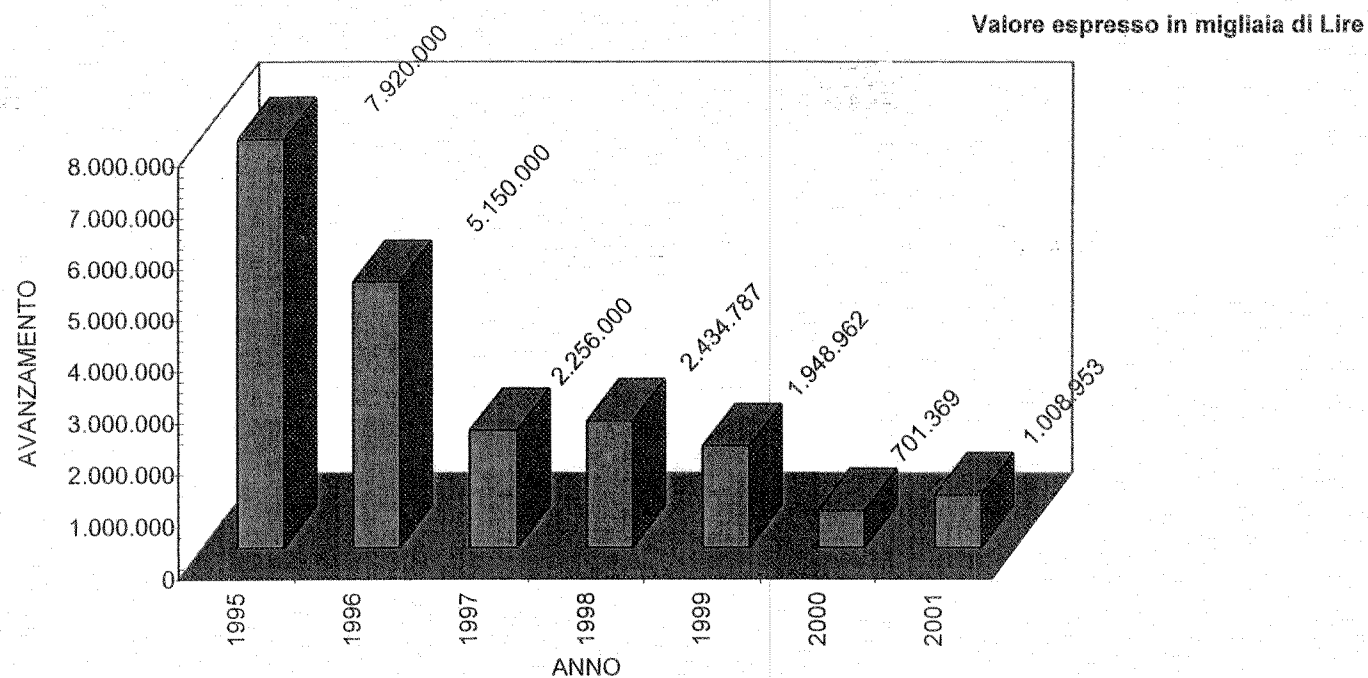

ANDAMENTO DEL FONDO DI CASSA

ANNO	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	8.913.481.265	8.294.924.831	5.335.363.934	10.728.952.572	3.899.840.149	5.765.218.029	7.467.792.958

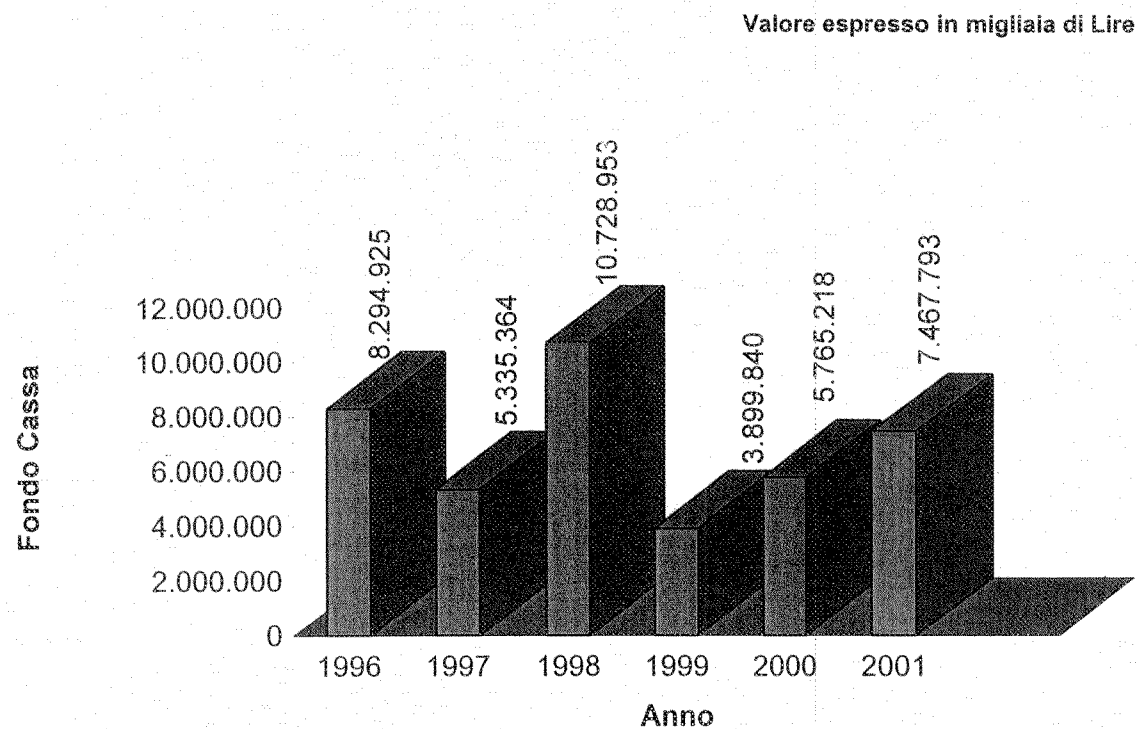

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL 31 DICEMBRE 2001

LEADER II ED INTERREG II

Programma Leader II - Ente Parco Promotore

Programma Leader II - Ente Parco Promotore				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI							
				attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	per autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001
GAL 2 - 3.6 Progetto Sentiero - Sistema Parco Ente Parco	L. 500.000.000	L. 304.150.000	L. 195.850.000							L.	0%	L. 119.200.800	24%	L. 85.869.754	43%	L. 251.223.760	100%	
GAL 2 - 5.9 Pacchetti turistici integrati (Stand) Ente Parco	L. 47.769.510	L. 31.500.000	L. 16.269.510							L.	0%	L. 16.524.370	38%	L. 29.245.240	100%	L.	100%	
GAL 2 - 4.6 Quattro Dolomiti (Marchio) Ente Parco	L. 200.000.000	L. 120.000.000	L. 80.000.000							L.	0%	L.	0%	L.	0%	L. 199.034.920	100%	
GAL 2 - 5.1 Edifica storica rurale Ente Parco	L. 86.690.800	L. 52.666.667	L. 34.024.133							L.	0%	L. 64.284.000	74%	L. 22.405.800	100%	L.	100%	
GAL 2 - 5.3 Riquadratura ambientale anelli ripariati Ente Parco	L. 143.750.000	L. 115.000.000	L. 28.750.000							L.	0%	L.	0%	L. 11.002.180	8%	L. 127.610.790	100%	
GAL 2 - 6.4 Percorsi culturali tematici (Mercato) Ente Parco	L. 20.000.000	L. 14.000.000	L. 6.000.000							L.	0%	L.	0%	L.	0%	L. 19.997.120	100%	
GAL 2 - 6.5 Antropizzazione e territorio (Biodiversità) Ente Parco	L. 70.000.000	L. 49.000.000	L. 21.000.000							L.	0%	L.	0%	L. 53.618.000	91%	L. 6.648.500	100%	
	L. 1.063.210.410	L. 686.316.667	L. 331.593.743							L.	0%	L. 202.103.170	19%	L. 222.141.574	40%	L. 604.515.090	96%	
Spese Sostenute Anno 1998											Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001			

■ Situazione Fine 2000

■ Aggiornamento 2001

■ Previsione Fine 2002

TUTTI GLI INTERVENTI SONO CONCLUSI

LE ECONOMIE RISULTANTI COMPORTERANNO UNA RIDUZIONE DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO

Programma Leader II - Cofinanziati dall'Ente Parco

Programma Leader II - Cofinanziati dall'Ente Parco				STATO DI ATTUAZIONE						CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI										
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attuazione pratica	incasso progetto	approvazione prog.	per autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	
GAL 2 - 2.5 Corsi professionali (Ecoguide) Cooperativa ArtService	L. 110.000.000	L. 105.000.000	L. 5.000.000									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. 5.000.000	100%
GAL 2 - 2.7 Marketing e Ambiente Cooperativa ArtService	L. -	L. -	L. -									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. -	0%
GAL 2 - 3.2 Strutture ricettive eco-compatibili (Cassara Eri) San Gregorio (Pedavena)	L. 300.000.000	L. 288.100.000	L. 11.900.000									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. 11.900.000	100%
GAL 2 - 3.7 Area di sosta attrezzata Comunità Montana Valsbelluna	L. 143.400.000	L. 122.400.000	L. 21.000.000									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. 21.000.000	100%
GAL 2 - 4.3 SinoEco - energie alternative Pedavena	L. 100.000.000	L. 90.000.000	L. 10.000.000									L.	-	0%	L. 10.000.000	100%	L.	100%	L. -	100%
GAL 2 - 5.1 E' il più grande parco Comunità Montana Feltrina	L. 80.000.000	L. 66.400.000	L. 13.600.000									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. 13.600.000	100%
GAL 2 - 5.2 Prevenzione incendi boschivi Comunità Montana Feltrina	L. 110.000.000	L. 99.000.000	L. 11.000.000									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. 11.000.000	100%
GAL 1 - 3.6 La Via del Forno Comunità Montana Longaronese - Zoldano	L. 100.000.000	L. 85.000.000	L. 15.000.000									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. 15.000.000	100%
GAL 1 - 5.6 Ecocombinazione prodotti legnosi Comunità Montana Longaronese - Zoldano	L. 160.000.000	L. 145.000.000	L. 15.000.000									L.	-	0%	L.	0%	L.	0%	L. 15.000.000	100%
	L. 1.103.400.000	L. 1.000.500.000	L. 102.500.000									L.	-	0%	L. 10.000.000	10%	L.	10%	L. 92.500.000	100%
Totale interventi												Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		

■ Situazione Fine 2000

■ Aggiornamento 2001

■ Previsione Fine 2002

Programma Interreg II - Cofinanziati dall'Ente Parco

Programma Interreg II - Cofinanziati dall'Ente Parco				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE		
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attuazione pratica	incasso progetto	approvazione progetto	per autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	SPESA PREVISTE ANNO 2002	S.A.L. %
VALORIZZAZIONE RISORSE TURISTICHE Comunità Montana Val Belluna	L. 430.000.000	L. 306.053.333	L. 123.946.667									L. -	0%	L. 25.000.000	20%	L. -	20%	L. 89.052.000	92%	L. 9.894.667	100%
PASSERELLI « LA MUDDA » - VAL CORCEVOLE Comunità Montana Val Belluna	L. 900.000.000	L. 800.000.000	L. 100.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 90.000.000	90%	L. 10.000.000	100%
PROGETTO PTN GAL IT-VE 02	L. 610.000.000	L. 560.000.000	L. 50.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 50.000.000	100%
	L. 1.940.000.000	L. 1.666.053.333	L. 273.946.667									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 179.052.000	65%	L. 69.894.667	91%
												Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		PREVISIONE FINE 2002	

Situazione Fine 2000

Aggiornamento 2001

Previsione Fine 2002

 Situazione Fine 2000
 Aggiornamento 2001
 Previsione Fine 2002

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI AL 31 DICEMBRE 2001

INTERVENTI DELL'ENTE PARCO

Programma Natour - Deliberazione CIPE 18.12.1996

Programma Natour - Deliberazione CIPE 18.12.1996				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE	
				attuazione pratica	realizzo progetto	realizzazione dei lavori	approvazione progetto	avanzamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	SPESA PREVISTE ANNO 2002
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	FINANZIAMENTO NATOUR - CIPE	FINANZIAMENTO ENTE PARCO																	
CHIESETTA DI SANTA MARIA MADDALENA DI OGRE Salice	L. 355.511.950	L. 355.511.950	L. -								L. 26.874.010	8%	L. 131.005.000	39%	L. 128.017.480	74%	L. 84.831.444	95%	L. 6.784.016	100%
MALGA CASERE DEI POSCHI Pedersina	L. 931.033.693	L. 931.033.693	L. -								L. 22.525.593	2%	L. 407.850.340	46%	L. 206.965.060	68%	L. 171.850.800	81%	L. 122.042.110	100%
POLO VENDITA COL DE' MICH Sovramonte	L. 650.000.000	L. 650.000.000	L. -								L. 50.570.587	8%	L. 373.477.830	65%	L. 76.889.290	77%	L. -	77%	L. 149.062.493	100%
MALGA PRAMPER - Ristrutturazione Forno di Zoldo	L. 806.158.020	L. 791.000.000	L. 15.158.020								L. 51.978.035	6%	L. 434.194.590	60%	L. 214.628.784	87%	L. 95.116.278	91%	L. 10.340.335	100%
MALGA PRAMPER - Fil. dislocazione Forno di Zoldo	L. 36.000.000	L. 36.000.000	L. -								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 36.000.000	100%
MALGA PRAMPER - Ampliamento Pesciol Forno di Zoldo	L. 33.000.000	L. 33.000.000	L. -								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 33.000.000	100%
MUSEO LA VALLE - Ristrutturazione La Valle Agordina	L. 492.131.720	L. 492.131.720	L. -								L. -	0%	L. 35.483.020	7%	L. 220.665.380	52%	L. 235.983.320	100%	L. -	100%
MUSEO LA VALLE - Allestimenti La Valle Agordina	L. 7.868.280	L. 7.868.280	L. -								L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 7.868.280	100%
VASCA ANTINCENDIO CASERA ERE San Gregorio nelle Alpi	L. 91.682.060	L. 90.000.000	L. 1.682.060								L. -	0%	L. 90.000.000	98%	L. 1.682.060	100%	L. -	100%	L. -	100%
MALGA MONSAMPUR Sovramonte	L. 450.000.000	L. 450.000.000	L. -								L. -	0%	L. 230.387.180	51%	L. 218.405.820	96%	L. 1.207.200	100%	L. -	100%
PENICOLA BRENDOL Cesiomaggiore	L. 90.000.000	L. 90.000.000	L. -								L. -	0%	L. 48.740.750	52%	L. 6.596.570	59%	L. 24.937.490	77%	L. 11.725.190	100%
SENTIERO SAN MAURO-MONTE GRAVE Feltre-Cesiomaggiore	L. 150.000.000	L. 150.000.000	L. -								L. -	0%	L. 80.838.480	54%	L. 69.161.520	100%	L. -	100%	L. -	100%
SENTIERO FORCELLA FRANCHE VAL INFERIOR Riamonte Agordino	L. 94.974.300	L. 94.874.300	L. -								L. -	0%	L. 56.684.340	60%	L. 38.289.960	100%	L. -	100%	L. -	100%
SENTIERO VALLE DI SAN MARTINO Feltre	L. 85.822.010	L. 85.822.010	L. -								L. 7.039.660	8%	L. 78.782.050	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%
SENTIERO LA VIA DEGLI OSPIZI, Sediolo-Sospitello-Riamonte	L. 98.982.228	L. 98.982.228	L. -								L. 7.185.788	7%	L. 1.798.440	9%	L. 90.090.000	100%	L. -	100%	L. -	100%
SENTIERO COL DEI CAVI Sovramonte	L. 19.273.050	L. 18.243.850	L. 3.029.400								L. 3.029.400	16%	L. 16.243.650	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%
	L. 4.392.437.311	L. 4.372.567.331	L. 19.869.430								L. 169.103.363	4%	L. 1.963.483.470	49%	L. 1.269.301.724	77%	L. 613.726.330	91%	L. 376.822.424	100%
Totale interventi	Finanziamento: CIPE	Finanziamento: ProQR									Spese Sostenute Anno 1996		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		PREVISIONE FINE 2002	

FINANZIAMENTO CIPE	L. 4.399.000.000		
IMPORTI PREVISTI	L. 4.372.567.331		
SCHEMI NON EROGABILI	L. 12.454.357	attualmente accertate	
ECONOMIE	L. 12.977.812	attualmente non qualificabili	

	Situazione Fine 2000
	Aggiornamento 2001
	Previsione Fine 2002

1° Piano Triennale Aree Protette 91-93

1° Piano Triennale Aree Protette 91-93				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE		
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	FINANZIAMENTO 1° PTAP 91-93	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attivazione pratica	incasso progetto	per autorizzazioni	approvazione prog.	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESE SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	SPESE PREVISTE ANNO 2002	S.A.L. %
CENTRO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE - Ripulitura e Rivestimento Agordino	L. 894.899.037	L. 894.899.037	L. -									L. 49.956.987	5%	L. 676.402.780	81%	L. -	81%	L. 168.538.275	100%	L. -	100%
CENTRO ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE - Sistemi Esterni Rivestimento Agordino	L. 164.172.125	L. 107.025.241	L. 57.146.884	CONTRIBUTO							L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 115.721.000	70%	L. -	70%	
CONCIMAIA DI MALGA ERERA Casomaggiore	L. 55.499.995	L. 55.499.995	L. -									L. 34.436.115	62%	L. 21.063.880	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%
PISTA ACCESSO ERERA-CAMPOTORONDO Casomaggiore	L. 114.000.000	L. 114.000.000	L. -									L. 78.326.536	69%	L. 35.673.464	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%
PISTA ACCESSO MALGA LE VETTE Sovramonte	L. 66.500.000	L. 66.500.000	L. -									L. 41.327.430	62%	L. 25.172.570	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%
ITINERARIO TURISTICO IN VAL DI CANZO Casomaggiore	L. 106.494.332	L. 106.494.332	L. -									L. 68.018.904	64%	L. 21.384.110	84%	L. 17.891.318	100%	L. -	100%	L. -	100%
MANTENZIONE SUPERFICI BOSCHIVE Casomaggiore	L. 127.255.500	L. 127.255.500	L. -									L. 77.819.571	61%	L. 48.982.688	100%	L. 453.243	100%	L. -	100%	L. -	100%
MALGA ALVIS - VIABILITA' SERVIZIO Casomaggiore	L. 452.698.000	L. 445.450.000	L. 7.248.000									L. 274.294.136	61%	L. 150.380.204	94%	L. 663.020	94%	L. 1.113.620	94%	L. 26.247.020	98%
MATERIALE ANTINCENDIO Vari Comuni - Protezione Civile	L. 139.581.454	L. 139.581.454	L. -									L. 139.581.454	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%	L. -	100%
PENDASAR MALGA LE VETTE Sovramonte	L. 334.476.742	L. 128.594.441	L. 205.882.301									L. 310.869.873	93%	L. 18.705.430	99%	L. 4.501.438	100%	L. -	100%	L. -	100%
	L. 2.455.577.185	L. 2.135.300.000	L. 270.277.185									L. 1.074.620.986	44%	L. 997.765.134	84%	L. 23.109.020	85%	L. 285.373.896	97%	L. 26.247.020	98%
	Totale interventi	Finanziamento 1° PTAP	Finanziamento PNOB								Spese Sostenute Anno 1996	Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		PREVISIONE FINE 2002			

FINANZIAMENTO PTAP 91-93 L. 2.185.300.000
IMPORTI PREVISTI L. 2.155.300.000
ECONOMIE L. -
attualmente non quantificabili

□ Situazione Fine 2000
■ Aggiornamento 2001
■ Previsione Fine 2002

2° Piano Triennale Aree Protette 94-96

2° Piano Triennale Aree Protette 94-96				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE		
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	FINANZIAMENTO 2° PTAP 94-96	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attivazione pratica	incasso progetto	per autorizzazioni	approvazione prog.	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESE SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESE SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	SPESE PREVISTE ANNO 2002	S.A.L. %
RISTRUTTURAZIONE RIFUGIO DAL PIAZ Sovramonte	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. -									L. -	0%	L. 90.000.000	30%	L. 104.605.250	65%	L. 105.394.750	100%	L. -	100%
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI RIFUGI Vari Comuni	L. 180.000.000	L. 180.000.000	L. -	CONTRIBUTO							L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 187.748.560	93%	L. -	93%	
ARREDAMENTI E ALLESTIMENTI RIFUGI Vari Comuni	L. 75.000.000	L. 75.000.000	L. -									L. -	0%	L. 67.662.400	90%	L. -	90%	L. -	90%	L. 7.337.600	100%
ACQUISTO TERRENI - ULLS n. 2 di Feltre Casomaggiore	L. 593.060.000	L. -	L. 593.060.000									L. -	0%	L. -	0%	L. 593.060.000	100%	L. -	100%	L. -	100%
ACQUISTO TERRENI - Enel Produzione e Dalmazia Tronchi Sospirato	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 53.020.000	17%	L. 246.980.000	82%
VAL CORDEVOLE - AREA DI CAIADEN Sedico	L. 480.000.000	L. 480.000.000	L. -									L. -	0%	L. 4.773.600	1%	L. 14.320.800	4%	L. 38.796.400	8%	L. 422.119.200	89%
VAL CORDEVOLE - AREA DI SALET Sedico	L. 120.000.000	L. 120.000.000	L. -									L. -	0%	L. 4.773.600	4%	L. 14.320.800	16%	L. 4.773.600	21%	L. 36.000.000	30%
	L. 2.048.060.000	L. 1.455.000.000	L. 593.060.000									L. -	0%	L. 167.209.600	8%	L. 726.306.850	44%	L. 369.723.310	62%	L. 712.436.800	95%
	Totale interventi	Finanziamento 2° PTAP	Finanziamento PND8								Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		PREVISIONE FINE 2002		

FINANZIAMENTO PTAP 94-96 L. 1.455.000.000
IMPORTI PREVISTI L. 1.455.000.000
ECONOMIE L. -
attualmente non quantificabili

□ Situazione Fine 2000
■ Aggiornamento 2001
■ Previsione Fine 2002

Fossil Free - Ribassi d'asta Natour e Protocollo di Kyoto

Fossil Free - Ribassi d'asta Natour e Protocollo di Kyoto				STATO DI ATTUAZIONE							CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE	
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	NATOUR E KYOTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attuazione pratica	realizzo progetto	ter. autorizzazioni	approvazione progetto	inizio lavori	fine lavori	entrata pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	SPESA PREVISTE ANNO 2002	S.A.L. %
MALGA ERERA (Generatore-biossido) Cestomaggiore	L. 75.000.000	L. 75.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 75.000.000	100%
MALGA PRAMPER (piastrocogenerazione) Forma di Zaida	L. 88.845.574	L. 88.845.574	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 88.845.574	100%	L. -	100%
MALGA VETTE GRANDI (battene-biossido-solare) Sovramonte	L. 20.000.000	L. 20.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 20.000.000	100%
MALGA ALVIS (impianto fotovoltaico) Sovramonte	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
MALGA BRENDOL (impianto fotovoltaico) Cestomaggiore	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
MALGA LE PRESE (impianto fotovoltaico) Sovramonte	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
MALGA MONSAMPARI (impianto fotovoltaico) Sovramonte	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
CASERA LE MANDRE (impianto fotovoltaico) Rivamonte Agordino	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
MALGA VETTE PICCOLE (impianto fotovoltaico) Sovramonte	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
CASERA LA VARETTA (impianto fotovoltaico) Sedico	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
CASERA RUSIEDA ALTA (impianto fotovoltaico) Sospireto	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
MALGA CAMPIOTOKONDO (impianto fotovoltaico) Gosaldo	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
CASERA FAGAREI (impianto fotovoltaico) Sedico	L. 3.500.000	L. 3.500.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.500.000	100%
RIFUGIO C.A.I. PIAN DE FONTANA (C.A.I. biossido-solare) Longarone	L. 86.000.000	L. 86.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 86.774.000	80%	L. -	80%
RIFUGIO C.A.I. BIANCHET (C.A.I. biossido-solare) Sedico	L. 37.339.122	L. 37.339.122	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 37.339.122	100%	L. -	100%
RIFUGIO C.A.I. DAL PUZ (Generatore biossido) Sovramonte	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%
RIFUGIO C.A.I. BOZ (Generatore biossido) Cestomaggiore	L. 19.000.000	L. 19.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%
CENTRO VISITATORI IMPERINA (battene-biossido-solare) Rivamonte Agordino	L. 119.000.000	L. 119.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 68.845.000	58%
CASERE MALGA DEI BOSCHI (Cassa a biomassa) Pradava	L. 37.945.780	L. 37.945.780	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 37.945.780	100%	L. -	100%
FRASSEN (Cassa a biomassa) Cestomaggiore	L. 62.000.000	L. 62.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%
FORESTERIA AGRE (cassa a biomassa) Sedico	L. 70.000.000	L. 70.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%
AGRICOLTURA COL DE MICH (Sfale e segna) Sovramonte	L. 20.000.000	L. 20.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 20.000.000	100%
FRONTO VENDITA CANDATEN (battene fotovoltaico) Sedico	L. 46.000.000	L. 46.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%
ELETTRIFICAZIONE VALLE DEL MIS Sospireto	L. 500.000.000	L. 500.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 50.000.000	10%
SPESA TECNICHE ED IMPREVISTI	L. 52.000.000	L. 52.000.000	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. 11.232.000	22%	L. 23.814.210	46%	L. 16.953.790	100%
	L. 1.295.130.476	L. 1.298.130.476	L. -	-	-	-	-	-	-	-	L. -	0%	L. -	0%	L. 11.232.000	1%	L. 256.718.686	21%	L. 285.798.790	43%
	Totale interventi	Altre Finanziamento	Finanziamento PNDR								Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		PREVISIONE FINE 2002	

RIBASSI NATOUR L. 850.000.000
 RIBASSI KYOTO L. 500.000.000
 RIBASSI PREVISI L. 1.295.130.476
 ECONOMIE L. 61.865.524
 attualmente non quantificabili

Situazione Fine 2000
 Aggravamento 2001
 Previsione Fine 2002

Fondi Propri Ente Parco

Fondi Propri Ente Parco				STATO DI ATTUAZIONE						CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE			
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attuazione pratica	specifico progetto	tra autorizzazioni	approvazione prog.	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	SPESA PREVISTE ANNO 2002	S.A.L. %
CENTRO VISITATORI - Restaurazione Pedavenna	L. 348.264.394	L. -	L. 348.264.394									L. 196.872.144	56%	L. 123.172.870	92%	L. 28.419.380	100%	L. -	100%	L. -	100%
CENTRO VISITATORI - Abruzzese Pedavenna	L. 486.091.990	L. -	L. 486.091.990									-	0%	L. 30.000.000	0%	L. 383.952.300	89%	L. 52.139.690	100%	L. -	100%
CENTRO VISITATORI - Servizio e Alloggio interno Pedavenna	L. 38.828.250	L. -	L. 38.828.250									L. -	0%	L. -	0%	L. 38.828.250	100%	L. -	100%	L. -	100%
CENTRO VISITATORI - Ristoro Fagiolato Principale Pedavenna	L. 110.000.000	L. 80.000.000	L. 30.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 102.846.080	93%	L. 7.353.920	100%
CENTRO VISITATORI - Montecale Pedavenna	L. 10.497.600	L. -	L. 10.497.600									L. -	0%	L. -	0%	L. 8.049.600	77%	L. 2.448.000	100%	L. -	100%
VALLE DEL MIS 1° Strada Sospirolo	L. 387.583.763	L. -	L. 387.583.763									L. 114.972.905	30%	L. 91.484.670	53%	L. -	53%	L. -	53%	L. 181.126.188	100%
VALLE DEL MIS - Area Riceviva Val Evantoni Sospirolo	L. 102.237.552	L. -	L. 102.237.552									L. -	0%	L. 2.142.000	2%	L. 52.402.752	53%	L. 45.000.000	97%	L. 2.692.800	100%
VALLE DEL MIS - Parcheggio Pian Falcina Sospirolo	L. 160.050.000	L. -	L. 160.050.000									L. -	0%	L. 1.597.320	1%	L. 23.700.120	16%	L. 6.401.520	20%	L. 5.000.000	23%
ACQUEDOTTO LE VETTE - Opere idrauliche Sovramonte	L. 169.000.000	L. 35.929.365	L. 133.070.635									L. -	0%	L. -	0%	L. 27.273.180	20%	L. 56.634.760	50%	L. 49.192.725	100%
ACQUEDOTTO LE VETTE - Opere edili Sovramonte	L. 105.500.000	L. 50.800.160	L. 54.699.840									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 27.500.000	90%
CASERE ERERA E CAMPTORONDO Cesiomaggiore	L. 246.552.980	L. -	L. 246.552.980									L. -	0%	L. 228.144.900	93%	L. 17.408.080	100%	L. -	100%	L. -	100%
PUNTO INFORMAZIONI SERAVALLA Cesiomaggiore	L. 196.788.880	L. 54.000.000	L. 142.788.880									L. -	0%	L. 137.488.280	70%	L. 42.423.080	91%	L. 16.897.510	100%	L. -	100%
VAL DI CANZO Cesiomaggiore	L. 340.720.000	L. -	L. 340.720.000									L. 20.194.739	6%	L. -	6%	L. 2.460.000	7%	L. -	7%	L. -	7%
SENTIERO PIAN DE FONTANA-CAIADA Longarone	L. 100.000.000	L. -	L. 100.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 7.000.000	7%	L. -	7%
MANUTENZIONE IMPIANTI ENTE PARCO Feltre	L. 100.000.000	L. -	L. 100.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 77.202.500	77%	L. 22.797.410	100%
GIARDINO SEDE ENTE PARCO Feltre	L. 90.000.000	L. -	L. 90.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 27.000.000	30%
CASERA AL FRASSEN Cesiomaggiore	L. 300.000.000	L. -	L. 300.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 40.000.000	13%
RECUPERO EX OSPIZIO DI AGRI Comune di Sedico	L. 350.000.000	L. -	L. 350.000.000									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 35.000.000	10%
	L. 3.622.115.409	L. 220.529.525	L. 3.401.585.884									L. 331.839.788	9%	L. 615.010.040	26%	L. 624.916.732	43%	L. 366.370.140	54%	L. 397.633.043	64%
	Totale Interventi	Altro Finanziamento	Finanziamento PnDB									Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		PREVISIONE FINE 2002	

Situazione Fine 2000
 Aggiornamento 2001
 Previsione Fine 2002

Cofinanziati dall'Ente Parco e realizzati da altri soggetti

Cofinanziati dall'Ente Parco e realizzati da altri soggetti				STATO DI ATTUAZIONE						CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE	
				attuazione pratica	incasso progetto	approvazione progetto	per autorizzazioni	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %
PUNTO INFORMAZIONI A CELARDA Feltre	L. 12.500.000	L. -	L. 12.500.000																
COMPLETAMENTO ERERA E BRENCIOL Cesiomaggiore	L. 416.500.000	L. 175.786.554	L. 240.713.446																
MILGA LE PRESE Sovramonte	L. 250.000.000	L. 100.000.000	L. 150.000.000																
PIAZZALE CROCE D'ALINE Sovramonte	L. 329.850.000	L. 44.850.000	L. 285.000.000																
PARCHEGGIO CASERE DEI BOSCHI Pedavenna	L. 350.000.000	L. 100.000.000	L. 250.000.000																
PISTA SCI DA FONDO Pedavenna	L. 140.000.000	L. -	L. 140.000.000																
FABBRICATO "EX FORMI PIASORI" - VALLE IMPERINA Rivamonte Agordino	L. 1.351.455.000	L. 1.151.455.000	L. 200.000.000																
FABBRICATO "EX CRAL" - VALLE IMPERINA Rivamonte Agordino	L. 280.000.000	L. 181.170.000	L. 98.830.000																
	L. 3.130.305.000	L. 1.753.261.554	L. 1.377.043.446																
	Totale Interventi	Altro Finanziamento	Finanziamento PNDB																

Situazione Fine 2000
 Aggiornamento 2001
 Previsione Fine 2002

Allestimenti interni di alcune strutture ricettive del Parco

Allestimenti interni di alcune strutture ricettive del Parco				STATO DI ATTUAZIONE								CAPACITA' DI SPESA E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI								PREVISIONE			
DENOMINAZIONE INTERVENTO	COSTO TOTALE INTERVENTO	ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO	FINANZIAMENTO ENTE PARCO	attivazione pratica	incasso progetto	ter. autorizzazioni	approvazione prog.	affidamento lavori	inizio dei lavori	fine dei lavori	chiusura pratica	SPESA SOSTENUTE ANNI 96-97-98	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 1999	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2000	S.A.L. %	SPESA SOSTENUTE ANNO 2001	S.A.L. %	SPESA PREVISTE ANNO 2002	S.A.L. %		
SEDE ENTE PARCO - Spazio Informativo e Biblioteca Feltre	L. 119.276.000	L. 119.276.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 6.353.740	5%	L. 40.000.000	28%		
CENTRO VISITATORI PEDAVENNA - Allestimenti e insegna Pedavenna	L. 30.000.000	L. 30.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 25.200.000	84%	L. 4.800.000	16%		
PIUNTO VENDITA COL DEI NACH - Allestimenti e Ingresso Sovramonte	L. 300.000.000	L. 300.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 2.478.170	1%	L. 270.000.000	91%		
CENTRO VISITATORI VALLE IMPERINA - Allestimenti, Rivomonte Agordino	L. 425.000.000	L. 425.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 30.400.000	7%	L. 350.000.000	86%		
MALGA CASERE DEI BOSCHI - Antri interni Pedavenna	L. 250.000.000	L. 250.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 171.778.040	69%	L. 78.223.960	31%		
EX OSPIZIO DI AGRE - Antri interni Sedico	L. 157.000.000	L. 157.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 5.500.000	4%	L. 151.500.000	96%		
MALGA BRENDOL E CAMPOTORONDO - Antri interni Valt Comuni	L. 45.000.000	L. 45.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 2.448.000	5%	L. 42.552.000	95%		
EX CHIESETTA DI AGRE - Allestimenti Sedico	L. 50.724.000	L. 50.724.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 50.724.000	100%	L. -	100%		
AREA RICETTIVA DI CANDATEN - Allestimenti Sedico	L. 123.000.000	L. 123.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 3.986.000	3%	L. 75.000.000	61%		
	L. 1.500.000.000	L. 1.500.000.000	L. -									L. -	0%	L. -	0%	L. -	0%	L. 297.939.950	20%	L. 1.012.075.960	87%		
Totale interventi		Altri Finanziamenti	Finanziamenti PNGB									Spese Sostenute Anno 1998		Spese Sostenute Anno 1999		Spese Sostenute Anno 2000		Spese Sostenute Anno 2001		PREVISIONE FINE 2002			
FINANZIAMENTO MINISTERO L. 1.500.000.000								Situazione Fine 2000															
IMPOSTE PREVISTE L. 1.500.000.000								Aggiornamento 2001															
ECONOMIE L. -								Previsione Fine 2002															
aggiornamenti non qualificabili																							

 Situazione Fine 2000
 Aggiornamento 2001
 Previsione Fine 2002

PAGINA BIANCA
