

4. LA GESTIONE FINANZIARIA

Situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31 dicembre 2001

Le occorrenze finanziarie per la copertura degli oneri recati dalla legge 270/97, valutate in complessive £. 2.000 miliardi, sono state direttamente stanziare in Bilancio sul capitolo 7902 dello Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del successivo trasferimento ai singoli soggetti beneficiari.

Gli stanziamenti statali hanno consentito, attraverso la priorità accordata agli interventi che esprimevano una quota di cofinanziamento, la mobilitazione di ulteriori fonti finanziarie per £. 1.702 miliardi, permettendo l'inserimento nel Piano, ai fini della realizzazione, di opere per un importo complessivo pari a £. 3.566 miliardi.

Di tale stanziamento, £. 1.200 miliardi sono stati stanziati nell'esercizio finanziario 1998, 600 miliardi nell'esercizio finanziario 1999 e 200 miliardi sul bilancio annuale di competenza relativo all'anno 2000.

Come già ricordato, il Piano è stato soggetto ad alcune rimodulazioni a seguito delle quali sono state ridotte le assegnazioni finanziarie degli interventi attivati per un importo corrispondente al ribasso d'asta registrato all'atto dell'aggiudicazione. Con le somme rese così disponibili sono stati finanziati altri interventi originariamente non inclusi nel Piano. Sono stati inoltre inseriti nel Piano, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della legge n. 270/1997, gli interventi relativi alla costruzione e rimessa in pristino del Duomo e del Palazzo Reale di Torino, con le corrispondenti assegnazioni finanziarie.

La Commissione di cui al 1° comma dell'art. 2 della citata legge 270/97, ha, quindi, provveduto ad emanare gli indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano con modalità già definite per l'attuazione del Piano per il Giubileo ex lege n. 651/96 dalla competente Commissione.

I suddetti indirizzi disciplinano i pagamenti così suddivisi:

anticipazione del 10% per la progettazione, gli studi e le indagini;


anticipazione del 50% dell'ammontare dell'impegno;

anticipazione fino alla concorrenza del 90% dell'impegno;

saldo.

Inoltre, con DM dell'1.6.1999 la Commissione ha modificato ed integrato gli Indirizzi di attuazione finanziaria individuando e meglio specificando la documentazione da allegare alle istanze di erogazione finanziaria, con particolare riferimento alla erogazione fino alla concorrenza del 90% dell'importo impegnato ed alla liquidazione del saldo.

Al fine di poter evadere il gran numero di richieste di erogazione finanziaria pervenute e meglio rappresentate dal grafico di seguito riportato:

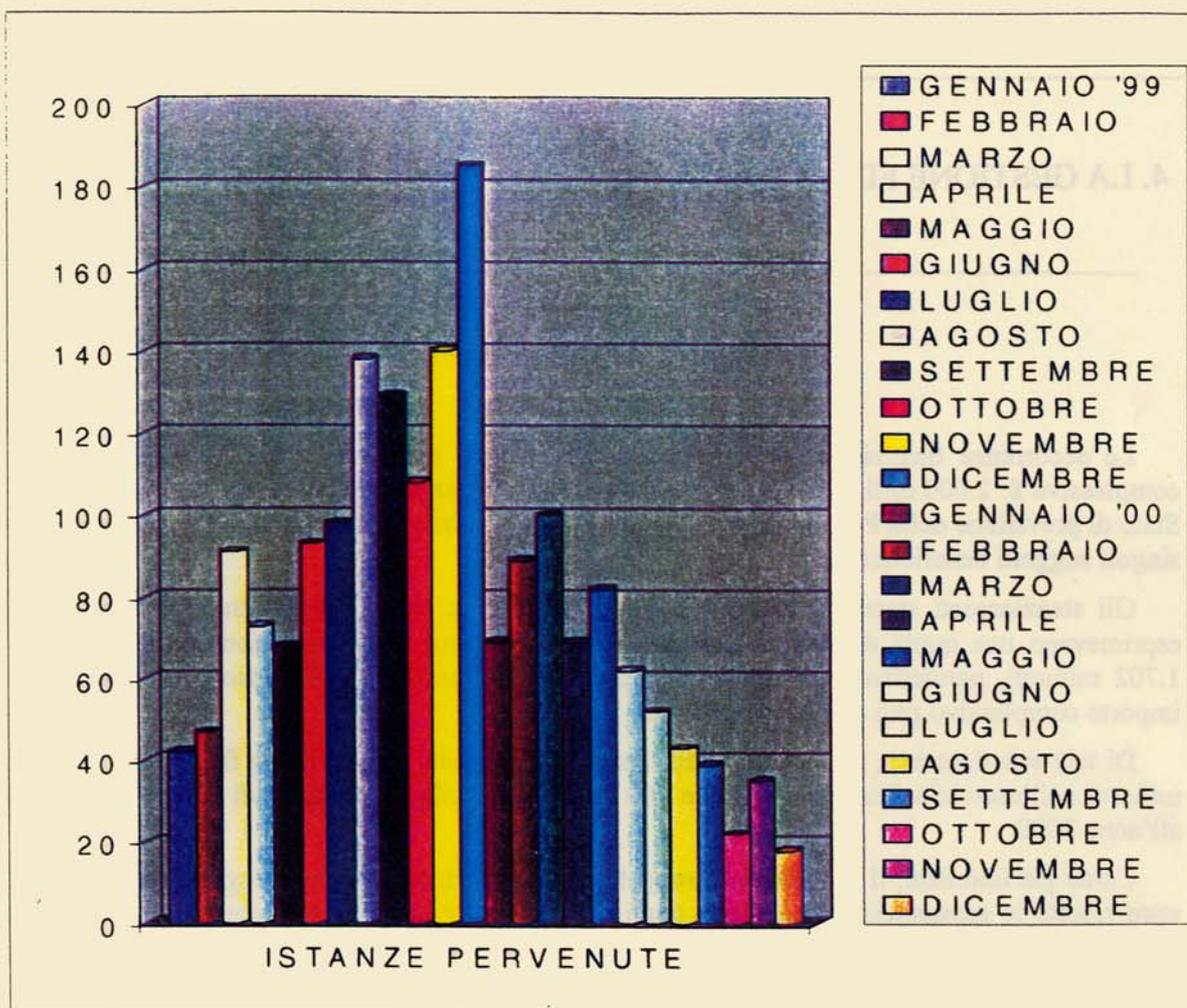

L'Ufficio ha istituito una procedura che prevede le seguenti principali fasi lavorative:

A) Esame preliminare delle istanze pervenute : una volta pervenute al Servizio Finanziario, dopo essere state protocollate, le richieste di erogazione vengono esaminate e classificate. Tale controllo tende soprattutto ad accertare la congruità degli importi richiesti in relazione ai dati economici del Piano evidenziando eventuali anomalie e provvedendo, ove necessario, a comunicare le stesse ai Soggetti beneficiari;

B) Inserimento delle istanze nella banca dati: una volta esaminate e classificate le istanze vengono registrate in una banca dati appositamente predisposta al fine di consentire il controllo delle pratiche lungo tutte le fasi di lavorazione. Dai tabulati infatti è possibile rilevare, tra l'altro, la data di arrivo dell'istanza, il nome del funzionario tecnico al quale è stato assegnato l'intervento, la relativa data di assegnazione e così via fino alla data di trasmissione del decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo sistema di analisi e successivo inserimento in banca dati ha permesso di:

- tenere sotto controllo mese per mese la totalità delle istanze pervenute;
- individuare al momento dell'arrivo eventuali anomalie, carenze e urgenze al fine di un tempestivo intervento;

- poter fornire notizie in tempo reale circa lo stato della pratica ai Soggetti beneficiari;
- ottimizzare i tempi di lavorazione.

C) Istruttoria tecnica amministrativa : l'Ufficio, nonostante le note carenze di organico, ha istituito un gruppo di lavoro costituito dai funzionari tecnici in servizio, che, pur mantenendo le funzioni di loro normale competenza, hanno esaminato le varie istanze e redatto le apposite istruttorie tecniche amministrative propedeutiche alla stesura dei decreti di pagamento.

Dette istruttorie consistono:

- 1) nell'esaminare le richieste di erogazione finanziaria unitamente alla congruità e completezza della documentazione prevista dagli indirizzi di attuazione finanziaria. Detto esame non può prescindere da un'analisi dell'intervento nel suo complesso che consideri tutte le eventuali varianti apportate assentite o assentibili dall'Ufficio e le rimodulazioni di Piano che lo riguardano;
- 2) nel comunicare ai soggetti beneficiari eventuali carenze ed anomalie e guidare gli stessi nella risoluzione di eventuali problematiche;
- 3) nel fornire tutti i dati necessari alla successiva fase di decretazione del pagamento.

D) Decretazione: redazione del decreto di impegno e/o pagamento in base alle istruttorie tecniche amministrative ed alla necessaria ricostruzione storica dell'intervento dall'inserimento nel Piano, individuando nel percorso eventuali peculiarità delle quali tener conto nella stesura del decreto. Compito dei funzionari amministrativi addetti a questa fase lavorativa è inoltre quello di interpretazione delle istruttorie e traduzione delle stesse in decreti redatti secondo la normativa di riferimento;

E) Registrazione degli impegni e delle erogazioni : una volta trasmesso il Decreto all'Ufficio Centrale di Bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i relativi importi vengono registrati in un apposito tabulato finanziario che consente di avere l'esatta situazione sia relativa ad ogni singolo intervento che nella sua globalità;

Ad appesantire e rallentare il lavoro dell'Ufficio hanno concorso vari fattori:

- 1) la difficile applicazione della normativa di attuazione finanziaria che, come già evidenziato, è stata più volte integrata e modificata;
- 2) la presenza di molti soggetti beneficiari privati o pubblici di piccole dimensioni, non abituati ad affrontare problematiche inerenti le procedure tecniche amministrative pubbliche (parrocchie, piccoli comuni ecc.). Questo ha comportato soprattutto una notevole difficoltà nel completare la documentazione necessaria che ha costretto i funzionari tecnici a contattare più volte ogni soggetto beneficiario sia telefonicamente che a mezzo fax e dare loro continue ed approfondite spiegazioni;
- 3) l'istituzione del mandato informatico che attualmente consente una maggiore velocità di erogazione dei pagamenti ma che nel corso dell'anno ha comportato un rallentamento dovuto ai normali tempi di perfezionamento della nuova procedura;
- 4) la concentrazione delle richieste di erogazione per tutto l'arco dell'anno da parte della totalità dei soggetti beneficiari;

Sono state inoltre trasferite, con variazioni compensative di bilancio, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge del 7 agosto 1997, n. 270, risorse finanziarie ammontanti a £. 209.702 miliardi nello Stato di previsione dei seguenti Ministeri:

Ministero per le Attività Culturali:	193.394.600.000
Ministero degli Interni:	12.770.000.000
Ministero delle Finanze:	1.100.000.000
Ministero dei Trasporti:	860.000.000
Ministero di Grazia e Giustizia:	1.577.000.000
TOTALE:	209.701.600.000

Vengono di seguito riportate le tabelle relative alla situazione finanziaria del Piano aggiornata al 31.03.1999, al 30.06.1999, al 30.09.1999, al 31.12.1999, al 31.03.2000 ed al 31.12.2001.

TAV. I (situazione finanziaria al 31 marzo 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	677.439.078.398
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	857.399.078.398
Pagamenti	362.190.046.665
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	168.290.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	542.150.049.665

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. II (situazione finanziaria al 30 giugno 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.079.380.955.691
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.281.977.955.691
Pagamenti	582.397.763.915
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	784.994.763.915

TAV. III (situazione finanziaria al 30 settembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.446.125.278.632
Pagamenti	734.533.939.986
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	188.967.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	937.770.939.986

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. IV (situazione finanziaria al 31 dicembre 1999) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.242.888.278.632
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.447.125.278.632
Pagamenti	1.021.868.392.042
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.226.105.392.042

TAV. V (situazione finanziaria al 31 marzo 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.539.484.392.199
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.743.721.392.199
Pagamenti	1.241.243.265.249
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	189.030.000.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	11.670.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.445.480.265.249

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. VI (situazione finanziaria al 30 giugno 2000)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.570.897.571.096
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.780.599.171.096
Pagamenti	1.317.870.365.550
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.527.571.965.550

TAV. VII (situazione finanziaria al 30 settembre 2000)

(importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.596.595.547.918
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.806.297.147.918
Pagamenti	1.395.100.458.981
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.604.802.058

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAV. VII (situazione finanziaria al 31 dicembre 2000) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Impegni	1.608.615.317.596
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.818.316.917.596
Pagamenti	1.436.846.931.819
Trasferimenti Ministero Beni Culturali ed Ambientali	193.394.600.000
Trasferimenti Ministero degli Interni	12.770.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.646.548.531.819

TAV. VIII (situazione finanziaria al 31 dicembre 2001) (importi in lire)

Disponibilità iniziali fondo	2.000.000.000.000
Riduzione effettuata dalla finanziaria 2000 (art. 49, comma 16)	40.000.000.000
Somme recuperate da interventi defanziati e destinate al finanziamento della gestione dell'evento giubilare art. 7 e 8 della Legge 494/99	40.300.000.000
Disponibilità attuale fondo	1.960.000.000.000
Impegni	1.652.657.200.106
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	194.494.600.000
Trasferimenti Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE ATTIVATE	1.864.535.800.106
Pagamenti	1.586.030.624.380
Trasferimenti Ministero Beni Culturali e Ambientali	194.494.600.000
Trasferimenti Ministero dell'Interno (Fondo F.E.C.)	13.847.000.000
Trasferimenti Ministero delle Finanze	1.100.000.000
Trasferimenti Ministero dei Trasporti	860.000.000
Trasferimenti Ministero di Grazia e Giustizia	1.577.000.000
TOTALE RISORSE TRASFERITE	1.797.909.224.380

5. LO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO

Le procedure di accertamento

In data 26.01.2000, l'U.R.C.G.E. ha inoltrato a tutti i soggetti titolari di interventi inseriti nel Piano, un modello di rendicontazione al 31.12.1999 (riportato in appendice alla presente Relazione), al fine di ottenere dai titolari stessi un quadro preciso sull'andamento amministrativo ed esecutivo dei singoli interventi. Il termine previsto per ottemperare alla succitata richiesta dell'Ufficio è stato fissato al 20.02.2000.

Nella seduta della Commissione del 19 aprile 2000, il Coordinatore dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, dott.ssa Daniela Barbato, ha reso nota la suindicata iniziativa dell'U.R.C.G.E. e ha comunicato i primi risultati dell'attività di rendicontazione in parola: su 1108 interventi risultavano ultimati 486 interventi; 154 erano di titolarità di soggetti privati, 182 risultavano non ultimati e rendicontati e 286 non avevano dato alcuna risposta.

Con Decreto n. 268/RC in data 28.08.2000 del Ministro dei Lavori Pubblici delegato per Roma Capitale e Giubileo 2000 è stata assegnata una scadenza ultimativa, fissata al 15 maggio 2000, ai soggetti beneficiari che non avevano ancora provveduto alla rendicontazione delle somme utilizzate alla data del 31 dicembre 1999: gli interventi per i quali i relativi soggetti beneficiari non avessero provveduto agli adempimenti di cui sopra entro il termine previsto, sarebbero stati defianziati, con riserva di determinazione della rispettiva misura all'esito dei compiuti accertamenti.

Nelle successive riunioni la Commissione, sulla scorta delle informazioni trasmesse dai soggetti beneficiari attraverso i modelli di rendicontazione di cui sopra, ha provveduto ad effettuare una serie di defianziamenti "pro quota", facendo salvo il finanziamento originariamente attribuito solo per la quota parte regolarmente realizzata secondo le indicazioni temporali di Piano.

I risultati

Tabella A (Elenco degli interventi defianziati)

PAGINA BIANCA

Tabella A Elenco degli Interventi Definanziati

Legenda
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Importo Defianziato
ABRUZZO	PESCARA	Manoppello	COMUNE DI MANOPPELLO	415	A	STRUTTURA DI ACCOGLIENZA E DI INFORMAZIONE	389	319	70	22
	TERAMO	Isola Del Gran Sasso d'Italia	.PROVINCIA DI MARIA SS. DELLA PIETA' DEI PADRI PASS	330	R	RISTRUTTURAZIONE INTERNA E RIFACIMENTO DEL TETTO DELL'ALA EST DEL CONVENTO DI S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA	2.689	2.689	0	566
				346	A	OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ANTISTANTE GLI INGRESSI AL SANTUARIO CON ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	828	669	159	81
	Totale Regione ABRUZZO							3.906	3.677	229
BASILICATA	MATERA	Matera	ARCIDIOCESI DI MATERA - IRSINA	272	R	AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA DI SPIRITUALITA' S. ANNA	3.879	3.379	500	1.481
	POTENZA	Viggiano	COMUNE DI VIGGIANO	4976	A	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTEZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.	2.112	912	1.200	428
	Totale Regione BASILICATA							5.991	4.291	1.700
CALABRIA	COSENZA	Paola	COMUNE DI PAOLA	1496	R	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER L'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	2.638	2.638	0	321
	REGGIO CALABRIA	San Luca	COMUNE DI SAN LUCA	2120	R	RIQUALIFICAZIONE DEL SANTUARIO DI POLSI E CON AREE DI PERTINENZA E RELATIVO ACCESSO	50	50	0	450
	Totale Regione CALABRIA							2.688	2.688	0
CAMPANIA	AVELLINO	Mercogliano	.SOPRINTENDENZA B.A.A.A.S. DI SALERNO	3505	B	POTENZIAMENTO FUNZIONALE DEI BENI CULTURALI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DEL SANTUARIO DI MONTEVERGINE	2.484	2.484	0	57
	BENEVENTO	Benevento	COMUNE DI BENEVENTO	1018	R	RESTAURO DEL CONVENTO DI S. PASQUALE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA	5.444	5.444	0	2.271
				4961	A	STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E RELATIVI SERVIZI LUNGO IL CAMMINO DEL ROSARIO DI PADRE PIO	5.926	5.926	0	287
	NAPOLI	Cimitile	.SOPRINTENDENZA B.A.A. DI NAPOLI E PROV.	2055	B	VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE PRESENZE ARCHITETTONICHE DEL CRISTIANESIMO DELLE ORIGINI A NAPOLI E PROVINCIA - COMPLESSO MONUMENTALE DELLE BASILICHE PALEOCRISTIANE DI CIMITILE	5.667	3.967	1.700	402
				2570	R	INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA BETANIA	2.308	2.308	0	256
				5670	R	RIUTILIZZO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE	1.633	533	1.100	4.036
	Pompei	Pompei	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	186	A	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	215	0	215	860
				2764	R	ADATTAMENTO DELL'ISTITUTO SCUOLE PIE ALLA RICETTIVITA' A BASSO COSTO COMPRESO NELL'ITINERARIO L'APPIA ANTICA CAMMINO DI FEDE E CULTURA	15.698	7.046	8.652	154
				2770/A	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTEZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' ARENELLA - 1° LOTTO	798	612	185	2
				1193	A	I LUOGHI SACRI ED ARTISTICI DI POMPEI	619	619	0	98
5837	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	738	738	0	1.293				
Totale Regione CAMPANIA							41.531	29.678	11.852	9.715

Tabella A
Elenco degli Interventi Definanziati

Legenda
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Importo Definanziato
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	Bologna	.OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI ED AZIENDE RIUNITE -	6239	R	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	2.125	0	2.125	468
	MODENA	Sassuolo	.6 A DIR. NE GENIO MILIT. ACCAD. DI MODENA	399	B	RESTAURO DEL CORPO COSTITUENTE L'INGRESSO ALLA PESCHERIA DUCALE COMPRENDE UN ALLOGGIO PER CUSTODI	158	0	158	350
	PIACENZA	Alseno	.MINISTERO DELLE FINANZE DIP. TERRITORIO	1463	B	RECUPERO DEI COMPLESSI MONUMENTALI IN LOC. CHIARAVALLE DELLA COLOMBA RIUSO DELL'EX DORMITORIO DEI MONACI DELL'ABBAZIA CISTERCENSE A SPAZIO MUSEALE LEGATO ALLA RICETTIVITA'	746	746	0	354
Totale Regione EMILIA-ROMAGNA							3.029	746	2.283	1.172
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	Gorizia	COMUNE DI GORIZIA	4817	B	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	3.312	3.312	0	683
	TRIESTE	Trieste	.REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	4827	A	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI A SERVIZIO DEI PELLEGRINI	13.024	6.464	6.560	54
	UDINE	Aquileia	COMUNE DI AQUILEIA	477	A	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	10	0	10	290
				479	B	INTERVENTI RIGUARDANTI L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER LA MOBILITA' DEI DISABILI E L'ACCESSIBILITA' ALLA BASILICA ED ALLE PRINCIPALI METE RELIGIOSE ARCHEOLOGICHE E TURISTICHE	981	971	10	78
	Tarvisio	.PARROCCHIA DI S. EGIDIO	1709	R	RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI ESISTENTI E DI PROPRIETA' DELL'ENTE RICHIEDENTE	2.568	2.208	360	816	
Totale Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA							19.896	12.956	6.940	1.920
LIGURIA	LA SPEZIA	Sarzana	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	2775	B	MUSEO DIOCESANO DI SARZANA NELL' ORATORIO DELLA MISERICORDIA	1.454	1.154	300	331
Totale Regione LIGURIA							1.454	1.154	300	331
LOMBARDIA	BERGAMO	Sotto il Monte Giovanni XXIII	DIOCESI DI BERGAMO	5949	B	CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL' ABBAZIA DI S. EGIDIO, DEI LOCALI ANNESSI E SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI	2.873	1.176	1.697	33
	MILANO	Milano	FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	5815	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	682	682	0	1.125
				5816	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	719	719	0	1.906
Totale Regione LOMBARDIA							4.274	2.577	1.697	3.064
MARCHE	ANCONA	Ancona	COMUNE DI ANCONA	7465	A	SOSTA PULLMAN BANCHINA PORTUALE	1.391	891	500	991
			.REGIONE MARCHE	6909	A	SISTEMA DI SEGNALETICA STRADALE RIVOLTO ALLA INFORMAZIONE DEI VISITATORI SUGLI ITINERARI GIUBILARI E SULLE METE DI CARATTERE RELIGIOSO NEL TERRITORIO DELLE MARCHE	1.449	1.199	250	17
		Loreto	COMUNE DI LORETO	6376	R	COMPLETAMENTO EDIFICIO EX F.A.F	3.676	3.676	0	674

Tabella A
Elenco degli Interventi Definanziati

Legenda
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire			
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Importo Definanziato
	ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO	6821	A	COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO POLIVALENTE (ALLEGATO PIANO GENERALE ACCOGLIENZA)	2.309	1.909	400	172
				5827	A	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI INTERNE E ESTERNE ALLA STAZIONE	3.419	3.419	0	431
				7402	A	COMPLETAMENTO DEL RESTAURO EX CARTIERA PAPAIE PER L'ACCOGLIMENTO DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DEI PELLEGRINI	4.369	369	4.000	131
				7404	A	PROGETTO PER UN SISTEMA INFORMATIVO DI SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI BENI DI CARATTERE RELIGIOSO E CULTURALE FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ORIENTAMENTO DEI VISITATORI PREVISTI IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEL 2000	438	396	42	133
Totale Regione MARCHE							17.051	11.859	5.192	2.549
PIEMONTE	ASTI	Asti	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI	1268/B	R	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELL'EX VILLA BADOGLIO - 2° STRALCIO	581	473	108	718
Totale Regione PIEMONTE							581	473	108	718
PUGLIA	BRINDISI	Orta	ENTE SANTUARIO SAN COSIMO	1378/A	A	SISTEMAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO IN LOCALITA' S. COSIMO ALLA MACCHIA	7.031	6.448	583	2.444
				899	A	STRUTTURA ACCOGLIENZA POZZO CAVO	4.308	4.308	0	265
	FOGGIA	San Giovanni Rotondo	COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	905	A	ARREDO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIALE CAPPUCCINI	1.468	1.468	0	133
				890	R	CASA DI ACCOGLIENZA PER IL CLERO	13.667	2.883	10.784	1.431
	TARANTO	Ginosa	COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS	3524	A	AREE URBANE ED EXTRAURBANE ATTREZZATE PER SOSTA E RISTORO NAVETTE	2.570	2.170	400	50
				3902	A	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	286	186	100	18
	Mottola	COMUNE DI MOTTOLA	2094	A	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA	318	98	220	93	
Totale Regione PUGLIA							29.648	17.561	12.087	4.433
SARDEGNA	CAGLIARI	Cagliari	COMUNE DI CAGLIARI	2842	A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	883	883	0	297
	SASSARI	Alghero	COMUNE DI ALGHERO	2235	B	RESTAURO CATTEDRALE	499	499	0	2.501
		Sassari	PROVINCIA DI SASSARI	3090	A	REALIZZAZIONE DI UN MUSEO DELL'ARTE SACRA NEL NORD SARDEGNA	4.977	277	4.700	1.723
Totale Regione SARDEGNA							6.359	1.659	4.700	4.521
SICILIA	CALTANISSETTA	Caltanissetta	SEMINARIO VESCOVILE DI CALTANISSETTA	4254	R	CENTRO DI ACCOGLIENZA PER LA FORMAZIONE MORALE E RELIGIOSA	3.795	2.951	844	760
	ENNA	Plazza Armerina	OPERA PIA CARMELA TRIGONA DI GERACI	2357	R	RIUTILIZZO DI UN'ALA DISMESSA DELL'EX MONASTERO BENEDETTINO DI SAN GIOVANNI DA ADIBIRE CASA PER FERIE CON ANNESSA SALA	913	893	20	40
	SIRACUSA	Noto	COMUNE DI NOTO	1339	R	RECUPERO DELL'EX CARCERE MANDAMENTALE (GIA' CARCERE REALE) AD USO DI OSTELLO	2.986	1.986	1.000	67

Tabella A
Elenco degli Interventi Definanziati

Legenda
Settore: (A: Accoglienza - B: Beni Culturali - R: Ricettività)

Regione	Provincia	Comune	Soggetto Beneficiario	Prot.	Settore	Titolo Intervento	Valori Espressi in Milioni di Lire				
							Costo Stimato	Finanziamento attribuito	Altre Fonti Finanz.	Importo Definanziato	
Totale Regione SICILIA							7.694	5.830	1.864	867	
TOSCANA	FIRENZE	Bagno A Ripoli	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	5673	B	OSPEDALE DEL BIGALLO PER ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI STRUTTURA RICETTIVA E DIDATTICO MUSEALE	1.643	908	735	93	
		Firenze	COMUNE DI FIRENZE	3747	B	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PIENA ACCESSIBILITA' NELLE CHIESE FIORENTINE DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ESISTENTI	604	461	143	348	
		.REGIONE TOSCANA		5918	A	EMERGENZA SANITARIA	688	263	425	25	
		Fucecchio	COMUNE DI FUCECCHIO	1537	R	RECUPERO DEL PONTE FORTIFICATO DI CAPPIANO PER REALIZZAZIONE OSTELLO	3.286	2.820	466	75	
	LIVORNO	Livorno	COMUNE DI LIVORNO		5172	A	ITINERARIO MARIANO LA PIAZZA DEL SANTUARIO LE SUPERFICI E L'ARREDO	737	337	400	118
					5176	A	ITINERARIO MARIANO MONTENERO ALTO REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO CON ATTREZZATURE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SOSTA	258	108	150	38
			CONGREGAZIONE FIGLIE POVERE SAN GIUSEPPE CALASANZIO	3725	R	RECUPERO DELL'EX ISTITUTO LA MADONNINA MONTENERO	1.971	841	1.130	59	
	PISA	Castelfranco Di Sotto	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	3157	R	RESTAURO CONVENTO SAN MATTEO CON ADEGUAMENTO PER RICETTIVITA' A BASSO COSTO IN PROSSIMITA' DI TRACCIATO ORIGINALE DELLA VIA FRANCIGENA	710	248	462	32	
		Pisa	ISTITUTO SUORE FRANCISCANE OSPEDALIERE DI SANTA CHIARA	5464	R	RECUPERO DI LOCALI SOTTOTETTO DA DESTINARE AD ACCOGLIENZA	451	200	250	50	
	PRATO	Prato	COMUNE DI PRATO	2280	A	INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO	100	0	100	75	
Totale Regione TOSCANA							10.448	6.186	4.262	914	
UMBRIA	PERUGIA	Perugia	COMUNE DI PERUGIA	6611	B	SISTEMAZIONE DEL CASSERO DI PORTA S. ANGELO	473	289	184	18	
Totale Regione UMBRIA							473	289	184	18	
VENETO	PADOVA	Padova	MONASTERO DI SANTA GIUSTINA	4530	B	RECUPERO DELLA CRIPTA MEDIOEVALE PER ACCOGLIENZA DI PELLEGRINI	48	48	0	11	
			PIA FONDAZIONE V. S. BREDI	3997	A	CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDI	7.121	1.121	6.000	558	
		Teolo	COMUNE DI TEOLO	713	B	PARCHEGGIO DELL'ABBZIA DI PRAGLIA	1.757	1.272	485	3	
	VENEZIA	Venezia	AZIENDA CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO	2977	A	COLLEGAMENTO NAVETTA TESSERA VENEZIA VIA ACQUA ACCESSIBILE AI DISABILI	1.473	273	1.200	399	
				2978	A	RISTRUTTURAZIONE APPRODI DI FUSINA E ZATTERE	299	299	0	301	
				2980	A	RISTRUTTURAZIONE APPRODO DI PUNTA SABBIONI	355	302	53	98	
VICENZA	Vicenza	COMUNE DI VICENZA	1728	A	RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE D'ACCESSO AL SANTUARIO DI MONTE BERICO CON INTERVENTI ATTI A GARANTIRE LA SICUREZZA	2.003	1.976	27	586		
			1740	A	RISTRUTTURAZIONE BARCHESSA DEL PALAZZO BRUSAROSCO CON DESTINAZIONE A PRIMA ACCOGLIENZA PER GIOVANI	675	675	0	575		
